

25/03/2020



Gobierno Municipal de **Matamoros**



Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología



Obras Públicas

TESORERÍA MUNICIPAL
RECIBIDO
5 MAR. 2020
H. MATAMOROS, TAM.
2018 - 2021

H. Matamoros, Tamaulipas a 13 de Marzo de 2020

No. de Oficio: 016/2020

ASUNTO: Pago de Factura

C.P.C. Arnoldo García Lartige
Tesorero Municipal

At'n: C.P. Roque García Lucio
Subtesorero Municipal

Anexo al Presente envío a usted para su respectivo pago la siguiente Factura Original: 41177 de: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. , Para Pago de: ESTIMACION No.1 (FINQ) Relativo a la Obra : Rehabilitación de Pavimento Asfáltico Av. Lauro Villar de Lateral Norte, de Callejón 8 (0+464) a Fidencio Trejo (0+740), en este Municipio.

Con un Importe de: \$ 1,109,965.93 ** (UN MILLON CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.)

PROGRAMA: OBRA DIRECTA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Vo. Bo. 2018 - 2021

Arq. Samuel Vega García
Director de Obras Publicas

CONTRATO: MAT-OP- OD-008/2020



Autorizo

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Ing. Marco Antonio Hernández Acosta
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

Valido



Lic. Raquel González Martínez
Contralor Municipal
H. MATAMOROS, TAM.

ESCANEADO





LR Proyectos y Estructuras de Mexico, S.A. de C.V.
 Sendero Nacional #1568 esquina con Alianza
 Col. Jose López Portillo
 C.P. 87348, H. Matamoros, Tamaulipas, México
 t. (868) 810 0539/ (868) 810 0852
 R.F.C. PEM901114BS2
 contact@pemsamexico.com
 www.pemsamexico.com

Factura / Invoice: 41177
 Comprobante Fiscal Digital por Internet (Folio Fiscal):
 84FBFFB4-94B4-45CD-A9D2-A620A0FC8407
 Fecha y hora de Expedición / Date and Time Issued :
 12/03/2020T13:11:38
 Lugar de Expedición / Location of Issue:
 87348

Facturado a / Bill to
 34 MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
 CALLE SEXTA MORELOS Y GLZ.
 CENTRO
 87350 H. MATAMOROS, Tamaulipas
 MEXICO

RFC:MMT320612AWA

Pedido / Sales Order	Remisión / Delivery Note
Orden de Compra / P.O.	Referencia / Reference
Packing list	Moneda / Ccy. MN Moneda Nacional 1.

Método de Pago PPD Pago en Par. o Diferido	Forma de Pago 99 Por Definir	Condición de Pago / Payment Conditions	Vencimiento / Due
---	---------------------------------	--	-------------------

Línea / Line	Cantidad / Quantity	UM	Código / SKU Código SAT	Descripción / Description of Goods	Total
1	E48		41A1010 72101500	PAGO DE LA ESTIMACION No. 1 (UNO) FINIQUITO, RELATIVO A LA OBRA DE: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, AL AMPARO DEL CONTRATO No. MAT-OP-OD-008/2020, FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020.	966,162.34

IMPORTE DE LA ESTIMACION \$ 966,162.34
 16% I.V.A. 154,585.97
 SUBTOTAL \$ 1,120,748.31

DEDUCCIONES Y RETENCIONES:

ANTICIPOS 0.00
 3% I.C.I.C. 2,898.49
 2% D.I.F. 1,932.32
 5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 4,830.81
 1% ORG. TEC. DE FISCALIZACION DEL EDO 1,120.76
 TOTAL RETENCIONES \$ 10,782.38

Importes con letra / Amounts in writing

(Un Millon Ciento Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco Pesos 93/100 MN)



Subtotal	966,162.34
I.V.A. / V.A.T.	154,585.97
Ret IVA / VAT WH	0.00
Ret. I.V.C.	4,830.81
Ret. D.I.F.	1,932.32
Ret. I.C.I.C.	2,898.49
Ret. C.M.I.C.	0.00
Ret. O.T.F.E.	1,120.76
Total	1,109,965.93

Fecha y hora de certificación: 2020-03-12T13:11:51 No. de serie del certificado del SAT:
 00001000000404385561

00001000000404477432

FzAlxH2k108ZJav6BJgwR115fOETSNcvsH9CaRmdVyu9fV5J638Ou9F++w773l3ifTxlj31q68weg2lsXmFoLz5OZV/mLIHW2T//jySmQP0cnjbdOE7850Eso5f43hBZuF7vdfNbVkl7EUsh9gO6gSbGkLS1uQHnQGoF4aJ6p6+IPACSYaFLc16axCR86JO9U7TEQZWF6dkCXV1pgodkgD2vu235z9xUyoQwLuJgUD6B+ZB4711o7HehEbe/9mDXEYXm15c2HMslgoefRmoYppQuo0vhd7FvakHhmgA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|84FBFFB4-94B4-45CD-A9D2-A620A0FC8407|2020-03-12T13:11:51|dj4qAzasBCG+cg1=apivQm|BnDq7Gxg75bxjRHR+VIDejDFny18RdMsb67PBCVz6NMJkUp2HQXT7o8OeY3Pvz1vTO/0f88uDdikA/HWp/J4PdYy3|WKDp04XA+RHypESlaUKWOMzX4+MvTsOwCMYbxPod7uWw|0kgYnyfpcDulmRCRY|kQoP2N3LAzk9LrQ15UwlvX++|DLYRfWwMGV8R9b|lxwVtp8CIWJHG7TgZFhAdrnP6Gw==|00001000000404477432||





Gobierno Municipal de
Matamoros

CONTRATO:	MA -OD-008/2020	ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO:	2-12 DE MARZO DEL 2020
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FECHA:	12 DE MARZO DEL 2020
UBICACIÓN:	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	HOJA:	1 DE 1
CONTRATISTA:	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.	BUENO POR \$
			1,120,748.31
RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS			
LA CANTIDAD DE \$ 1,109,965.93 (UN MILLON CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.)			
POR CONCEPTO DE : PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO			
ESTADO DE CUENTA			
IMPORTE DEL CONTRATO: \$	1,120,761.98		
PAGOS ANTERIORES: \$	0.00		
POR EJERCER: \$	1,120,761.98		1,120,761.98
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: \$	966,162.34		
DEDUCTIVAS: \$			
SUB TOTAL: \$	966,162.34		
I.V.A.: \$	154,585.97		
SUB TOTAL: \$	1,120,748.31		1,120,748.31
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:			
ANTIQUOS: \$	0.00		
3% I.C.I.C \$	2,898.49		
2% D.I.F. \$	1,932.32		
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: \$	4,830.81		
1% ^{oo} ORG. TEC. DE FISCALIZACION DEL EDO: \$	1,120.76		
PENAS CONVENCIONALES : \$	0.00		
SUB TOTAL: \$	10,782.38		
NETO A PAGAR: \$	1,109,965.93		1,109,965.93
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: \$	13.67		13.67
CONTRATISTA:		REVISÓ:	AUTORIZÓ:
LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV		ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA	ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ACOSTA



Gobierno Municipal de
Matamoros

CONTRATO: MAT-OP-OD-008/2020

ESTIMACIÓN: 1 FINIQUITO

PROGRAMA: OBRA DIRECTA

PERIODO: 2-12 DE MARZO DEL 2020

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2020

UBICACIÓN: AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

HOJA: 1

DE 2

CONTRATISTA: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

ESTIMACIÓN

	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN			IMPORTE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	
1.0	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	ML	\$62.60	386.58 ✓	0.00	382.32 ✓	\$23,933.23 ✓
2.0	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	\$161.54	225.31 ✓	0.00	249.68 ✓	\$40,333.31 ✓
3.0	TRAZO Y NIVELACION.	M2	\$13.79	283.19 ✓	0.00	307.02 ✓	\$4,233.81 ✓
4.0	EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.55 MTS.	M3	\$57.13	155.75 ✓	0.00	168.87 ✓	\$9,647.54 ✓
5.0	CARGA Y ACARREO E MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LIMITES DE LA CIUDAD.	M3	\$1115.03	202.48 ✓	0.00	227.98 ✓	\$26,224.54 ✓
6.0	CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 50 CM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	\$226.01	283.19 ✓	0.00	307.02 ✓	\$69,389.59 ✓
7.0	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN UN ESPESOR DE 3 A 5 CM POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE ASI COMO LA CARGA Y EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO A LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION LE INDIQUE	M2	\$73.55	1,901.12 ✓	0.00	1,851.40 ✓	\$136,170.47 ✓
8.0	BACHEO PROFUNDO POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	\$37.75	228.13 ✓	0.00	170.28 ✓	\$6,428.07 ✓
9.0	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 A RAZON DE 1.5 LTO/M2 BARRIDO DE BASE IMPREGNADO A MANO, RIEGO DE LIGA FR-3 A RAZON DE 0.50 LTO/M2 SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO 3/4 Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	\$279.58	2,184.31 ✓	0.00	2,158.42 ✓	\$603,451.06 ✓
				TOTAL DE ESTA HOJA			\$919,811.62 ✓

CONTRATISTA :

LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

SUPERVISO:

ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA

REVISO:

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ SILVA





Gobierno Municipal de
Matamoros

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

ORDEN DE ACTUALIZACION	ESTIMACION 1 FINIQUITO	MAT-OP-OD-008/2020	PERIODO: 2-12 DE MARZO DEL 2020	HOJA: 1 DE 1
CONTRATISTA: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV			AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	
LOCALIDAD: MATAMOROS		MUNICIPIO: MATAMOROS	PROGRAMA: OBRA DIRECTA	

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN			INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA
2.0	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	24.37 ✓	\$161.54 ✓	\$3,936.73		1a.	2a.
3.0	TRAZO Y NIVELACION.	23.83 ✓	\$13.79 ✓	\$328.62			
4.0	EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.55 MTS.	13.12 ✓	\$57.13 ✓	\$749.55			
5.0	CARGA Y ACARREO E MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LIMITES DE LA CIUDAD.	25.50 ✓	\$115.03 ✓	\$2,933.27			
6.0	CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 50 CM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DESCOPEADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	23.83 ✓	\$226.01 ✓	\$5,385.82			
	SUBTOTAL			\$13,333.97			

EXPLICACION AMPLIA: (QUE, COMO, DONDE, QUIEN, PORQUE, CUANDO)	CAUSAS
	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES: <input checked="" type="checkbox"/> X
	* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO: _____
	* ERROR INICIAL: _____
	* OTROS: _____

CONTRATISTA: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	REVISO: ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA
SUPERVISO: ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA	



Gobierno Municipal de
Matamoros

CONTRATO:	MAT-OP-OD-008/2020	ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO:	2-12 DE MARZO DEL 2020
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FECHA:	12 DE MARZO DEL 2020
UBICACIÓN:	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	HOJA:	1 DE 4
CONTRATISTA:	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
1.0	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	CAMELLON 1 CAMELLON 2 CAMELLON 3		50.28 54.22 86.66			ML	2.00 2.00 2.00	100.56 108.44 173.32	209.00 382.32	100.00% 100.00%
2.0	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE, INCLUYE : HERRAMIENTA, EQUIPO ,CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	CAMELLON 1 CAMELLON 2 CAMELLON 3		50.28 54.22 86.66	1.25 1.40 1.28		M2	1.00 1.00 1.00	62.85 75.91 110.92	138.76 249.68	100.00% 100.00%
3.0	TRAZO Y NIVELACION.	CAMELLON 1 CAMELLON 2 CAMELLON 3		50.28 54.22 86.66	1.55 1.70 1.58		M2	1.00 1.00 1.00	77.93 92.17 136.92	170.10 307.02	100.00% 100.00%

CONTRATISTA:	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	REVISO:	
		SUPERVISO:	
			ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA
			ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA



Gobierno Municipal de
Matamoros

CONTRATO: JIAT-OP-OD-008/2020 ESTIMACIÓN: 1 FINIQUITO
 PROGRAMA: OBRA DIRECTA PERIODO: 2-12 DE MARZO DEL 2020
 OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO FECHA: 12 DE MARZO DEL 2020
 UBICACIÓN: AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
 CONTRATISTA: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV HOJA: 2 DE 4

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
4.0	EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.55 MTS.	CAMELLON 1		50.28	1.55	0.55	M3	1.00	42.86		
		CAMELLON 2		54.22	1.70	0.55	M3	1.00	50.70	93.56	
		CAMELLON 3		86.66	1.58	0.55	M3	1.00	75.31	168.87	100.00%
5.0	CARGA Y ACARREO E MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LIMITES DE LA CIUDAD.	CAMELLON 1		50.28	1.55	0.55	M3	1.35	57.87		
		CAMELLON 2		54.22	1.70	0.55	M3	1.35	68.44	126.31	
		CAMELLON 3		86.66	1.58	0.55	M3	1.35	101.67	227.98	100.00%
6.0	CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 50 CM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	CAMELLON 1		50.28	1.55		M2	1.00	77.93		
		CAMELLON 2		54.22	1.70		M2	1.00	92.17	170.10	
		CAMELLON 3		86.66	1.58		M2	1.00	136.92	307.02	100.00%
7.0	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN UN ESPESOR DE 3 A 5 CM POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE ASI COMO LA CARGA Y EL ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO A LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION LE INDIQUE AREA TOTAL MENOS AREA DE CAMELLONES	AREA TOTAL					M2	1.00	2,158.42		
		AREA DE CAMELLONES		50.28	1.55		M2	-1.00	-77.93	2,080.49	
				54.22	1.70		M2	-1.00	-92.17	1,988.32	
				86.66	1.58		M2	-1.00	-136.92	1,851.40	
									1,851.40	100.00%	

CONTRATISTA:  SUPERVISOR:  REVISOR: 
 LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA



Gobierno Municipal de
Matamoros

CONTRATO:	MAT-OP-OD-008/2020	ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO:	2-12 DE MARZO DEL 2020
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FECHA:	12 DE MARZO DEL 2020
UBICACIÓN:	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	HOJA:	3 DE 4
CONTRATISTA:	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
8.0	BACHEO PROFUNDO POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO COMPACTADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.			15.00 8.96 12.00	4.65 6.01 3.89		M2	1.00	69.75 53.85 46.68	123.60 170.28 170.28	100.00%
9.0	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1 A RAZON DE 1.5 LTO/M2 BARRIDO DE BASE IMPREGNADO A MANO, RIEGO DE LIGA FR-3 A RAZON DE 0.50 LTO/M2 SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO 3/4 Y PRUEBAS DE LABORATORIO.		CUERPO LATERAL NORTE TRIANGULO	267.70 8.32	8.01 3.40		M2	1.00 0.50	2,144.28 14.14	2,158.42 2,158.42	100.00%
10.0	NIVELACION DE POZO DE VISITA CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE : CORTE DE 1.50 X 1.50 MTS. CON CORTADORA DE PISO, RETIRO E CARPETA ,EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 -10/10 , CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.						PZA	5.00	5.00	5.00	100.00%

CONTRATISTA :

SUPERVISOR:

REVISOR:

LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA


ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA



Gobierno Municipal de
Matamoros

CC ATO:	MAT-OP-OD-008/2020	ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO:	2-12 DE MARZO DEL 2020
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FECHA:	12 DE MARZO DEL 2020
UBICACIÓN:	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE HOJA 1 DE 3 MATAMOROS, TAMAULIPAS		
CONTRATISTA:	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV		

CROQUIS 1

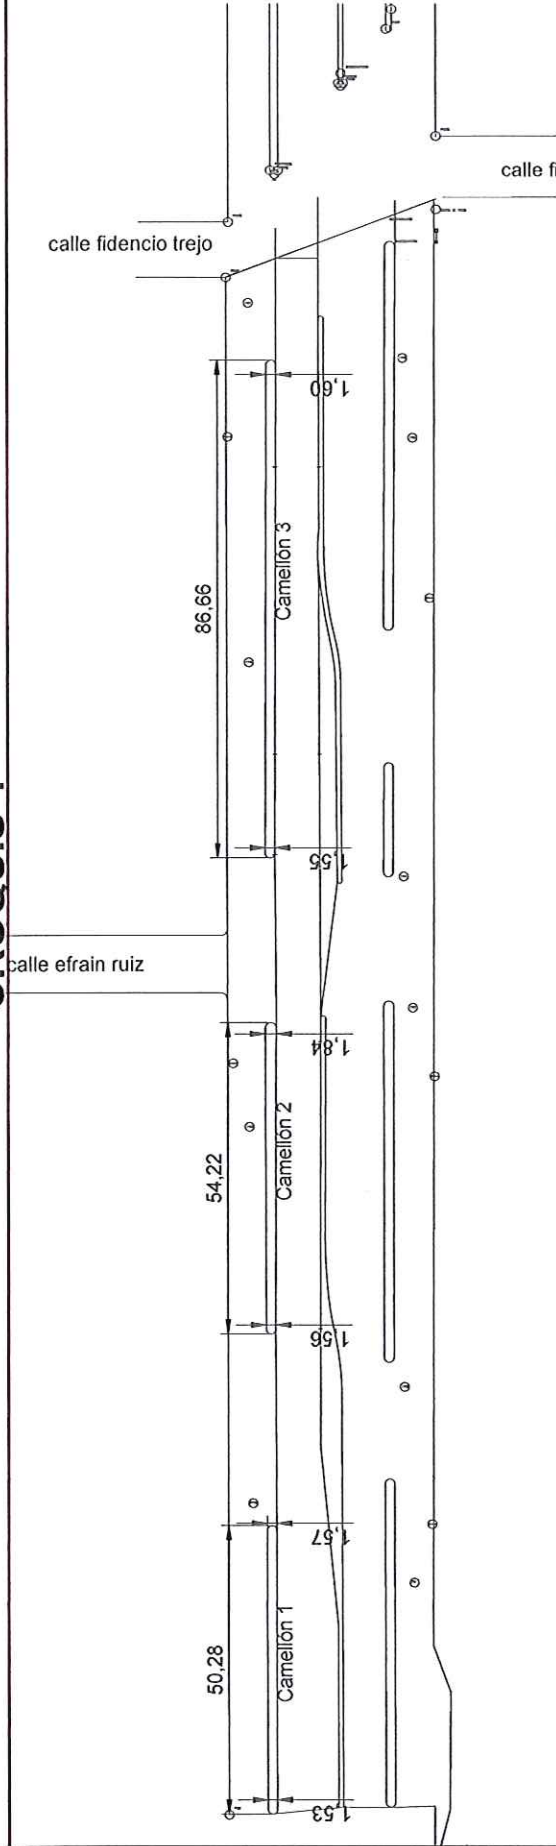

ANCHO PROMEDIO DE EXCAVACION

ANCHO DE CAMELLÓN

LARGO (M)

A1 A2 PROMEDIO

1.53 1.57 1.55
1.56 1.84 1.70
1.55 1.60 1.58

50.28
54.22
86.66

CAMELLON

CAMELLON 1

CAMELLON 2

CAMELLON 3

CONTRATISTA :
LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

SUPERVISOR:
ING. ELDER K. FERNANDEZ OLVERA


REVISOR:
ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA



Gobierno Municipal de
Matamoros

CONTRATO:	MAT-OP-OD-008/2020	ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO:	2-12 DE MARZO DEL 2020
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FECHA:	12 DE MARZO DEL 2020
UBICACIÓN:	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE HOJA 2 DE 3 MATAMOROS, TAMAULIPAS		
CONTRATISTA:	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV		

CROQUIS 2

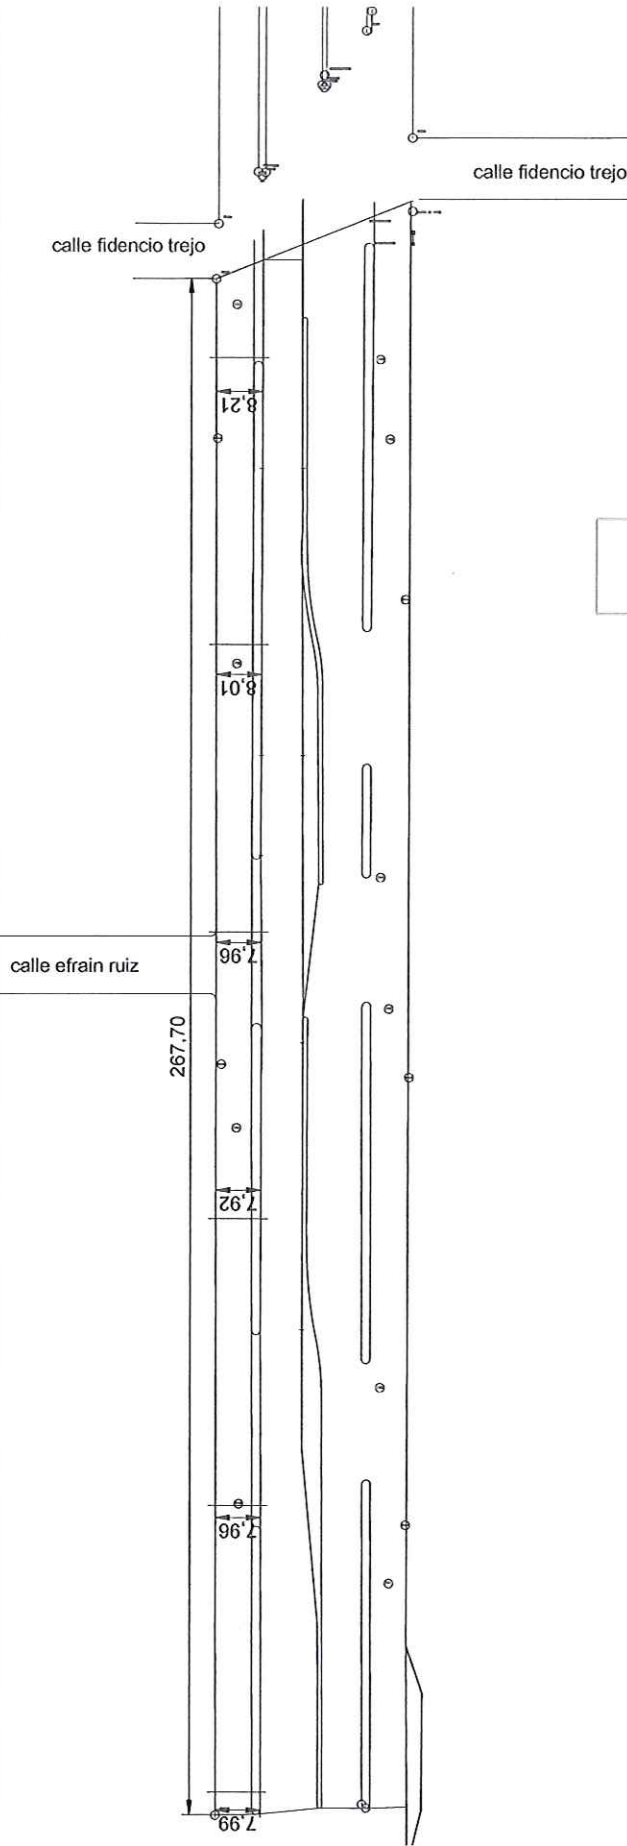

LONGITU	ANCHO	ANCHO PROMEDIO	AREA DE CARPETA
267.7	8.21	8.01	2144.28
	8.01		
	7.96		
	7.92		
	7.96		
	7.99		
	48.05		

CONTRATISTA :
LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

SUPERVISO:
ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA


REVISO:
ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA



Gobierno Municipal de
Matamoros

CONTRATO:	MAT-OP-OD-008/2020	ESTIMACIÓN:	1 FINIQUITO
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO:	2-12 DE MARZO DEL 2020
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FECHA:	12 DE MARZO DEL 2020
UBICACIÓN:	AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE HOJA 3 DE 3 MATAMOROS, TAMAULIPAS		
CONTRATISTA:	LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV		

CROQUIS 3

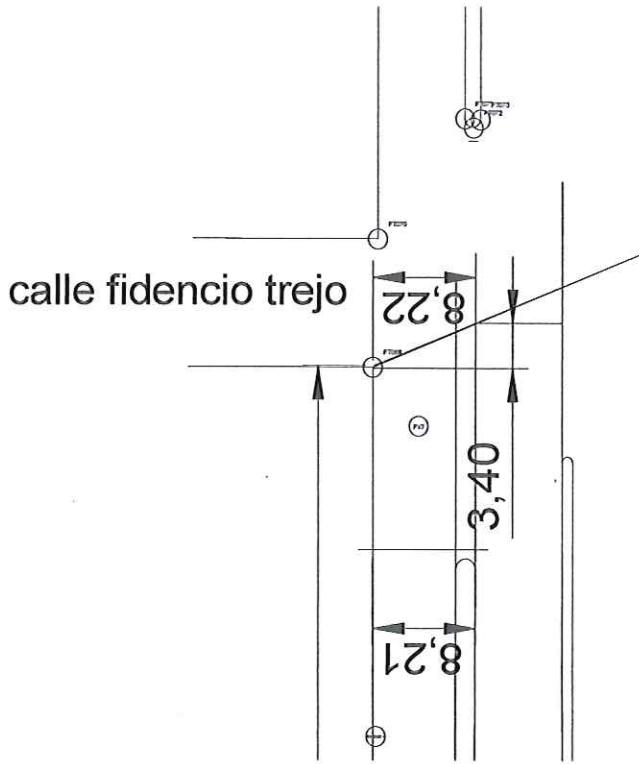

L	A	AREA
8.22	3.4	0.5 13.97

AREA DE TRIANGULO DE CARPETA

AREA TOTAL = AREA 1 + AREA 2 2144.28 13.97 2158.25

CONTRATISTA :
LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA

REVISO:
ING. MARCO ANTONIO ESPINOSA SILVA



Gobierno Municipal de
Matamoros

CONF: MAT-OP-OD-008/2020	ESTIMACIÓN: 1 FINIQUITO
PROGRAMA: OBRA DIRECTA	PERIODO: 2-12 DE MARZO DEL 2020
OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FECHA: 12 DE MARZO DEL 2020
UBICACIÓN: AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	HOJA: 1 DE 4
CONTRATISTA: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	

FOTOGRAFIAS



CONTRATISTA :

LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

SUPERVISOR:

ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA

REVISOR:

ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA



Gobierno Municipal de
Matamoros

CONTRATO: MAT-OP-OD-008/2020	ESTIMACIÓN: 1 FINIQUITO
PROGRAMA: OBRA DIRECTA	PERIODO: 2-12 DE MARZO DEL 2020
OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FECHA: 12 DE MARZO DEL 2020
AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A	
UBICACIÓN: FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	
HOJA: 2 DE 4	
CONTRATISTA: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	

FOTOGRAFIAS



CONTRATISTA :

LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

SUPERVISOR:

ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA

REVISOR:

ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA



Gobierno Municipal de
Matamoros

CONTRATO: MAT-OP-OD-008/2020	ESTIMACIÓN: 1 FINIQUITO
PROGRAMA: OBRA DIRECTA	PERIODO: 2-12 DE MARZO DEL 2020
OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO	FECHA: 12 DE MARZO DEL 2020
AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A	
UBICACIÓN: FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	
CONTRATISTA: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV	
HOJA: 3 DE 4	

FOTOGRAFIAS



CONTRATISTA :
LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

SUPERVISOR:
ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA

REVISOR:
ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA



Gobierno Municipal de
Matamoros

CONTRATO: MAT-OP-OD-008/2020

ESTIMACIÓN: 1 FINIQUITO

PROGRAMA: OBRA DIRECTA

PERIODO: 2-12 DE MARZO DEL 2020

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2020

UBICACIÓN: AV. LAURO VILLAR DE LATERAL NORTE DE CALLEJON 8(0+464) A

FIDENCIO TREJO (0+740) EN EL MUNICIPIO DE

MATAMOROS, TAMAULIPAS

HOJA: 4 DE 4

CONTRATISTA: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

FOTOGRAFIAS



CONTRATISTA:

LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO SA DE CV

SUPERVISOR:

ING. ELDER K. HERNANDEZ OLVERA

REVISOR:

ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA



RENUNCIA ANTICIPO

Cd. Matamoros, Tam., a 2 de Marzo del 2020

Arq. Samuel Vega Garcia
Director de Obras Públicas de H. Matamoros
Presente
Ciudad.

Con relación al Contrato No.: MAT-OP-OD-008/2020, relativa a:
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AVENIDA LAURO VILLAR
LATERAL NORTE DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740), EN EL
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

Por medio de este conducto se le informa que se renuncia al
Anticipo de la obra arriba mencionada.

Sin más por el momento quedo de usted

Atentamente:

Luis Lauro Gutiérrez González
Administrador Único

c.c.p.- Archivo.-

L R PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, SA DE CV
Sendero Nacional No. 1568, Esq. Con Alianza. Col. Lopez portillo C.P. 87348
H. Matamoros, Tamaulipas. Tel-Fax: (868) 810-08-52 / (868) 810-05-39



H. Matamoros, Tam., a 12 de Marzo de 2020

Arq. Samuel Vega Garcia
Director de Obras Públicas de H. Matamoros
Presente
Ciudad.

Con relación al Contrato No.: **MAT-OP-OD-008/2020**, relativa a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AVENIDA LAURO VILLAR LATERAL NORTE DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**

Le hago de su conocimiento que la obra se llevó a cabo de acuerdo a proyecto y especificaciones.

Sin mas por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

Ing. Juan Carlos Alonso Reyes
DRO No. I-393

c.c.p.- Archivo.-

CÉDULA 8354282

SEP

DGP



SEP



México D.F. 18 de Octubre del 2013



FIRMA DEL TITULAR



18/10/13

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 8354282

EN VIRTUD DE QUE

JUAN CARLOS
ALONSO
REYES

CURP: AORJ700911HTSLYN02

CUMPLÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY
REGlamentARIA DEL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL
DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO. SE LE EXPIDE

EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA EN
INGENIERÍA CIVIL



JAIME HUGO TALANCÓN ESCOBEDO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES





H. Matamoros, Tam., a 2 de Marzo de 2020

Arq. Samuel Vega Garcia
Director de Obras Públicas de H. Matamoros
Presente
Ciudad.

Con relación al Contrato No.: **MAT-OP-OD-008/2020**, relativa a:
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AVENIDA LAURO VILLAR
LATERAL NORTE DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740), EN EL
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

Por medio de este conducto se le informa que con fecha de **2 de Marzo del 2020** se dan inicio los trabajos de la obra antes mencionada.

Sin otro asunto en particular reciba un saludo cordial

Atentamente:


Luis Lauro Gutiérrez González
Administrador Único

c.c.p.- Archivo.-

L R PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, SA DE CV

Sendero Nacional No. 1568, Esq. Con Alianza. Col. Lopez portillo C.P. 87348
H. Mtamoros, Tamaulipas. Tel-Fax: (868) 810-08-52 / (868) 810-05-39



H. Matamoros, Tam., a 12 de Marzo de 2020

Arq. Samuel Vega Garcia
Director de Obras Públicas de H. Matamoros
Presente
Ciudad.

Con relación al Contrato No.: **MAT-OP-OD-008/2020**, relativa a:
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AVENIDA LAURO VILLAR
LATERAL NORTE DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740), EN EL
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

Por medio de este conducto se le informa que con fecha de **12 de Marzo de 2020** se dan por concluidos los trabajos de la obra antes mencionada; esto para el trámite correspondiente de Entrega-Recepción.

Sin otro asunto en particular reciba un saludo cordial

Atentamente:


Luis Lauro Gutiérrez González
Administrador Único

L R PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, SA DE CV
Sendero Nacional No. 1568, Esq. Con Alianza. Col. Lopez portillo C.P. 87348
H. Matamoros, Tamaulipas. Tel-Fax: (868) 810-08-52 / (868) 810-05-39



H. Matamoros, Tam., a 2 de Marzo de 2020

Arq. Samuel Vega Garcia
Director de Obras Públicas de H. Matamoros
Presente
Ciudad.

Con relación al Contrato No.: **MAT-OP-OD-008/2020**, relativa a: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AVENIDA LAURO VILLAR LATERAL NORTE DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**

Por medio de este conducto se le solicita la autorización de volúmenes excedentes los cuales se requieren para el buen funcionamiento de la obra en mención, se anexa tabla de conceptos.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN EXCEDENTE
2	DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	24.37
3	TRAZO Y NIVELACION.	M2	23.83
4	EXCAVACION EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.55 MTS.	M3	13.12
5	CARGA Y ACARREO E MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A LIMITES DE LA CIUDAD.	M3	25.5
6	CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 50 CM DE ESPESOR INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO DESCOJETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	23.83

Sin otro asunto en particular reciba un saludo cordial.

Atentamente:

Luis Lauro Gutiérrez González
Administrador Único

L R PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, SA DE CV

Sendero Nacional No. 1568, Esq. Con Alianza. Col. Lopez portillo C.P. 87348
H. Matamoros, Tamaulipas. Tel-Fax: (868) 810-08-52 / (868) 810-05-39



Planta Asfalto de Matamoros, S.A. de C.V.
 OFICINA AV.SOLIDARIDAD N° 73 ENTRE ACAPULCO Y OAXACA FRACC.VICTORIA SECC.FIESTA
 H.MATAMOROS,TAMPS.C.P.87390 TELS.(868)819-3720,819-3721 Y 819-3722 FAX.(868)819-3723
 PLANTA:CARRETERA SENDERO NACIONAL.KM.3.5
 TEL.(868) 810,0705 Y 810-0707

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO ASFÁLTICO


OBRA: Rehabilitación de Pavimento Asfáltico Avenida Lauro Villar Lateral Norte de Callejon 8(0+464)A Fidencio Trejo(0+740),En El Municipio de Matamoros PRUEBA N° 2
 TRAMO: avenida Lauro Villar Lateral norte de callejon 8(0+464)a fidencio
 LOCALIZACIÓN: MATAMOROS, TAMAULIPAS FECHA: 10/03/2020
 ATENCIÓN: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO,S.A.DE C.V. OPERADOR:
 CALCULO: ING.VICENTE PADRON P.

Descripción del Material	MEZCLA ASFÁLTICA	PARA USARSE EN	CARPETA
Tratamiento Previo al Muestreo	CALENTAMIENTO Y MEZCLADO		
Clase de Deposito Muestreado	BANDA TRANSPORTADORA		
Ubicación del Banco de donde procede el material petreo:	CRUILLAS TAMAULIPAS		

Viaje No. _____ Tendido en km. _____ a km. _____ Carril _____
 Temp. de la Mezcla al salir de la Planta 166 °C, en el Tendido _____ °C, al iniciar la Compactación _____ °C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	P.V. Seco Suelto kg / m3	
	Mallas N°	% Que Pasa
	1"	100
	3/4"	100
	1/2"	96
	3/8"	88
	1/4"	70
	4	59
	10	39
	20	23
	40	13
	60	10
100	7	
200	3	
Densidad relativa		
Absorción %		
Desgaste %		
% de Trituración		
Part. Alargadas %		
Part. Lajeadas %		
Equiv. de Arena %		
Contracc. Lineal %		
PERDIDA DE ESTABILIDAD POR INMERSION EN AGUA		

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

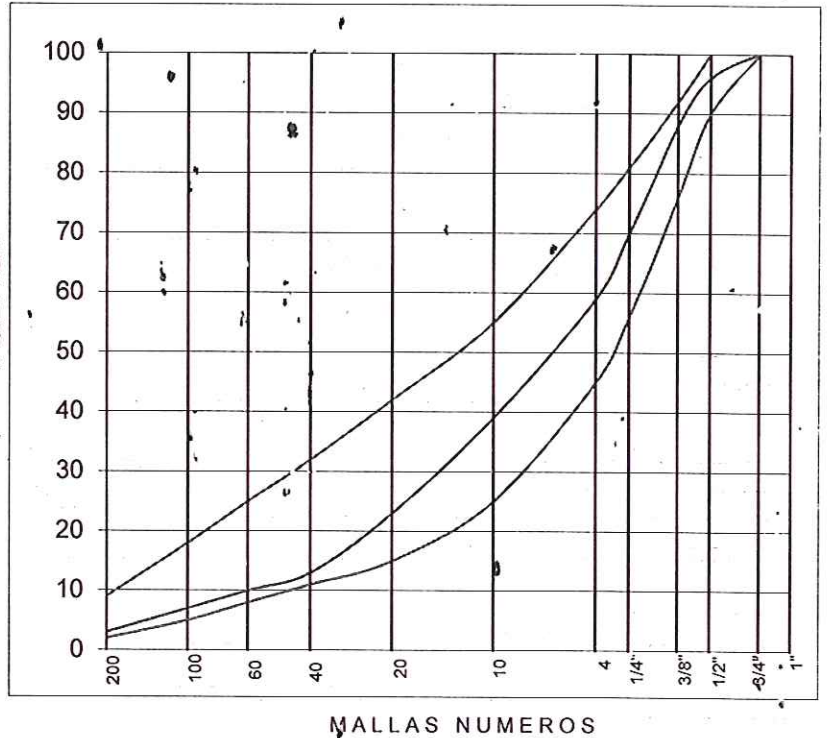

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA		PROYECTO
CONTENIDO ASFALTO %	5.1	
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD %	
AFINIDAD		

CARACT. DE LA MEZCLA	ESPECIFICACIÓN
P.V. kg/m3	2362
Estabilidad kg.	915 816 MIN
Flujo mm.	3.2 2 A 3.5
Vacios %	3.0 3 A 5
V.A.M. %	14.9 14 MIN

CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO	
Tipo	PG 64-22
Penetración	
Viscosidad	
Tem. Precom.	
Tem. de Aplic.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
 LA MEZCLA ANALIZADA SE CONSIDERA ACEPTABLE F

LABORATORISTA <i>Vicente Padron</i> ING.VICENTE PADRON PORTILLA	JEFE DE LABORATORIO <i>Ramon Sampayo</i> ING.RAMON SAMPAYO ZUAZUA Y/O MATIAS PEREZ VILLARREAL	RECIBE
---	--	--------



Planta Asfalto de Matamoros, S.A. de C.V.
 OFICINA AV.SOLIDARIDAD N° 73 ENTRE ACABULCO Y OAXACA FRACC.VICTORIA SECC.FIESTA
 H.MATAMOROS,TAMPS.C.P.87390 TELS.(868)819-3720,819-3721 Y 819-3722 FAX.(868)819-3723
 PLANTA:CARRETERA SENDERO NACIONAL.KM.3.5
 TEL.(868) 810-0705 Y 810-0707

INFORME DE ENSAYE DE CONCRETO ASFÁLTICO


OBRA: Rehabilitación de Pavimento Asfáltico Avenida Lauro Villar Lateral Norte de Callejon 8(0+464) a Fidencio Trejo(0+740), En El Municipio de Matamoros PRUEBA N° 1
 TRAMO: avenida Lauro Villar Lateral norte de callejon 8(0+464) a fidencio
 LOCALIZACIÓN: MATAMOROS, TAMAULIPAS FECHA: 10/03/2020
 ATENCIÓN: LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. OPERADOR:
CALCULO: ING.VICENTE PADRON P.

Descripción del Material	MEZCLA ASFALTICA	PARA USARSE EN	CARPETA
Tratamiento Previo al Muestreo	CALENTAMIENTO Y MEZCLADO		
Clase de Deposito Muestreado	BANDA TRANSPORTADORA		
Ubicación del Banco de donde procede el material petreo:	CRUILLAS TAMAULIPAS		

Viaje No. _____ Tendido en km. _____ a km. _____ Carril _____
 Temp. de la Mezcla al salir de la Planta 164 °C, en el Tendido _____ °C, al iniciar la Compactación _____ °C

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	P.V. Seco Suelto kg / m3			
	COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA	Mallas N°	% Que Pasa	
		1"	100	100.00
		3/4"	100	100.00
		1/2"	98	90-100
		3/8"	87	76-92
		1/4"	68	56-81
		4	57	45-74
		10	40	25-55
		20	21	15-42
		40	14	1-32
		60	9	8-25
100	7	5-18		
200	4	2-9		
Densidad relativa				
Absorción %				
Desgaste %				
% de Trituración				
Part. Alargadas %				
Part. Lajeadas %				
Equiv. de Arena %				
Contracc. Lineal %				
PERDIDA DE ESTABILIDAD POR INMERSION EN AGUA				

GRÁFICA DE COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA

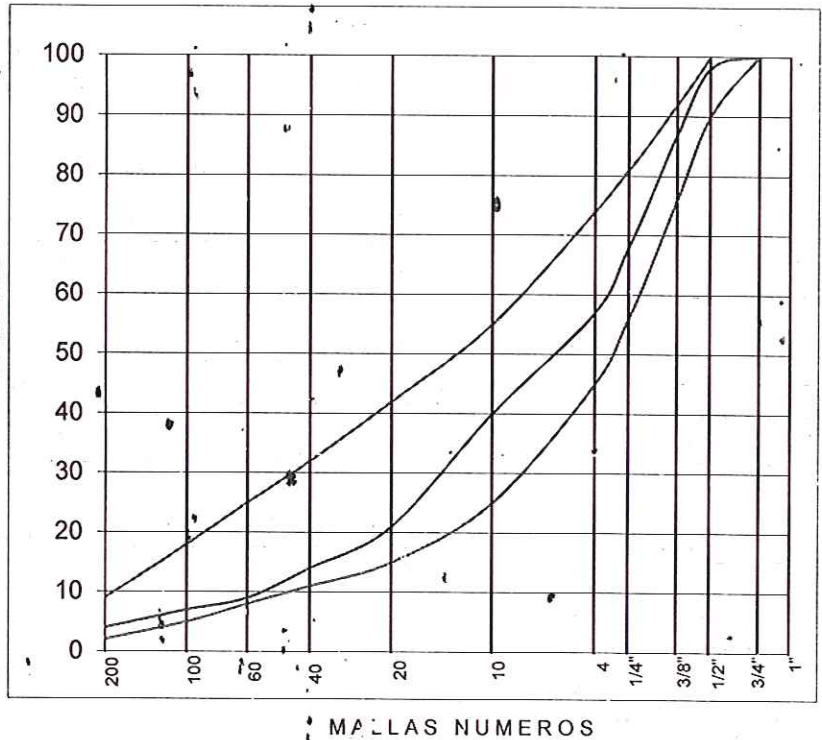

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA		PROYECTO
CONTENIDO ASFALTO %	5.1	
ADITIVO USADO	MARCA	
	TIPO	
	CANTIDAD %	
AFINIDAD		

CARACT. DE LA MEZCLA	ESPECIFICACIÓN
P.V. kg/m3	2365
Estabilidad kg.	890 " 816 MIN
Flujo mm.	3.2 2 A 3.5
Vacios %	3.0 3 A 5
V.A.M. %	14.8 14 MIN

CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO	
Tipo	PG 64-22
Penetración	
Viscosidad	
Tem. Precom.	
Tem. de Aplic.	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
 LA MEZCLA ANALIZADA SE CONSIDERA ACEPTABLE F

LABORATORISTA ING.VICENTE PADRON PORTILLA	JEFE DE LABORATORIO ING.RAMON SAMPAYO ZUAZUA Y/O MATIAS PEREZ VILLARREAL	RECIBE
--	--	--------



Gobierno Municipal de Matamoros

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
BITACORA DE OBRA

OBRA: <i>Rehabilitación de Pav Asfáltico</i>	UBICACIÓN: <i>Dv. Lazo Jillo, Lateral norte de callejón 8 a Fidencio trejo.</i>	No. DE CONTRATO: <i>Mat op. 00-008/2020</i>
		FECHA: <i>2-03-2020</i>
		MUNICIPIO: <i>EL MATAMOROS TAMAULIPAS</i>

Inician los trabajos de demolición de guarnición y banquetas de camellones, así como extracción de palmas para disposición de parques y Jardines. 3-03-2020

Realizan excavación en área de camellón y suministro de sulfato de calcio en áreas de los camellones 4-03-2020

Inician con el fresado de área de carpeta en cuerpo lateral norte 5-03-2020

continúan con el fresado de carpeta existente en lateral norte 6-03-2020

Se espera a que de pronto el área de camellones con base de sulfato para el tiro de carpeta.

Se realiza el tiro de carpeta asfáltica en área de cuerpo lateral norte. 10-03-2020

Se realizan trabajos de renovación de pozos de visita y caja de válvulas 11-03-2020

Se tienen terminados los trabajos contratados por lo que se cierra la presente bitácora de obra. 12-03-2020

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

ING. EDER K. HERNANDEZ OLVERA



Gobierno Municipal de
Matamoros

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICENCIA DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

CONTRATO No. **18**

LICENCIA No.

MAT-OP-OD-008/2020

FECHA:

02-mar-20

19-OP/20

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL		LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A DE C.V.			
DIRECCIÓN CALLE:		AV SENDERO NACIONAL		NÚMERO:	1568
ENTRE CALLES:		ESQUINA CALLE ALIANZA			
COLONIA, FRACCIONAMIENTO O LOCALIDAD RURAL		JOSE LOPEZ PORTILLO		C.P.	87348
TELEFONO					

SOLICITUD DE OBRA

CARPETA	2,158.42	m ²	BANQUETAS	m ²	GUARNICIONES	ml.
INTRODUCCION DE TUBERIA		ml.	EXCAVACIÓN	m ²	RELLENOS	m ²
OTROS	(X)	ESPECIFIQUE	PAVIMENTO ASFALTICO			

DESCRIPCION DE LA OBRA

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AVENIDA LAURO VILLAR LATERAL NORTE DE CALLEJON 8 (0+464) A FIDENCIO TREJO (0+740), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

DATOS DEL PREDIO Y ENTORNO URBANO INMEDIATO

UBICACIÓN

CALLE:	CALLE DIAGONAL CUAUHTEMOC
ENTRE CALLES:	CALLE SEXTA Y CALLE MINA
COLONIA, FRACCIONAMIENTO O LOCALIDAD RURAL	ZONA CENTRO

DIMENSIONES DEL PREDIO

SUPERFICIE	2,158.42	m ²	DIMENSIÓN FRENTE:	m	FONDO	m
------------	----------	----------------	-------------------	---	-------	---

CROQUIS DE UBICACIÓN



DATOS DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

NOMBRE	JUAN CARLOS ALONSO REYES		No DE REGISTRO	I-393
DIRECCIÓN	CALLE BALTAZAR No. 23 COL. LOS REYES		CÉDULA PROFESIONAL	8354282
TELÉFONO	8681-15-9627		CORREO ELECTRÓNICO	carlosalonso1@hotmail.com
COLEGIO DE PROFESIONISTAS Y/O ASOCIACION DE ARQ, ING, Y CONSTRUCCION EN QUE PARTICIPA			Colegio de Ingenieros Civiles de Matamoros, A.C.	
CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL	NOMBRE		CED. PROF.	
CORRESPONSABLE POR PROYECTO	NOMBRE		CED. PROF.	

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN QUE SE OTORGA

FECHA DE EXPEDICIÓN	
FECHA DE VENCIMIENTO	
RESTRICCIONES DE CONSTRUCCIÓN	

DATOS BASE PARA CAUSACIÓN DE PAGO DE DERECHOS SEGÚN ACCIÓN AUTORIZADA

SUPERFICIE POR CONSTRUIR			
LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR ESTIMADO
CONSTRUCCION	2,158.42	m ²	
BANQUETA			
GUARNICIÓN			
EXCAVACION			
INTRODUCCION DE TUBERIA			
RELLENOS			
TOTAL POR CONSTRUIR			
SUPERFICIE TOT. DEL TERRENO			
COSTO TOTAL DE LA OBRA			\$ 1,823.86
	CONCEPTO		COSTO (M.N)
	POR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN		
	REFRENDO DE PERITO		
	REHABILITACION		

OBLIGACIONES DEL SOLICITANTE

- * AJUSTARSE A LO QUE SEÑALAN LAS PLANOS AUTORIZADOS Y/O ESPECIFICACIONES
- * ANTES DE INICIAR CAMBIOS, OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE ESTA SECRETARIA
- * MANTENER DURANTE TODO EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y HASTA LA TERMINACIÓN UN DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
- * DAR AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA
- * TENER A LA VISTA EN LA OBRA LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LOS PLANOS AUTORIZADOS Y EL NUMERO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
- * PERMITIR EL ACCESO A LA OBRA Y A LA BITÁCORA DEL INSPECTOR DE LA SECRETARIA
- * NO INVADIR LA VÍA PUBLICA CON MATERIAL O ESCOMBRO. EN SU CASO SOLICITAR PERMISO

OBLIGACIONES DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA

- * TENER EN LA OBRA LA BITÁCORA ANOTANDO TODOS LOS EVENTOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
- * EFECTUAR REPORTES DE LA OBRA QUINCENALES A LA COORDINACION DE CONTROL URBANO, INCLUYE TEXTO Y FOTOGRAFÍAS EN QUE REGISTRE EL AVANCE.
- * REPORTAR DEMORAS, SUSPENSIONES Y REANUDACIÓN DE OBRA
- * REPORTAR ANOMALÍAS QUE AFECTEN EL BUEN DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN
- * PERMITIR EL ACCESO A LA OBRA Y A LA BITÁCORA A LOS INSPECTORES DE ESTA SECRETARIA

NOTA: LA PRESENTE LICENCIA ES PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS, SE DEBERA LLEVAR A CABO EL TRAMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION EN ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO ANTES DE INICIAR LA OBRA, EN LOS FORMATOS OFICIALES DE ESTA ADMINISTRACION (SOLICITUD Y PLANOS) CON LA FIRMA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.) CON REGISTRO EN ESTE MUNICIPIO.

 LUIS LAURO GUTIERREZ GONZALEZ
 LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO, S.A DE C.V.

 ING. JUAN CARLOS ALONSO REYES

AUTORIZACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
 JUN 18 - 2021
ING MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA





Gobierno Municipal de
Matamoros

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

H. Matamoros, Tamaulipas a 03 de Marzo del 2020

**LR PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE MEXICO S.A. DE C.V.
PRESENTE.-**

En relación a la obra denominada Rehabilitación de pavimento asfáltico de la Av. Lauro Villar de lateral Norte de Callejón 8 (0+464) a Fidencio Trejo (0+740), bajo el número contrato MAT-OP-OD-008/2020, y en atención a su oficio de solicitud con fecha 02 de Marzo del presente año donde nos solicita la autorización de los trabajos excedentes, autorizados por la residencia de obra para el buen funcionamiento de la misma, le comento que esta dirección autoriza dichos volúmenes.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración.



Atentamente

Arq. Samuel Vega García
Director de Obras Públicas

c.c.p. archivo

Calle Sexta entre González y Morelos S/N, Zona Centro
H. Matamoros, Tamaulipas. México. C.P. 87300
Tel. (868) 810.8000 Ext. 53270 www.matamoros.gob.mx
