Secretaría de
Desarrollo Urbano

H. Matamoros, Tamaulipas a 21 de enero del 2026

No. De Oficio: SECDU/DIOP-E-0011/2026
ASUNTO: Pago de Factura

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Anexo al Presente envío a usted para su respectivo Pago la siguiente Factura Original con Folio: **220** del Contratista **RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.** Para Pago por: **ESTIMACION No. 1** al amparo del contrato de Obra Pública No. **MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2025** Relativo a la Obra **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**

Con un Importe de : $ 189,020.31
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 31/100 M.N.)

CONTRATO: MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2025

PROGRAMA: HIDROCARBUROS REGION MARITIMA

Validó

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
2024 - 2027

Vo. Bo.

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.

RECIBIDO
Laura
28 ENE. 2026
12:28pm

TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

Matamoros 200 Bicentenario

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ.
RVC190725GB6
AV. DIVISION DEL NORTE 35
MODELO 87360
Matamoros Tamaulipas México
Teléfono: (868)8167664

I Ingreso - Factura Constructora

220
Certificado Digital: 00001000000705383318
Fecha: 2026-01-21T12:37:45

Folio Fiscal:
73a51b34-f908-4ddf-8b51-1f52e8a519a6

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza
Lugar de Expedición: 87360 Matamoros Tamaulipas México

Cliente Receptor

Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social:	MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
RFC:	MMT320612AWA
Dirección:	SEXTA S/N
Colonia:	ZONA CENTRO
CP:	87300

Localidad:	
Mpio/Alc.ía:	Matamoros
Estado:	Tamaulipas
País:	México

Condiciones:

Moneda: MXN-Pesos
Forma de Pago: 99-Por definir
Método de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	72141103 - RECIBI DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE $189,020.31 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 31/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION 1 REFERENTE A PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE EN LA COL. SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS DEL CONTRATO: MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2025	$236,027.56	$236,027.56

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. MATAMOROS, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. MATAMOROS, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
2024 - 2027

IMPORTE DEL CONTRATO	$848,552.28
PAGOS ANTERIORES:	$0.00
POR EJERCER:	$848,552.28
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:	$236,027.56
DEDUCTIVAS:	$0.00
SUBTOTAL:	$236,027.56
IVA 16%:	$37,764.41
SUBTOTAL:	$273,791.97
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:	$0.00
ANTICIPOS:	$82,137.59
3% I.C.I.C:	$708.08
2% D.I.F.:	$472.06
1% ORGANO FISCALIZACION ESTATAL:	$273.79
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL:	$1,180.14
SUBTOTAL:	$84,771.66
NETO A PAGAR:	$189,020.31

Importe con Letra: Ciento ochenta y nueve mil veinte Pesos 31/100 MXN

Sello digital del CFDI:

FvWMrZ2K6XxeDQkngtAJyNQI5ff2p3zphu9QSkDWCztSgh1QLrC/PIt5mUNI74R8V2zIGq
+af5dGz/iw2AMzm4WRJKGMetZ4oDSktraGd1wBCuFcOmsd4OwolT6PPwovd0GA7zQE0B9ZkzPSx16v1pg2mAMm2gzdt4DE8F1aPUT/I1vD
oJvlKDs7Db29N9dXS5EAzP8FC+AO/GB7Ziiri/E8XgYPWhx9Na4dXKsMdtlpiiZFY1/S8jZHWnxrTLrdbfIxFfFxMOW
+N7ejJ3JNuc7/7VB++S3DQehXgUhw5p/ExZkAMm1M/ujC95gIjlaJuvODRBNQP9CYFYEEN06Mog==

Sello del SAT:

DKMqbh7SaPXL38vdRdtvgtfuyv8aS4iV30sqLcJ8z6pqoBxujv/lgSCxZXFmp
+iaRxxcZ859+KaLjzHzdfTxK6OL6ldLcLoMcVwxraBHiistVgnaaHaG48oIYvch8WwNPPQt1k9PF2+8qKSIYJ7
9VA/JXiCvYOJ7ltiliEc6AAhtAEcAGUxGlSl2Bn2yOK6poMmBTv1fyawF8S8MgNN9SHxoqv+oIwC
+ckBgBcEcOJVDUWZVVKuojK/LrPQylQYTQOQSplI/6TADCfyfoMx9uGX3Mws4/9X9ZpWuofqLm6bVs1eDGNCZX
5t/NyMaETM+BGnVjkhpSaglZhYEnHQmjA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73a51b34-f908-4ddf-8b51-1f52e8a519a6|2026-01-21T12:37:45|LSO1306189R5|
FvWMrZ2K6XxeDQkngtAJyNQI5ff2p3zphu9QSkDWCztSgh1QLrC/PIt5mUNI74R8V2zIGq
+af5dGz/iw2AMzm4WRJKGMetZ4oDSktraGd1wBCuFcOmsd4OwolT6PPwovd0GA7zQE0B9ZkzPSx16v1pg2mAMm
2gzdt4DE8F1aPUT/I1vDoJvlKDs7Db29N9dXS5EAzP8FC
+AO/GB7Ziiri/E8XgYPWhx9Na4dXKsMdtlpiiZFY1/S8jZHWnxrTLrdbfIxFfFxMOW+N7ejJ3JNuc7/7VB+

+S3DQehXgUhw5p/ExZkAMm1M/ujC95gIjlaJuvODRBNQP9CYFYEEN06Mog==|00001000000719545303||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:2026-01-21T12:37:45

Rfc del proveedor de certificación: LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	PERIODO: DEL	29-nov-2025 AL 12-dic-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	FECHA:	12 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	COLONIA SAN PABLO	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $ 273,791.97

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **189,020.31** (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS 31/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 1 (UNO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	848,552.28 ✓			
PAGOS ANTERIORES: $	0.00 ✓			
POR EJERCER: $	848,552.28 ✓		$	848,552.28
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	236,027.56 ✓			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	236,027.56			
16% I.V.A.: $	37,764.41 ✓			
SUB TOTAL: $	273,791.97 ✓	$ 273,791.97	$	273,791.97
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	82,137.59 ✓			
3‰ I.C.I.C $	708.08 ✓			
2‰ D.I.F. $	472.06 ✓			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	273.79 ✓			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	1,180.14 ✓			
SUB TOTAL: $	84,771.66 ✓	$ 84,771.66		
NETO APAGAR: $	**189,020.31** ✓	$ **189,020.31**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $			$	574,760.31 ✓

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	29-nov-2025 al 12-dic-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	12 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	COLONIA SAN PABLO	**HOJA:** 1	**DE:** 3
CONTRATISTA:	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
0	**PAVIMENTACION ASALTICA**								
P.01	TRAZO Y NIVELACIÓN.	m2	$ 24.44	419.22	0.00	399.60	399.60		9,766.22
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.40 MTS.	m3	$ 108.72	167.69	0.00	179.82	179.82	12.13	19,550.03
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.	m3	$ 253.94	218.00	0.00	233.77	233.77	15.77	59,363.55
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS CON CAL AL 2% A NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. DE 15CM DE ESPESOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	m2	$ 108.27	419.22	0.00	399.60	399.60		43,264.69
P.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN TERRACERÍA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXA) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2", TORNILLOS DE BRONCE, TUBO PVC 4" CON TAPON MACHO,CONEXIÓN A RED EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza.	$ 6,369.49	3.00	0.00	0.00	0.00		
P.06	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA TERRACERÍA DE 6.00 ML. INCLUYE: TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO,YEE DE 8" X 6", CODO DE 6" X 45°, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACION CON DOS CODOS DE 6" X 45° Y YEE DE 6" CON TAPON MACHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza.	$ 12,220.70	3.00	0.00	0.00	0.00		
								ESTA HOJA $	**131,944.49**
								ACUMULADO $	**131,944.49**

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	29-nov-2025 al 12-dic-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	12 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	COLONIA SAN PABLO	**HOJA:** 2	**DE:** 3
CONTRATISTA:	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 X 45CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE LA GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO "L".	ml	$ 906.30	93.16	0.00	0.00	0.00		
P.08	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO. (MATERIAL SUMINISTRADO POR MUNICIPIO)	M3	$ 734.13	140.44	0.00	133.87	133.87		98,277.98
P.10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA MARSHALL INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULCION ASFALTICA ECL-60 A RAZÓN DE 1.5 LTO/M² BARRIDO DE BASE IMPREGNADA A MANO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZÓN DE 0.50 LTO/M², ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA CON AGREGADO MÁXIMO 3/4 Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	m2	$ 539.04	381.96	0.00	0.00	0.00		
P.11	NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE, INCLUYE: CORTE DE 1.50 X1.50 MTS; CON CORTADORA DE PISO, RETIRO DE CARPETA, EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	pza.	$ 7,262.75	1.00	0.00	0.00	0.00		
P.12	NIVELACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS COLOCANDO LA TAPA, MARCO Y CONTRA MARCO DE FO.FO. EXISTENTE, INCLUYE: CORTE DE .40 X.90 MTS; CON CORTADORA DE PISO, DEMOLICIÓN DE LOSA EXISTENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 CM. DE ESPESOR, VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	pza.	$ 11,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00		
								ESTA HOJA $	**98,277.98**
								ACUMULADO $	**230,222.47**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO :
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	29-nov-2025 al 12-dic-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	12 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	COLONIA SAN PABLO	**HOJA:**	3 **DE:** 3
CONTRATISTA:	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
P.13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RENIVELACION DE REGISTROS SANITARIOS, EXCAVACIÓN DE 17 CM. PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO DE 10CM DE ESPESOR, CIMBRA Y DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	$ 891.00	139.74	0.00	0.00	0.00		
P.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	$ 5,805.09	1.00	0.00	1.00	1.00		5,805.09
P.15	SUMINISTRO Y SEÑALIZACIÓN DE LETREROS DE 0.61X0.61 MTS., EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS., EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, PARA ALTO, CON NOMENCLATURA DE LAS CALLES FORMADA POR 2 LAMINAS DE 20X90 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA COLOR BLANCO Y LEYENDAS RECORTADAS EN VARIOS COLORES POR COMPUTADORA, INCLUYE: TORNILLERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	$ 7,757.56	2.00	0.00	0.00	0.00		
0	0	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00		
								ESTA HOJA $	5,805.09
								ACUMULADO $	236,027.56
								ESTA ESTIMACION $	236,027.56

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.

AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

H. MATAMOROS TAM. 12 DE DICIEMBRE 2025

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE INFORMA QUE LA OBRA: **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS** Y CON NUMERO DE CONTRATO: **MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2025**, SE REALIZARON TRABAJOS EXTRAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, LOS CUALES SE SOLICITA SU APROBACION.

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN			
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.40 MTS.	12.13	$108.72	$1,318.77	12.13 ✓
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.	15.77	$253.94	$4,004.63	15.77 ✓

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN Y APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA MANDARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:

LIC. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección de
Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 13 DE DICIEMBRE DEL 2025

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.
CLAUDIA GUERRA NORIEGA
Presente.-

En relación a la obra denominada PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS al amparo del contrato de Obra Pública No.MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2025, hago de su conocimiento que esta Direccion a mi cargo autoriza los Volumenes de Obra Excedentes inscritos en la Orden de Actualizacion incluida en la Estimacion No 1 del Referido Contrato para su tramite y pago

Atentamente

ING FERNANDO REQUENA CHAVEZ
Director de Obras Publicas

c.c.p. archivo

Matamoros Avanza

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

PERIODO:	HOJA:

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

ORDEN DE ACTUALIZACION	NUM. CONTRATO: MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	NUM. DE ESTIMACION: 1 (UNO)	DEL 29-nov-2025 AL 12-dic-2025	No DE

CONTRATISTA: **RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.**	OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PROGRAMA:
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MATAMOROS	**HIDROCARBUROS-RM**

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN				INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA 1a.	PRORROGA 2a.
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.40 MTS.	12.13	$108.72	$1,318.77	12.13			
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.	15.77	$253.94	$4,004.63	15.77			
			SUMA 1 =	**$5,323.40**				

EXPLICACION AMPLIA: (QUE, COMO, DONDE,QUIEN, PORQUE, CUANDO)

SE EJECUTA ESTE VOLUMEN ADICIONAL POR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CAUSAS

* CONDICIONES NATURALES DIS-TINTAS A LAS SUPUESTAS:	X	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES:	
* CAMBIOS DE DISEÑO:		* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO:	
* CAMBIOS DE LOCALIZACION:		* RETRASO DE NUEVOS PAGOS:	
* ERROR INICIAL:		* RECORTE PRESUPUESTAL:	
* OTROS:			

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO: del**	29-nov-2025 **al** 12-dic-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	12 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	COLONIA SAN PABLO	**HOJA:**	1 **DE:** 2
CONTRATISTA:	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	**PAVIMENTACION ASALTICA**										
P.01	TRAZO Y NIVELACIÓN.			44.40	9.00		M2		399.60		
								PRESENTE=	**399.60** ✓	399.60	95.32%
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.40 MTS.			44.40	9.00	0.45	M3		179.82 ✓	179.82	
								PRESENTE=	**179.82** ✓	179.82	100%.
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.			44.40	9.00	0.45	M3	1.30	233.77 ✓	233.77	
								PRESENTE=	**233.77** ✓	233.77	100%.
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERIAS CON CAL AL 2% A NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. DE 15CM DE ESPESOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO.			44.40	9.00		M2		399.60 ✓		
								PRESENTE=	**399.60** ✓	399.60	95.32%
P.08	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO. (MATERIAL SUMINISTRADO POR MUNICIPIO)			44.40	9.00	0.20	M3		79.92		
				44.40	8.10	0.15	M3		53.95 ✓		
								PRESENTE=	**133.87** ✓	133.87	95.32%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO: del**	29-nov-2025 **al** 12-dic-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	12 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	COLONIA SAN PABLO	**HOJA:**	2 **DE:** 2
CONTRATISTA:	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
P.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA						PZA		1.00		
								PRESENTE=	1.00	1.00	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	29-nov-25 al 12-dic-25
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	12 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE: 2
CONTRATISTA:	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.		

CROQUIS

LOCALIZACION



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	29-nov-25 al 12-dic-25
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	12 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE:
CONTRATISTA:	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.		

2

CROQUIS

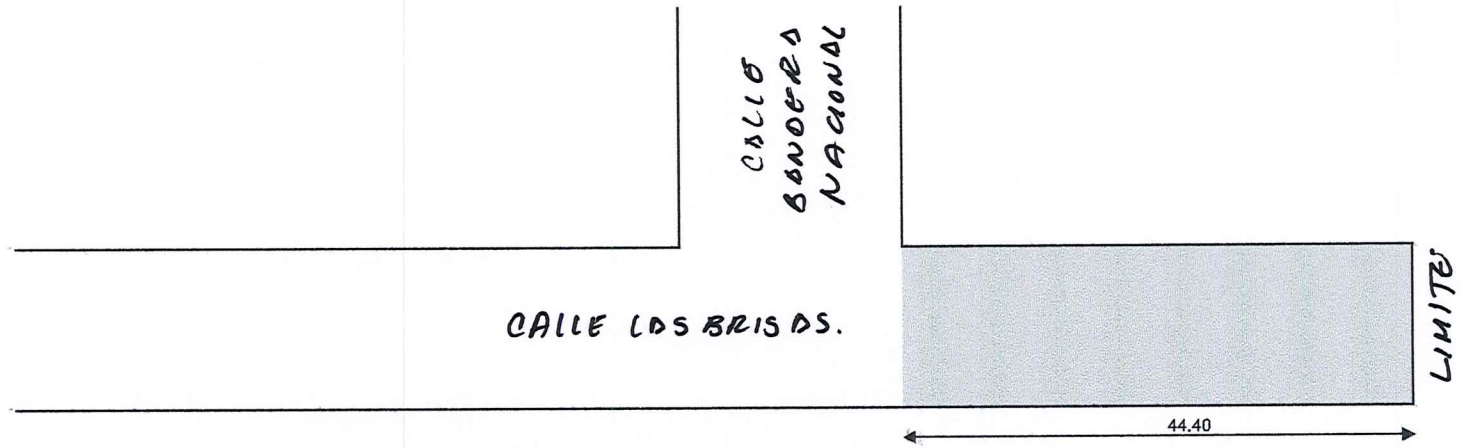

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	29-nov-25 12-dic-25
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	12 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	1 DE: 2
CONTRATISTA:	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS

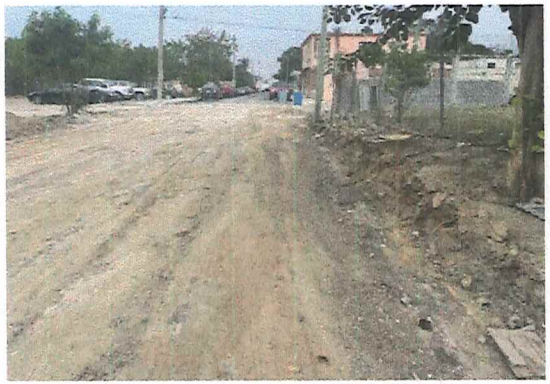






EXCAVACION, CARGA, ACARREO Y TRATAMIENTO DE TERRACERIA.

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-08/2025	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	HIDROCARBUROS-RM	**PERIODO:** del	29-nov-25 12-dic-25
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA:**	12 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE:
CONTRATISTA:	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS





SULFATO

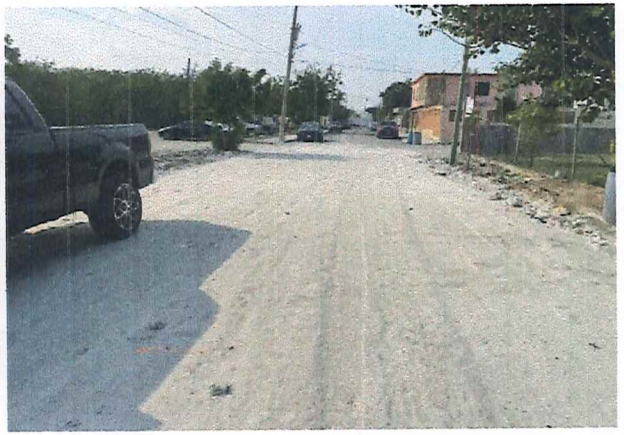





ANUNCIO DE OBRA

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.

AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

H. MATAMOROS TAM. 29 DE NOVIEMBRE 2025

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE INFORMA QUE LA OBRA: **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS** Y CON NUMERO DE CONTRATO: **MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2025** INICIO LOS TRABAJOS FISICOS EL DIA DE HOY.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN Y APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA MANDARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:

LIC. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.

AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

H. MATAMOROS TAM. 29 DE NOVIEMBRE 2025

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA EMPRESA **RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ S.A. DE C.V.** MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE: POR ESTE CONDUCTO COMUNICO A USTED QUE HE TENIDO A BIEN DESIGNAR AL **ING. LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL** COMO RESIDENTE DE LA OBRA. **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS** LA CUAL NOS FUE APROBADA CON NUMERO DE CONTRATO. **MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2025**

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN Y APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA MANDARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:

LIC. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS

CARRETERA: DE BANDERA NACIONAL A LIMITE EN LA COLONIA SAN PABLO

EJECUTORA: RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ S.A DE C.V

CIUDAD: MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No.:** RVC/5131-1291

REFERENCIAS:M-MMP.1/01/03 **FECHA INFORME:** 5 de diciembre de 2025

ESPESOR: 15.0 cms. Compactación [X] Recompactación [ ]

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 95.0 CAPA ENSAYADA: TERRENO NATURAL(MEJ. CON CAL HIDRATADA)

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
		CALLE LAS BRISAS COLONIA SAN PABLO						
3140	-	DERECHO	16.0	17.6	20.3	1598	1680	95.1
3141	-	CENTRO	15.0	18.0	20.3	1618	1680	96.3

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS

CARRETERA: DE BANDERA NACIONAL A LIMITE EN LA COLONIA SAN PABLO

EJECUTORA: RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ S.A DE C.V

CIUDAD: MUNICIPO H. MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No.:** RVC/5132-1291

REFERENCIAS:M-MMP.1/01/03 **FECHA INFORME:** 15/12/2025

ESPESOR: 35.0 cms. Compactación [X] Recompactación [ ]

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 95.0 CAPA ENSAYADA: **SUB-BASE (SULFATO DE CALCIO)**

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
		CALLE LAS BRISAS COLONIA SAN PABLO						
3142	-	DERECHO	35.0	37.2	39.0	1341	1410	95.1
3143	-	CENTRO	35.0	35.8	39.0	1358	1410	96.3

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL :	GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
UNIDAD LOCAL DE OBRA :	MUNICIPIO DE MATAMOROS
UNIDAD EJECUTORA :	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EMPRESA CONTRATISTA :	RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ.
CONTRATO :	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2025
OBJETO DEL CONTRATO :	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

LUGAR

ESTADO :	TAMAULIPAS
MUNICIPIO :	MATAMOROS
CALLE :	LAS BRISAS
NÚMERO EXTERIOR :	
NÚMERO INTERIOR :	
CÓDIGO POSTAL :	87320
COLONIA :	ESTERO SAN PABLO
PERIODO :	DEL 29/11/25 AL 28/12/25
MONTO DEL CONTRATO :	731,510.59 MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

No. de nota: 1 **Fecha y hora:** 02/12/25, 03:59 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Centro de Trabajo : OBRAS PUBLICAS

Teléfono : 8688108000

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ.

Domicilio : Calle : DIVISION DEL NORTE No. Ext. 29 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM- **Proyecto :** FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y

Plazo : 30 Días naturales. **Fecha de Inicio :** 29/11/25 **Fecha de Término :** 28/12/25

Monto : 731,510.59 MXN

Objeto del contrato : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LAS BRISAS DE CALLE BANDERA NACIONAL A LIMITE, EN LA COLONIA SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE BANDERA NACIONAL A LIMITE

Latitud : 25.8909450221 **Longitud :** -97.5270132914

Calle : LAS BRISAS **Número Interior :** LAS BRISAS

Número Exterior : **C.P. :** 87320

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : ESTERO SAN PABLO **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CÉDULA PROFESIONAL

Domicilio : Calle : TAURO No. Ext. 18 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 8108070

Correo Electrónico : luis.vurgell@gmail.com

Residente

Nombre : RICARDO RANGEL ENRIQUEZ

Profesión : ARQ.

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : PRIVADA SIERRA MADRE No. Ext. 24 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 8108070

Correo Electrónico : arq_ricardorangel@hotmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 30 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Firmada por: LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 02/12/25, 04:00 PM

Tipo de nota: ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.

Contenido

CON FECHA 29/11/2025 EL RESIDENTE ESTATAL RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, REPRESENTANTE DEL (LA) MUNICIPIO DE MATAMOROS, HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA UBICADO EN CALLE: LAS BRISAS, COLONIA: ESTERO SAN PABLO, DELEGACIÓN / MUNICIPIO: MATAMOROS, ESTADO: TAMAULIPAS, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS, C.P.: 87320 SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL QUIEN RECIBE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 14/01/26, 08:32 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/11/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 29 DE NOVIEMBRE 2025.- SE INICIAN LOS TRABAJOS FISICOS CON TRAZO Y NIVELACION DEL AREA A TRABAJAR DE ACUERDO A PROYECTO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 14/01/26, 08:40 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/12/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE TRABAJA EN EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESTOS TRABAJOS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 14/01/26, 08:42 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/12/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE TRABAJA EN CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION (APERTURA DE CAJA).

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 14/01/26, 08:44 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 05/12/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO DE TERRACERIA CON CAL..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 14/01/26, 08:47 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/12/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE VERIFICA FUE SUMINISTRADO EL SULFATO DE CALCIO Y SE TRABAJA EN CONFORMACION DE ESTE..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 14/01/26, 08:48 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/12/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE TRABAJA EN SEMI AFINE DEL SULFATO DE CALCIO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 14/01/26, 02:03 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL 12/12/2025 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 29/11/2025 AL 12/12/2025, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS, NÚMEROS GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTES DE LABORATORIO Y RESULTADO DE LAS PRUEBAS, PARA SU VERIFICACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 14/01/26, 02:06 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 12/12/2025 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29/11/2025 AL 12/12/2025.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 14/01/26, 02:13 PM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 12/12/2025 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2025 AL 12/12/2025, POR UN MONTO DE 236,027.56 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTISIETE 56/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: ESTADO DE CUENTA, ESTIMACION, GENERADORES, FOTOS, CROQUIS, LOCALIZACION Y DOCUMENTACION NECESARIA.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 14/01/26, 02:16 PM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 12/12/2025, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/11/2025 AL 12/12/2025 POR UN IMPORTE DE:
236,027.56 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTISIETE 56/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 40.00 %
FINANCIERO: $ 236,027.56 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 32.27 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**
