Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: DEL	05-jun-2025 AL 04-jul-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	4 de julio de 2025
UBICACIÓN:	COL. INTEGRACION FAMILIAR	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $ 725,827.73

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **501,096.44** (QUINIENTOS UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 2 (DOS)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,794,093.04			
PAGOS ANTERIORES: $	540,444.53			
POR EJERCER: $	1,253,648.51		$	1,253,648.51
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	625,713.56			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	625,713.56			
16% I.V.A.: $	100,114.17			
SUB TOTAL: $	725,827.73	$ 725,827.73	$	725,827.73
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	217,748.32			
3‰ I.C.I.C $	1,877.14			
2‰ D.I.F. $	1,251.43			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	725.83			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	3,128.57			
SUB TOTAL: $	224,731.29	$ 224,731.29		
NETO APAGAR: $	**501,096.44**	$ **501,096.44**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $			$	527,820.78

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESCANEADO

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)	
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	05-jun-2025 al	04-jul-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	4 de julio de 2025	1
UBICACIÓN:	COL. INTEGRACION FAMILIAR	**HOJA:**	**DE:**	
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.			

3

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
0	**PAVIMENTACION ASALTICA**								
P.01	TRAZO Y NIVELACIÓN.	m2	$ 23.59	1,085.31	1,084.95	-3.15	1,081.80		-74.31
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B" DE 0.40 MTS.	m3	$ 104.04	434.12	434.12	0.00	434.12		
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.	m3	$ 220.80	564.36	564.36	0.00	564.36		
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS CON CAL AL 2% A NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. DE 15CM DE ESPESOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	m2	$ 95.24	1,085.31	1,084.95	-3.15	1,081.80		-300.01
P.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN TERRACERÍA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXA) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2", TORNILLOS DE BRONCE, TUBO PVC 4" CON TAPON MACHO,CONEXIÓN A RED EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza.	$ 5,450.88	4.00	10.00	0.00	10.00		
P.06	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA TERRACERÍA DE 6.00 ML. INCLUYE: TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO,YEE DE 8" X 6", CODO DE 6" X 45°, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: PREPARACION CON DOS CODOS DE 6" X 45° Y YEE DE 6" CON TAPON MACHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pza.	$ 10,784.89	5.00	10.00	0.00	10.00		
								ESTA HOJA $	-374.32
								ACUMULADO $	-374.32

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)	
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	05-jun-2025 al	04-jul-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	4 de julio de 2025	2
UBICACIÓN:	COL. INTEGRACION FAMILIAR	**HOJA:**	**DE:**	3
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.			

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 X 45CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE LA GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO "L".	ml	$ 776.60	241.18	0.00	248.50	248.50	7.32	192,985.10
P.08	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO. (MATERIAL SUMINISTRADO POR MUNICIPIO)	M3	$ 683.66	363.58	0.00	361.86	361.86		247,389.21
P.10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA MARSHALL INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULCION ASFALTICA ECL-60 A RAZÓN DE 1.5 LTO/M² BARRIDO DE BASE IMPREGNADA A MANO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZÓN DE 0.50 LTO/M², ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA CON AGREGADO MÁXIMO 3/4 Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	m2	$ 431.52	988.84	0.00	0.00	0.00		
P.11	NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE, INCLUYE: CORTE DE 1.50 X1.50 MTS; CON CORTADORA DE PISO, RETIRO DE CARPETA, EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	pza.	$ 6,181.99	2.00	0.00	0.00	0.00		
P.13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RENIVELACION DE REGISTROS SANITARIOS, EXCAVACIÓN DE 17 CM, PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO DE 10CM DE ESPESOR, CIMBRA Y DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	$ 770.34	361.77	0.00	241.08	241.08		185,713.57
								ESTA HOJA $	**626,087.88**
								ACUMULADO $	**625,713.56**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO :
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

ESCANEADO

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)		
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	05-jun-2025 al	04-jul-2025	
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	4 de julio de 2025		
			3		3
UBICACIÓN:	COL. INTEGRACION FAMILIAR	**HOJA:**	**DE:**		
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.				

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
P.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	$ 4,841.62	1.00	1.00	0.00	1.00		
P.15	SUMINISTRO Y SEÑALIZACIÓN DE LETREROS DE 0.61X0.61 MTS., EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS., EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, PARA ALTO, CON NOMENCLATURA DE LAS CALLES FORMADA POR 2 LAMINAS DE 20X90 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA COLOR BLANCO Y LEYENDAS RECORTADAS EN VARIOS COLORES POR COMPUTADORA, INCLUYE: TORNILLERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PIEZA	$ 6,849.41	2.00	0.00	0.00	0.00		
								ESTA HOJA $	0.00
								ACUMULADO $	625,713.56
								ESTA ESTIMACION $	625,713.56

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

PERIODO:	HOJA:

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

ORDEN DE ACTUALIZACION	NUM. CONTRATO: MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	NUM. DE ESTIMACION: 2 (DOS)	DEL 05-jun-2025 AL 04-jul-2025	No 1 DE 1

CONTRATISTA: SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LOCALIDAD: MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MUNICIPIO: MATAMOROS	PROGRAMA: REVUPE

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN				INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA 1a.	PRORROGA 2a.
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 X 45CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE LA GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO "L".	7.32	$776.60	$5,684.71	7.32			
			SUMA 1 =	$5,684.71				

EXPLICACION AMPLIA: (QUE, COMO, DONDE,QUIEN, PORQUE, CUANDO)

SE EJECUTA ESTE VOLUMEN ADICIONAL POR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CAUSAS

* CONDICIONES NATURALES DIS-TINTAS A LAS SUPUESTAS:	X	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES:	
* CAMBIOS DE DISEÑO:		* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO:	
* CAMBIOS DE LOCALIZACION:		* RETRASO DE NUEVOS PAGOS:	
* ERROR INICIAL:		* RECORTE PRESUPUESTAL:	
* OTROS:			

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA

SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

H. MATAMOROS TAM. 4 DE JULIO 2025

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE LE INFORMA QUE LA OBRA: **PAVIEMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS** Y CON NUMERO DE CONTRATO: **MAT-OP-REVUPE-007/2024-25**, SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, LOS CUALES SE SOLICITA SU APROBACION.

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN			
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 X 45CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE LA GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO "L".	7.32	$776.60	$5,684.71	7.32

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN Y APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA MANDARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:

LIC. HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ESCANEADO

AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360 TEL. 868-493-90-57
RFC. SCP-1907257Y9

Dirección de
Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 07 DE JULIO DEL 2025

SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ
Presente.-

En relación a la obra denominada PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS al amparo del contrato de Obra Pública No.MAT-OP-REVUPE-007/2024-25, hago de su conocimiento que esta Direccion a mi cargo autoriza los Volumenes de Obra Excedentes inscritos en la Orden de Actualizacion incluida en la Estimacion No 2 del Referido Contrato para su tramite y pago

Atentamente

ING FERNANDO REQUENA CHAVEZ
Director de Obras Publicas

c.c.p. archivo

Matamoros Avanza

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	05-jun-2025 al 04-jul-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	4 de julio de 2025
UBICACIÓN:	COL. INTEGRACION FAMILIAR	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES


CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
00	**PAVIMENTACION ASALTICA**										
P.01	TRAZO Y NIVELACIÓN.	CORRECCION DE MEDIDA		120.20	9.00		M2		1,081.80		
							MENOS COBRO EN EST 1=		-1,084.95		
								PRESENTE=	**-3.15**	-3.15	-0.29%
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS CON CAL AL 2% A NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. DE 15CM DE ESPESOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	CORRECCION DE MEDIDA		120.20	9.00		M2		1,081.80		
							MENOS COBRO EN EST 1=		-1,084.95		
								PRESENTE=	**-3.15**	-3.15	-0.29%
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 X 45CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE LA GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO "L".			120.20			ML	2.00	240.40		
		APROCHE		8.10			ML	1.00	8.10		
								PRESENTE=	**248.50**	248.50	100.00%
P.08	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO. (MATERIAL SUMINISTRADO POR MUNICIPIO)			120.20	9.00	0.20	M3		216.36		
				119.75	8.10	0.15	M3		145.50		
								PRESENTE=	**361.86**	361.86	99.53%
P.13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RENIVELACION DE REGISTROS SANITARIOS, EXCAVACIÓN DE 17 CM, PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO DE 10CM DE ESPESOR, CIMBRA Y DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	TRAMO 1		14.00	1.35		M2		18.90		
		TRAMO 2		4.10	0.36		M2		1.48		
		TRAMO 3		7.60	1.50		M2		11.40		
		TRAMO 4		3.90	0.70		M2		2.73		
		TRAMO 5		7.70	0.45		M2		3.47		
		TRAMO 6		82.90	1.00		M2		82.90		
		TRAMO 7		120.20	1.00		M2		120.20		
								PRESENTE=	**241.08**	241.08	66.64%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	05-jun-25 al 04-jul-25
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	4 de julio de 2025
UBICACIÓN:	COL. INTEGRACION FAMILIAR	**HOJA:**	DE: 2
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.		

CROQUIS

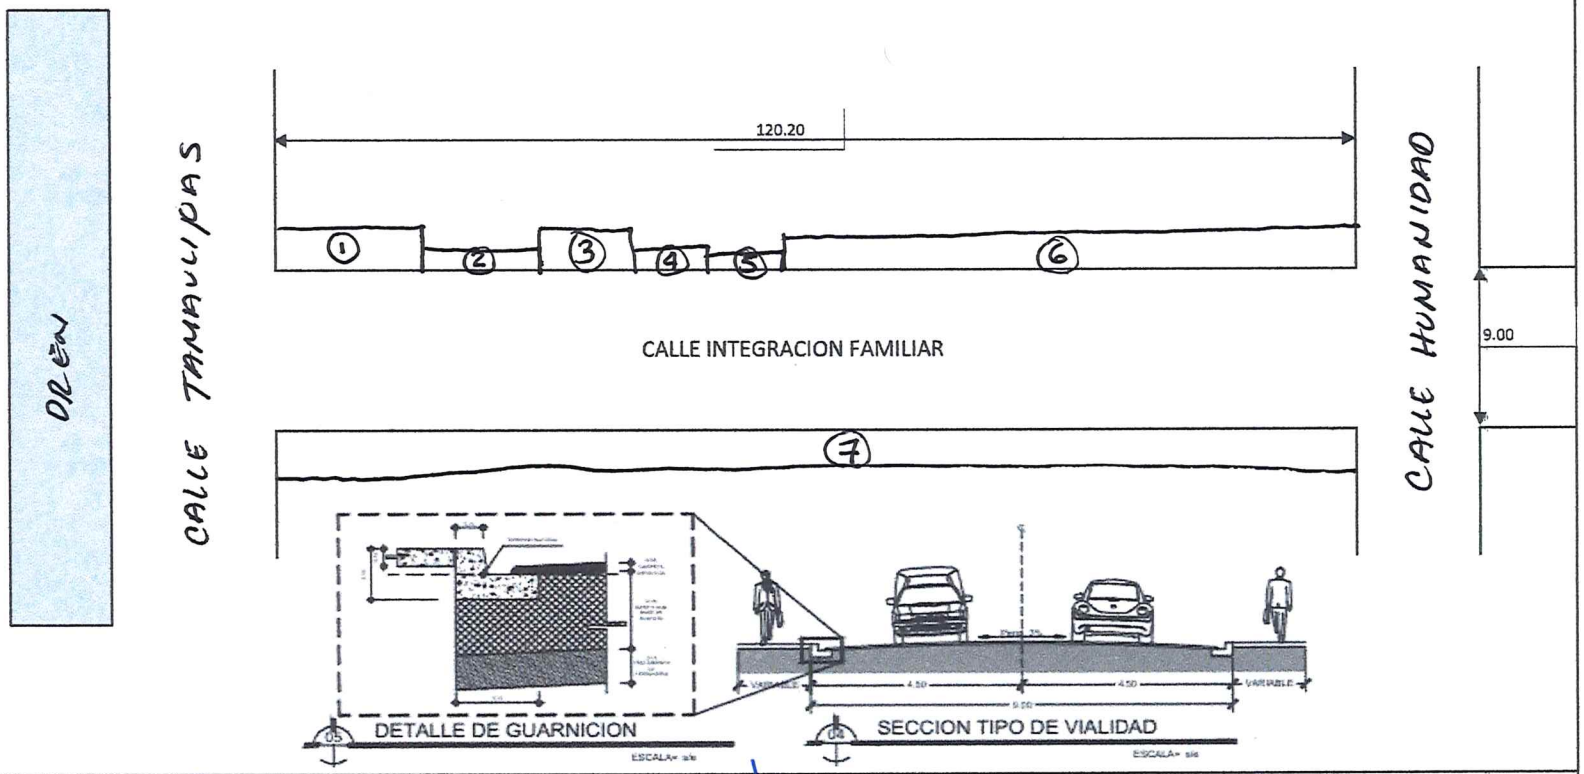

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	05-jun-25 al 04-jul-25
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	4 de julio de 2025
UBICACIÓN:	COL. INTEGRACION FAMILIAR	**HOJA:**	DE: 2
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.		

ESCANEADO

CROQUIS

LOCALIZACION



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	05-jun-25 al 04-jul-25
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	4 de julio de 2025
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE: 1 2
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.		


FOTOGRAFIAS






CORRECION DE MEDIDAS EN TRAZO, NIVELACION Y TRATAMIENTO DE TERRACERIA.



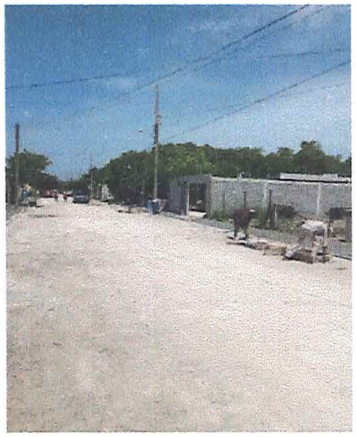

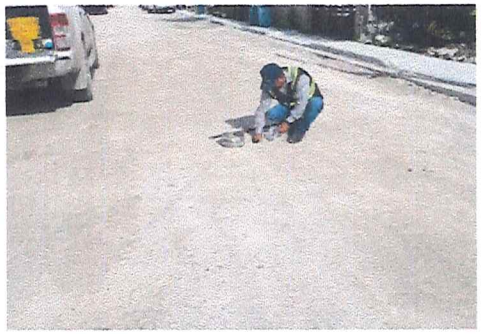



COLOCACION DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM. ESPESOR.

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027


CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	05-jun-25 al 04-jul-25
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	4 de julio de 2025
UBICACIÓN:	MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE: 2 2
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS





CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, RELLENO CON TIERRA DE BANCO, COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA Y COLADO DE BANQUETAS.

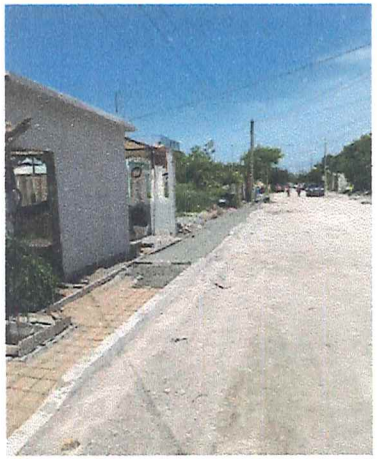







CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE INTEGRACION FAMILIAR

CARRETERA: DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS COLONIA INTEGRACION FAMILIAR

EJECUTORA: SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

CIUDAD: MATAMOROS TAMAULIPAS ENSAYE No.: SHU/96366-1002

REFERENCIAS:M-MMP.1/01/03 FECHA INFORME: 3 de julio de 2025

ESPESOR: 35.0 cms. Compactación X Recompactación

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 95.0 CAPA ENSAYADA: SUB-BASE (SULFATO DE CALCIO)

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
	CALLE INTEGRACION FAMILIAR COLONIA INTEGRACION FAMILIAR							
701	-	DERECHO	35.0	32.2	39.0	1358	1410	96.3
702	-	CENTRO	36.0	33.6	39.0	1351	1410	95.8
703	-	IZQUIERDO	35.0	35.4	39.0	1349	1410	95.7

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

INFORMACION TECNICA EN OBRAS S.A DE C.V.
CONTROL DE CALIDAD

OFICIO NÚM. SHU/9636-1002

H. Matamoros Tamaulipas a 03 Julio 2025

Sahu Construcciones y Proyectos S.A de C.V.
Ciudad:

Atendiendo a su petición de efectuar las pruebas de laboratorio necesarias en la Obra: Pavimentación Asfáltica de la Calle Integración Familiar de Calle Humanidad a Calle Tamaulipas de la Colonia Integración Familiar en el Municipio de Matamoros Tamaulipas.

Le Informamos a Usted los Resultados de las Siguientes Pruebas.

a) Pruebas de Compactación, en Capa de Sub-Base (Sulfato de Calcio).

Esperando que esta información le sea de utilidad estamos a sus órdenes para cualquier duda y/o Aclaración.

Atentamente

Ing. Humberto Alcocer Coronado
Información Técnica En Obras S.A. de C.V.

Ccp.Archivo

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UNIDAD LOCAL DE OBRA : MUNICIPIO DE MATAMOROS

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA : SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

CONTRATO : MAT-OP-REVUPE-007/2024-25

OBJETO DEL CONTRATO : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

LUGAR

ESTADO : TAMAULIPAS

MUNICIPIO : MATAMOROS

CALLE : INTEGRACION FAMILIAR

NÚMERO EXTERIOR :

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 87343

COLONIA : INTEGRACION FAMILIAR

PERIODO : DEL 05/05/25 AL 02/08/25

MONTO DEL CONTRATO : 1,546,631.93 MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

No. de nota: 1 **Fecha y hora:** 03/06/25, 11:39 AM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Centro de Trabajo : OBRAS PUBLICAS

Teléfono : 8688108000

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

Domicilio : Calle : DIVISION DEL NORTE No. Ext. 35 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MAT-OP-REVUPE-007/2024-25 **Proyecto :** REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE

Plazo : 90 Días naturales. **Fecha de Inicio :** 05/05/25 **Fecha de Término :** 02/08/25

Monto : 1,546,631.93 MXN

Objeto del contrato : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE HUMANIDAD A TAMAULIPAS

Latitud : 25.8170970958 **Longitud :** -97.5442974482

Calle : INTEGRACION FAMILIAR **Número Interior :** INTEGRACION FAMILIAR

Número Exterior : **C.P. :** 87343

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : INTEGRACION FAMILIAR **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : TAURO No. Ext. 18 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 8108070

Correo Electrónico : luis.vurgell@gmail.com

Residente

Nombre : RICARDO RANGEL ENRIQUEZ

Profesión : ARQ.

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : PRIVADA SIERRA MADRE No. Ext. 24 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 8108070

Correo Electrónico : arq_ricardorangel@hotmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 10 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 30 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.
De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Firmada por: LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 18/06/25, 01:55 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/06/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: INICIO DE TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 5 DE MAYO 2025.- SE INICIAN LOS TRABAJOS FISICOS CON TRAZO Y NIVELACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 18/06/25, 01:58 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/06/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 8 DE MAYO 2025.- SE TRABAJO EN EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:04 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/06/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 13 DE MAYO 2025.- SE REALIZARON TRABAJOS DE EXCAVACION, CARGA Y ACARREO. SE HACE SONDEOS EN TERRENOS BALDIOS PARA UBICAR TOMAS Y DESCARGAS, LAS CUALES NO SE LOCALIZARON EN 10 TERRENOS, POR TAL MOTIVO SE REALIZARAN 10 TOMAS Y 10 DESCARGAS GENERANDO EXCEDENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:08 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/06/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 16 MAYO 2025.- ACARREO DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACION, INICIO DE TRABAJOS DE TOMAS Y DESCARGAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/06/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 20 MAYO 2025,- SE TRABAJO EN TOMAS Y DESCARGAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:12 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/06/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 23 DE MAYO 2025,- SE TRABAJO EN TOMAS Y DESCARGAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:14 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/06/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 26 DE MAYO 2025.- NO SE PUDO LABORAR POR ENCHARCAMIENTOS PRODUCTO DE LLUVIA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:17 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/06/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 30 MAYO 2025.- NO SE PUEDE LABORAR POR HUMEDAD EN EL TERRENO PRODUCTO DE LLUVIA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/06/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 4 JUNIO 2025.- SE PROCEDIO A REALIZAR EL TRATAMIENTO DE TERRACERIA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

LUIS ALONSO VAZQUEZ URGELL (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 16/07/25, 07:34 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/07/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 5 JUNIO 2025.- LLEGADA AL TRAMO DE SULFATO DE CALCIO Y TENDIDO DE ESTE..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 16/07/25, 07:37 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/07/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 10 JUNIO 2025.- SE CONTIBUAN TRABAJOS DE TENDIDO DE SULFATO DE CALCIO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 16/07/25, 07:40 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/07/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 16 DE JUNIO 2025.- SE TRABAJA EN CORTE DE SULFATO (LATERALES)PARA DAR NIVEL EN EL CIMBRADO DE GUARNICIONES..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 14 Fecha y Hora: 16/07/25, 07:42 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/07/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 20 DE JUNIO 2025.- SE TRABAJA EN CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICIONES..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 15 Fecha y Hora: 16/07/25, 07:46 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/07/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 24 DE JUNIO 2025.- SE CONTINUAN TRABAJOS DE CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICIONES LADO PONIENTE, PREPARACION PARA BANQUETAS (EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRA DE BANCO)..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 16 Fecha y Hora: 16/07/25, 07:52 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/07/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 27 JUNIO 2025.- TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 17 Fecha y Hora: 16/07/25, 08:41 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/07/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 30 DE JUNIO 2025.- SE CONTINUAN TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 18 Fecha y Hora: 16/07/25, 08:44 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/07/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS., SE INFORMA LO SIGUIENTE: 2 DE JULIO 2025.- SE TRABAJA EN COLADO DE BANQUETAS (AREA FALTANTE), SEMI AFINE DE SULFATO DE CALCIO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 19 Fecha y Hora: 16/07/25, 08:53 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/07/2025 RICARDO RANGEL ENRIQUEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: 4 DE JULIO 2025.- LIMPIEZA DE AREA Y RETIRO DE CIMBRA DEL ULTIMO TRAMO DE BANQUETAS COLADAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RICARDO RANGEL ENRIQUEZ (RESIDENTE)

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**
