Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: DEL	13-may-2025 AL 09-jun-2025
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL (	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
0	0	0.00		3,761,156.24

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **3,695,563.23** (TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No**

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	3,761,156.24			
PAGOS ANTERIORES: $	0.00			
POR EJERCER: $	3,761,156.24		$	3,761,156.24
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	3,216,777.99			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	3,216,777.99			
16% I.V.A.: $	514,684.48			
SUB TOTAL: $	3,731,462.47	$ 3,731,462.47	$	3,731,462.47
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	0.00			
3‰ I.C.I.C $	9,650.33			
2‰ D.I.F. $	6,433.56			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	3,731.46			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	16,083.89			
SUB TOTAL: $	35,899.24	$ 35,899.24		
NETO APAGAR: $	**3,695,563.23**	$ **3,695,563.23**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $			$	29,693.77

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA COORDINADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-2025 al 09-jun-2025
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:** 1	**DE:** 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
R.01	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN UN ESPESOR DE 3 A 5 CM. PORMEDIOS MECANICOS, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE ASI COMO LA CARGA Y EL ACARREO DE MATERIALPRODUCTO DE FRESADO A LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVICION LE INDIQUE.	M2	$ 95.31	4,475.40	0.00	4,524.69	4,524.69	49.29	431,248.20
R.02	BACHEO PROFUNDO POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO COMPACTADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	$ 263.16	513.94	0.00	507.31	507.31		133,503.70
R.03	BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS CON MEZCLA ASFALTICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	$ 914.19	271.42	0.00	258.15	258.15		235,998.15
R.04	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPATACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95% INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.50 LTO/M2, ACARREO DE CARPETA ASFALTICA AL LUGAR DE LA OBRAS CON AGREGADO MAXIMO 1/2" Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M2	$ 532.68	4,475.40	0.00	4,524.69	4,524.69	49.29	2,410,211.87
R.05	NIVELACION DE POZOS DE VISITA, COLOCACION DE TAPA Y BROCAL EXISTENTE, INCLUYE CORTE DE 1.50X1.50 MTS; CON CORTADORA DE PISO, RETIRO DE CARPETA, EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 25 CM DE ESPESOR, MALLA ELECTROCSOLDADA 6/6-10/10, CARGA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICION, EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	$ 7,112.61	6.00	0.00	0.00	0.00		
R.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTRES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80X0.25 CM DE DIAMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	$ 5,816.07	1.00	0.00	1.00	1.00		5,816.07
								ESTA HOJA $	**800,750.05**
								ACUMULADO $	**3,216,777.99**
								ESTA ESTIMACION $	**3,216,777.99**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ OLMEDANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA COORDINADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

PERIODO:	HOJA:

ORDEN DE ACTUALIZACION	NUM. CONTRATO:	NUM. DE ESTIMACION:	DEL 13-may-2025 AL 09-jun-2025	No DE
	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	2 (DOS)		

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.

LOCALIDAD:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MUNICIPIO: MATAMOROS	PROGRAMA:	REVUPE

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN				INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA 1a.	PRORROGA 2a.
R.01	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN UN ESPESOR DE 3 A 5 CM. PORMEDIOS MECANICOS, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE ASI COMO LA CARGA Y EL ACARREO DE MATERIALPRODUCTO DE FRESADO A LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVICION LE INDIQUE.	49.29 M2	$95.31	$4,697.83	49.29			
R.04	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPATACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95% INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.50 LTO/M2, ACARREO DE CARPETA ASFALTICA AL LUGAR DE LA OBRAS CON AGREGADO MAXIMO 1/2" Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	49.29 M2	$532.68	$26,255.80	49.29			
			SUMA =	$30,953.63				

EXPLICACION AMPLIA: (QUE, COMO, DONDE,QUIEN, PORQUE, CUANDO)

SE EJECUTA ESTE VOLUMEN ADICIONAL POR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CAUSAS

* CONDICIONES NATURALES DIS-TINTAS A LAS SUPUESTAS:	X	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES:	
* CAMBIOS DE DISEÑO:		* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO:	
* CAMBIOS DE LOCALIZACION:		* RETRASO DE NUEVOS PAGOS:	
* ERROR INICIAL:		* RECORTE PRESUPUESTAL:	
* OTROS:			

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA COORDINADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	13-may-2025 al 09-jun-2025
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO	FECHA:	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	HOJA:	DE: 1 4
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
I	xx											
R.01	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN UN ESPESOR DE 3 A 5 CM. PORMEDIOS MECANICOS, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE ASI COMO LA CARGA Y EL ACARREO DE MATERIALPRODUCTO DE FRESADO A LUGAR AUTORIZADO POR LA SUPERVICION LE INDIQUE.	ANTONIO CARRILLO- FCO ROBLES		20.00	8.39		M2	1.00		167.80		
				20.00	8.42		M2	1.00		168.40		
				20.00	8.24		M2	1.00		164.80		
				30.00	8.34		M2	1.00		250.20		
				30.00	8.54		M2	1.00		256.20		
				30.00	8.04		M2	1.00		241.20		
				30.00	8.04		M2	1.00		241.20		
				30.00	8.04		M2	1.00		241.20		
				30.00	8.00		M2	1.00		240.00		
				30.00	8.42		M2	1.00		252.60		
				30.00	8.16		M2	1.00		244.80		
				30.00	8.03		M2	1.00		240.90		
				47.00	7.97		M2	1.00		374.59		
		IGNACIO RMZ-KM 0+31		31.50	8.04		M2	1.00		253.26		
		LEON GZN-MARIANO ESCOBEDO		30.00	8.42		M2	1.00		252.60		
				30.00	7.92		M2	1.00		237.60		
				30.00	8.02		M2	1.00		240.60		
				30.00	8.06		M2	1.00		241.80		
				26.80	8.02		M2	1.00		214.94		
								TOTAL =		4,524.69	4,524.69	100.00%

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	13-may-2025 al 09-jun-2025
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	HOJA:	DE: 2 4
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
R.02	BACHEO PROFUNDO POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO COMPACTADO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ANTONIO CARRILLO- FCO ROBLES		12.50	2.25		M2	1.00		28.13		
				17.00	1.85		M2	1.00		31.45		
				10.45	2.65		M2	1.00		27.69		
				8.95	2.15		M2	1.00		19.24		
				16.50	1.95		M2	1.00		32.18		
				19.00	2.50		M2	1.00		47.50		
				27.25	2.10		M2	1.00		57.23		
				12.75	1.75		M2	1.00		22.31		
				18.60	1.95		M2	1.00		36.27		
		IGNACIO RMZ-KM 0+31		15.50	1.50		M2	1.00		23.25		
		LEON GZN-MARIANO ESCOBEDO		10.50	2.25		M2	1.00		23.63		
				8.45	2.00		M2	1.00		16.90		
				7.50	2.20		M2	1.00		16.50		
				15.50	1.90		M2	1.00		29.45		
				18.40	2.40		M2	1.00		44.16		
				14.20	2.10		M2	1.00		29.82		
				12.00	1.80		M2	1.00		21.60		
								1.00		0.00		
								1.00		0.00		
								TOTAL =		507.31	507.31	98.71%
R.03	BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIOS MECANICOS CON MEZCLA ASFALTICA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ANTONIO CARRILLO- FCO ROBLES		30.00	1.80		M2	1.00		54.00		
				25.00	2.00		M2	1.00		50.00		
				12.50	1.50		M2	1.00		18.75		
				15.00	1.80		M2	1.00		27.00		
							M2	1.00		0.00		
		IGNACIO RMZ-KM 0+31		9.00	2.50		M2	1.00		22.50		
		LEON GZN-MARIANO ESCOBEDO		13.00	1.60		M2	1.00		20.80		

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	13-may-2025 al 09-jun-2025
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	HOJA:	DE: 3 4
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
				17.00	1.50		M2	1.00		25.50		
				15.00	2.00		M2	1.00		30.00		
				8.00	1.20		M2	1.00		9.60		
								TOTAL =		258.15	258.15	95.11%
R.04	SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPATACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95% INCLUYE: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.50 LTO/M2, ACARREO DE CARPETA ASFALTICA AL LUGAR DE LA OBRAS CON AGREGADO MAXIMO 1/2" Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	ANTONIO CARRILLO- FCO ROBLES		20.00	8.39		M2	1.00		167.80		
				20.00	8.42		M2	1.00		168.40		
				20.00	8.24		M2	1.00		164.80		
				30.00	8.34		M2	1.00		250.20		
				30.00	8.54		M2	1.00		256.20		
				30.00	8.04		M2	1.00		241.20		
				30.00	8.04		M2	1.00		241.20		
				30.00	8.04		M2	1.00		241.20		
				30.00	8.00		M2	1.00		240.00		
				30.00	8.42		M2	1.00		252.60		
				30.00	8.16		M2	1.00		244.80		
				30.00	8.03		M2	1.00		240.90		
				47.00	7.97		M2	1.00		374.59		
		IGNACIO RMZ-KM 0+31		31.50	8.04		M2	1.00		253.26		
		LEON GZN-MARIANO ESCOBEDO		30.00	8.42		M2	1.00		252.60		
				30.00	7.92		M2	1.00		237.60		
				30.00	8.02		M2	1.00		240.60		
				30.00	8.06		M2	1.00		241.80		
				26.80	8.02		M2	1.00		214.94		
								TOTAL =		4,524.69	4,524.69	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	13-may-2025 al 09-jun-2025
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	HOJA:	DE: 4 4
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES


CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
		EJE	TRAMO									
R.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTRES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80X0.25 CM DE DIAMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.						PZA	1.00		1.00		
								TOTAL =		1.00	1.00	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	1 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

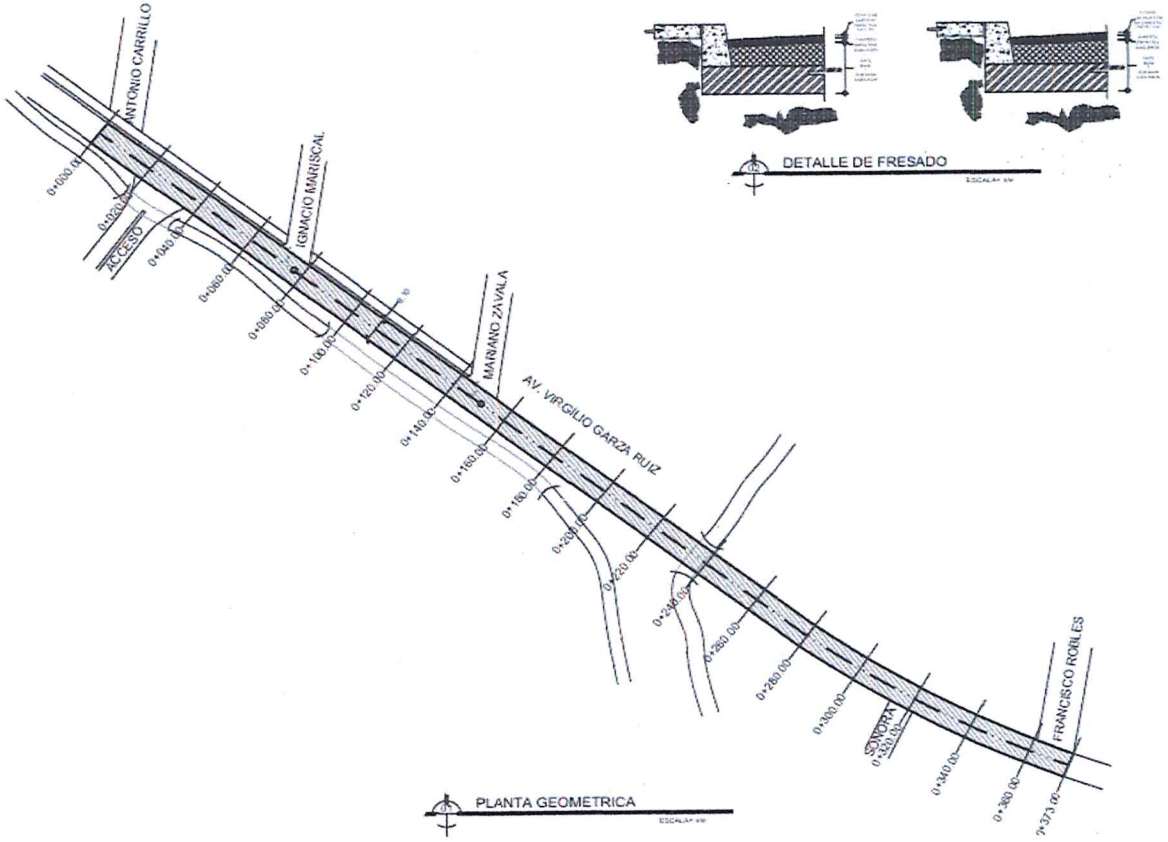

DETALLE DE FRESADO


PLANTA GEOMETRICA

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	2 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

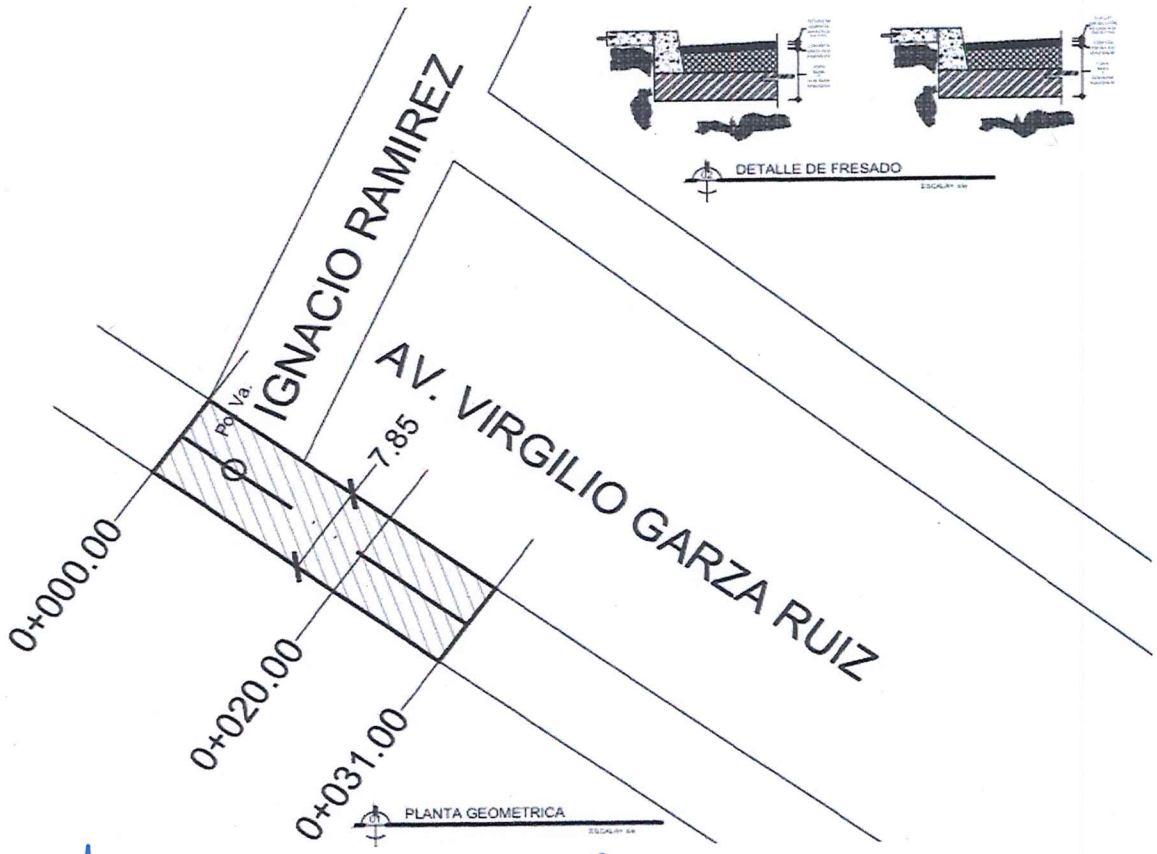


CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	3 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

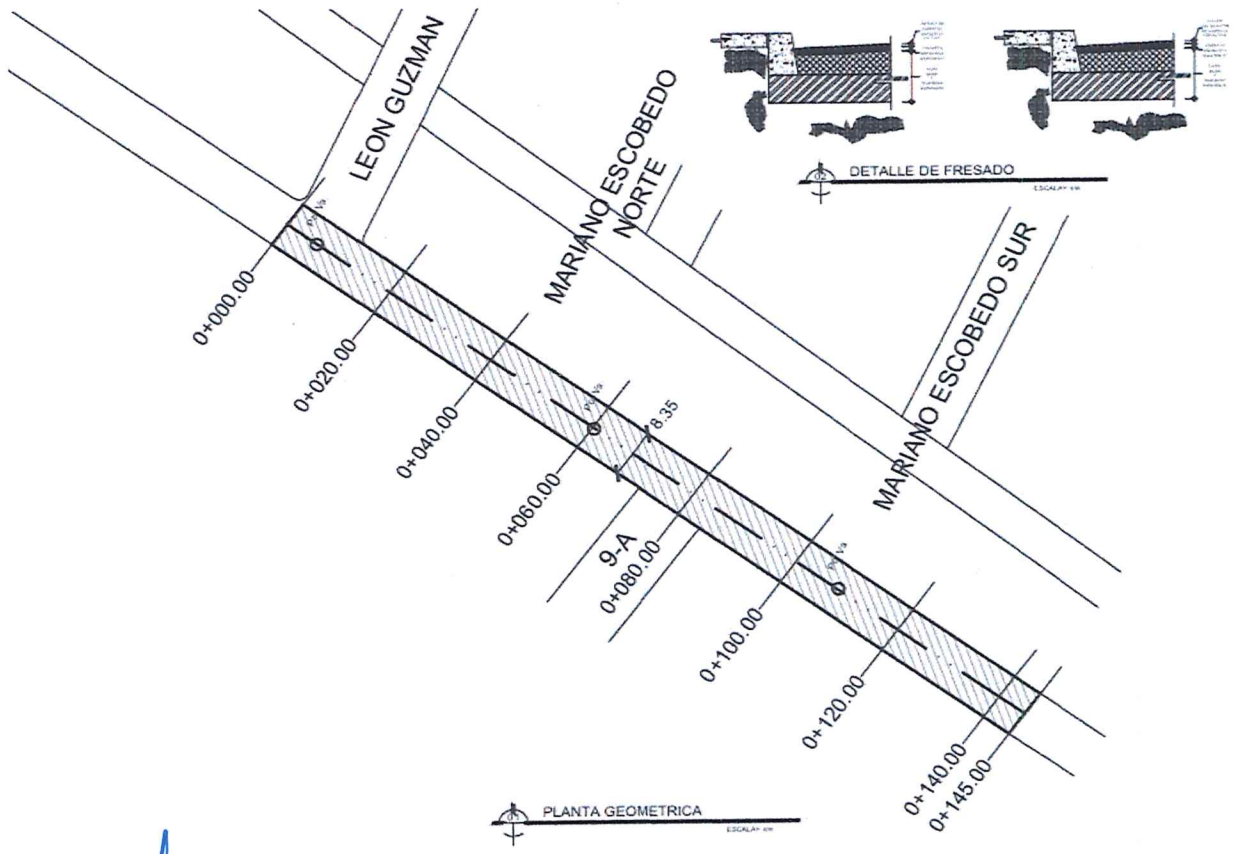


CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	4 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

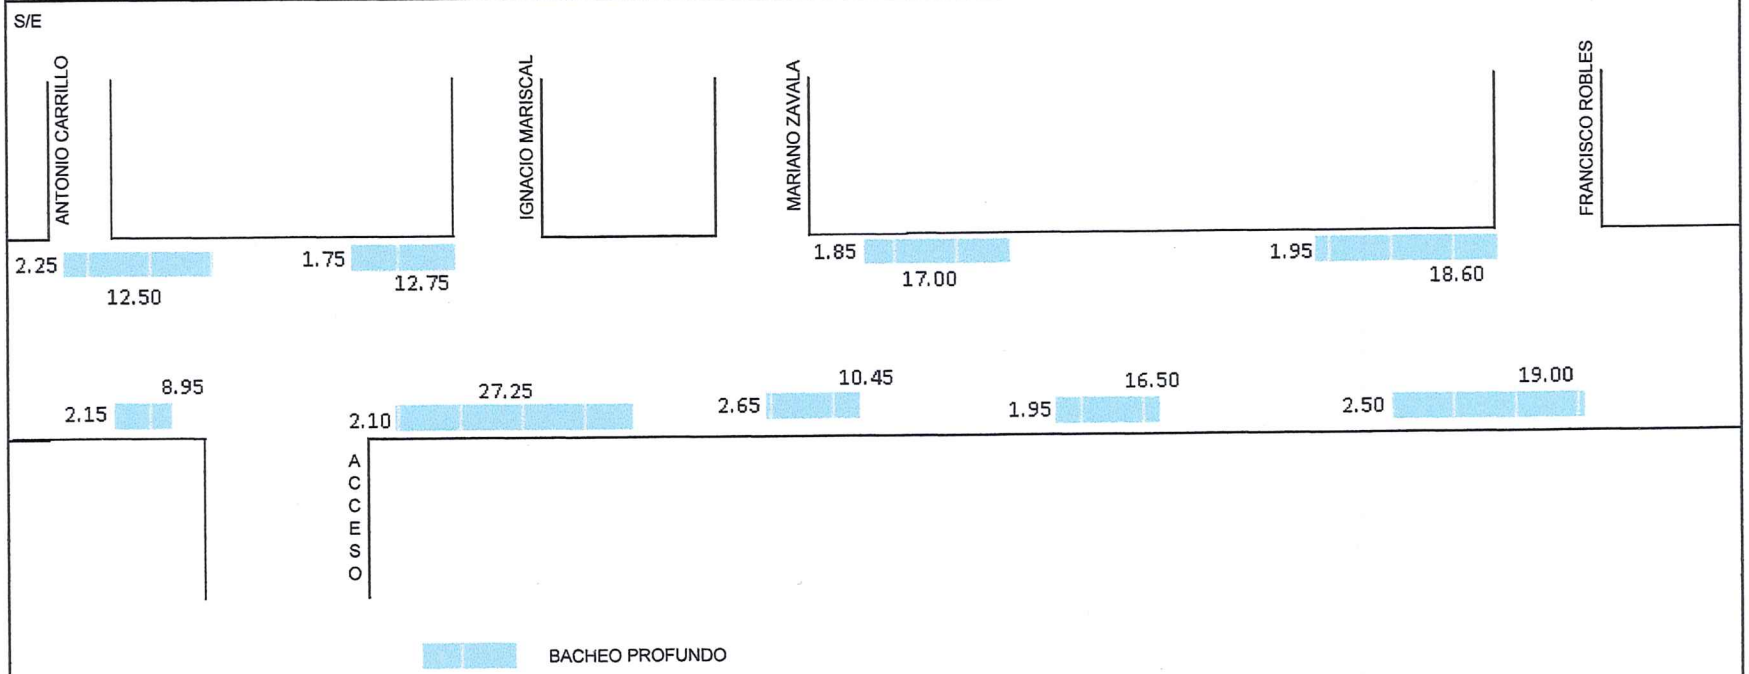


CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	5 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

S/E

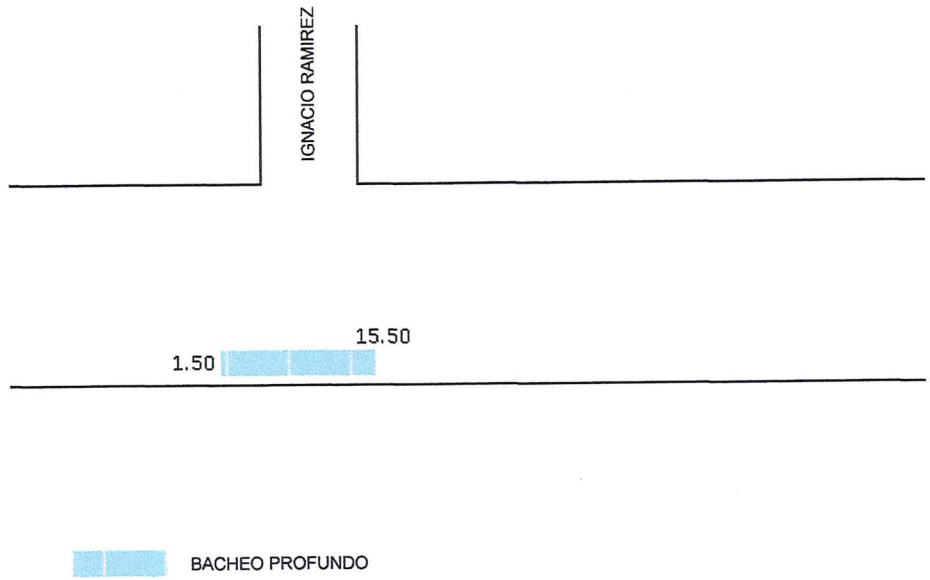


CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	6 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

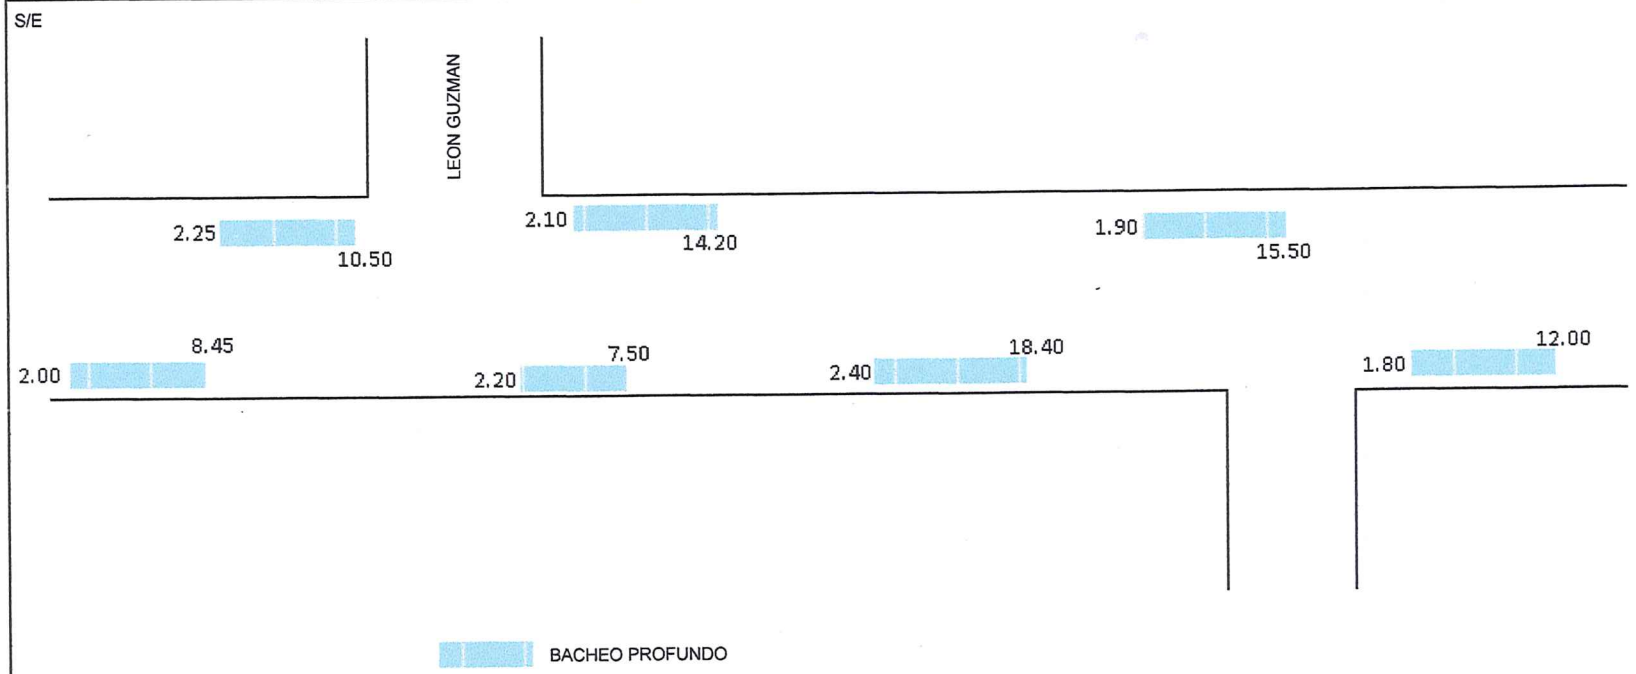


CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	7 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

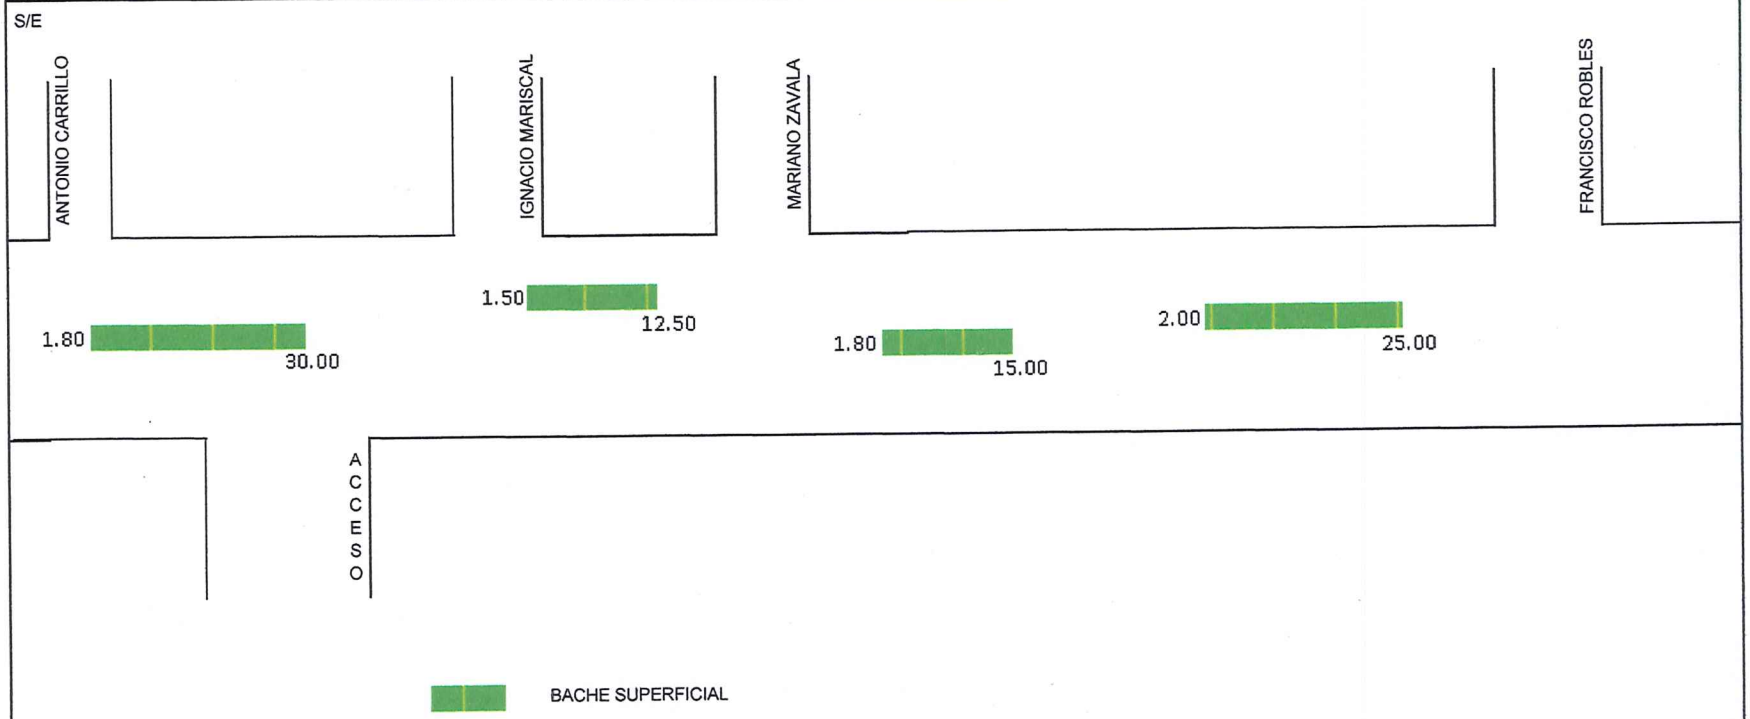


CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	8 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

S/E

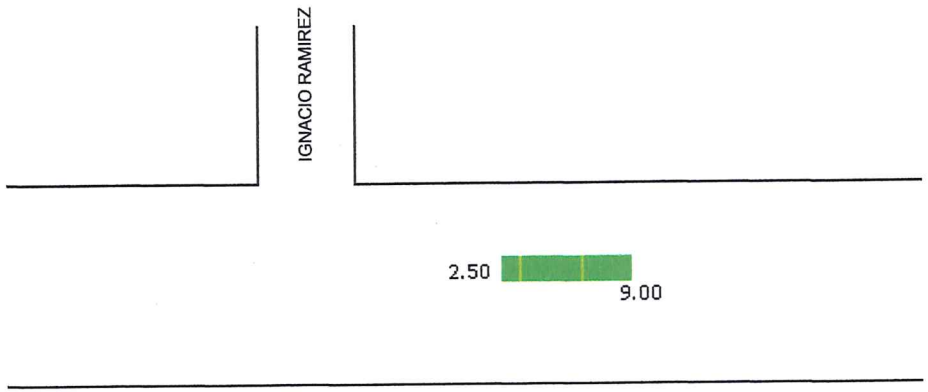


BACHEO SUPERFICIAL

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	9 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

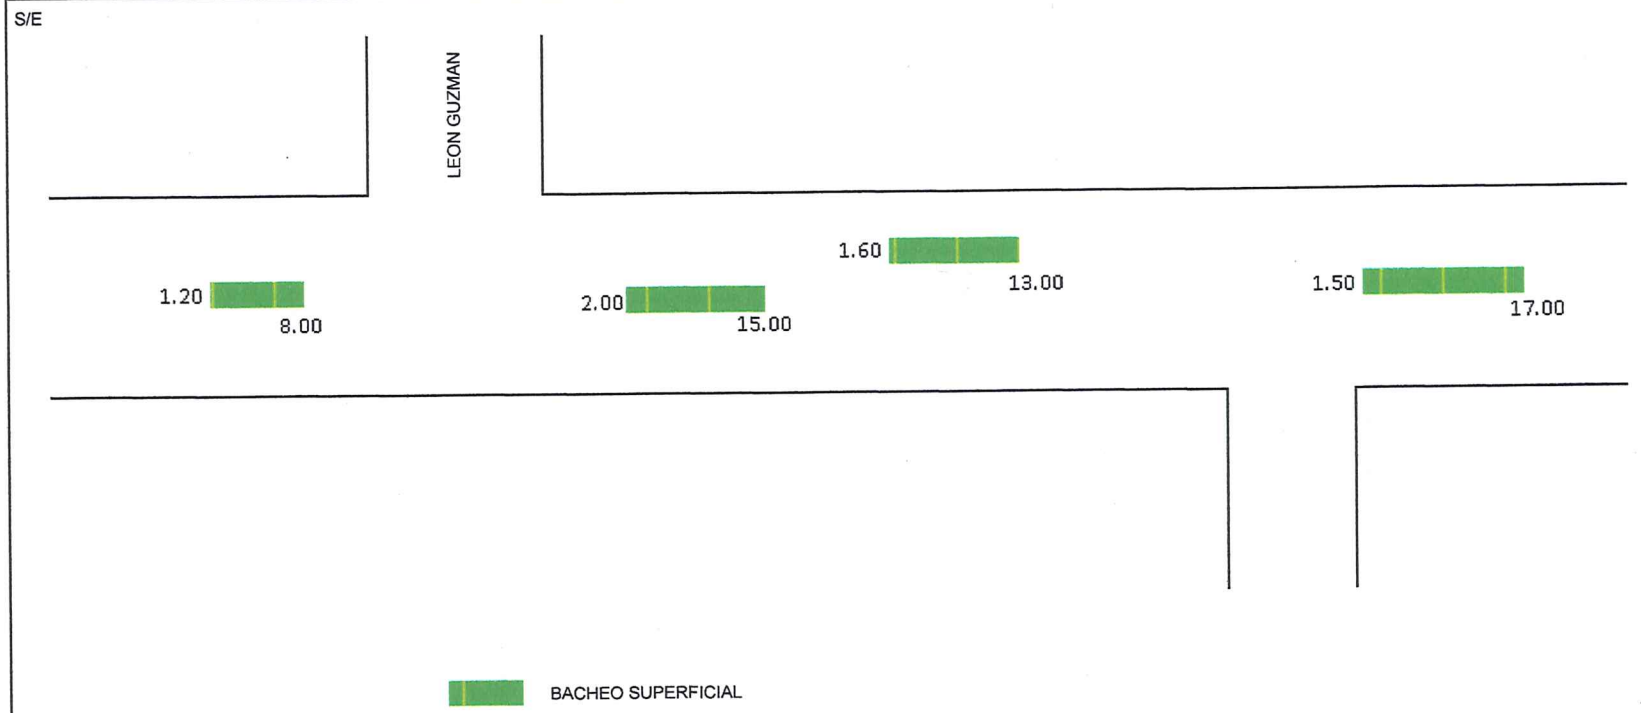


CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	10 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

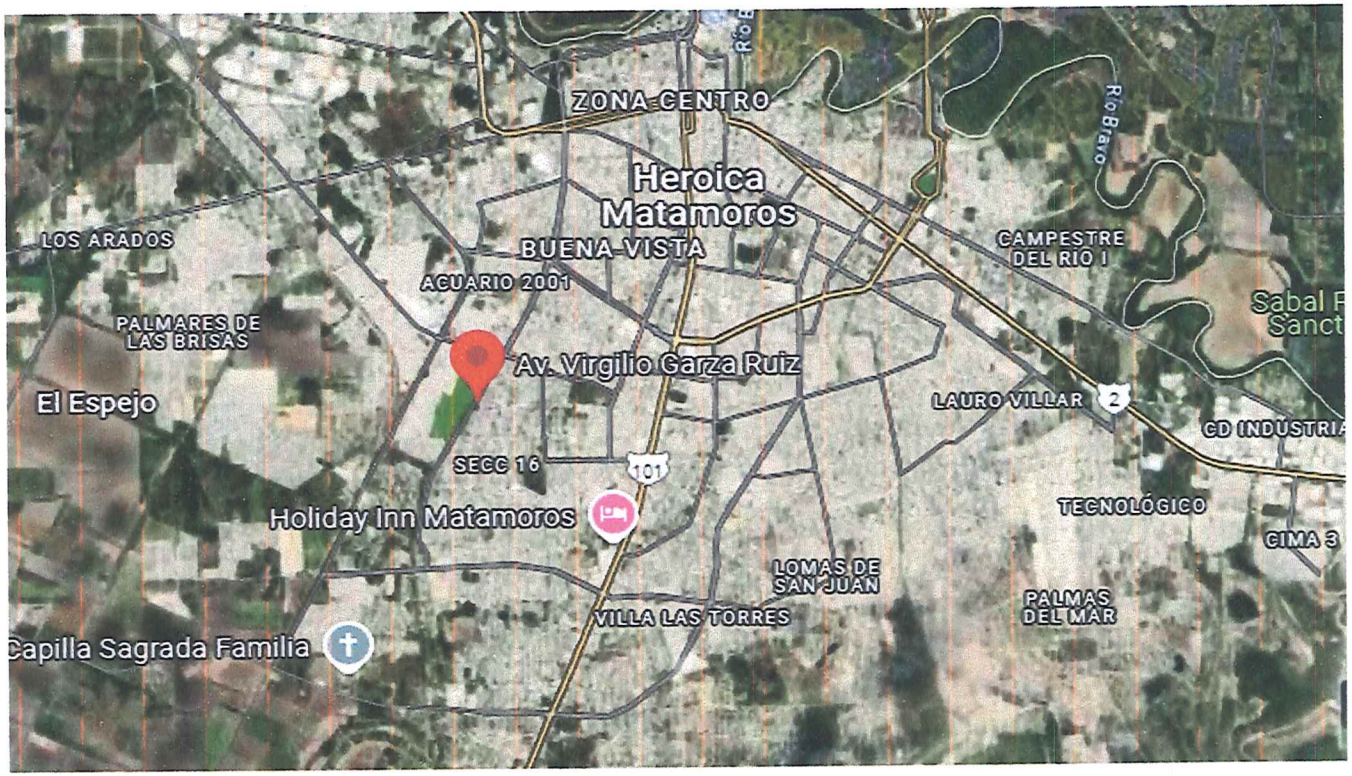


CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	11 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

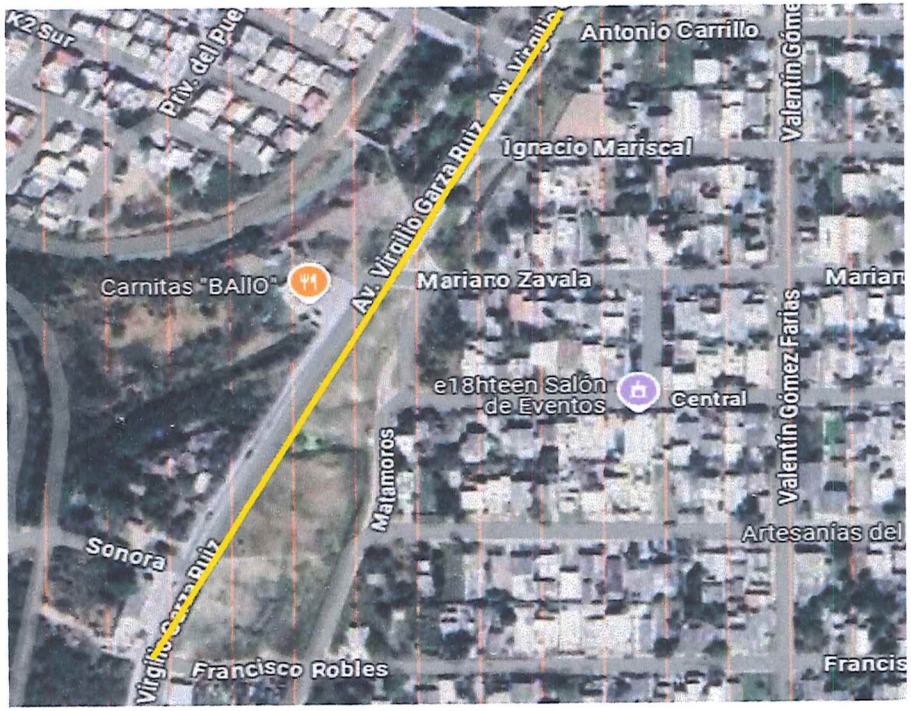

CONTRATISTA :

CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.

SUPERVISO:

ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA
SUPERVISOR DE OBRA

REVISO:

ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU
JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	12 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO	**HOJA:**	13 DE: 13
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

CROQUIS



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE: 8
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









FRESADO DE CARPETA ASFALTICA

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE: 8
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









BACHEO SUPERFIAL

CONTRATISTA	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE: 8
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA


CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE: 8
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS



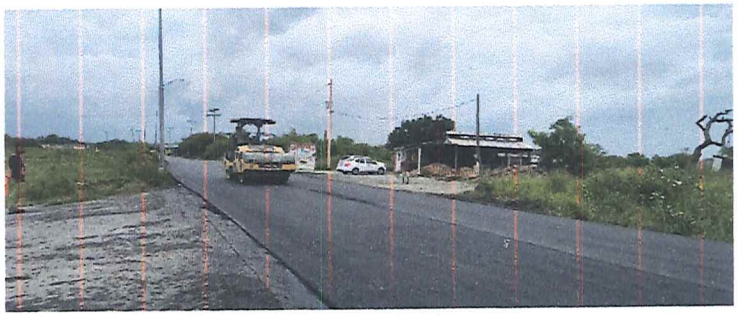





COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE: 8
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)		
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25	al	09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025		
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE:		8
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.				

FOTOGRAFIAS









COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE: 8
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS










COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA

CONTRATISTA	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	**ESTIMACIÓN:**	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	13-may-25 al 09-jun-25
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	**HOJA:**	DE: 8
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS

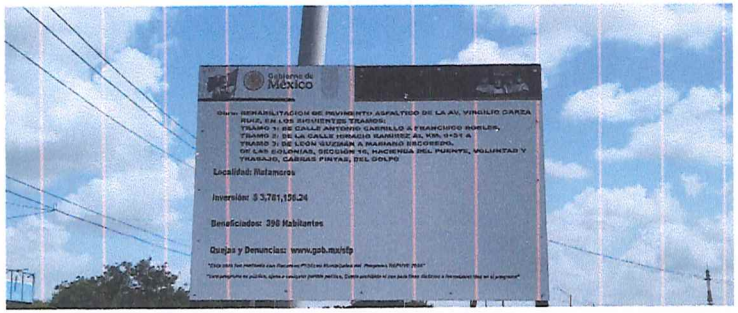



ANUNCIO DE OBRA

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UNIDAD LOCAL DE OBRA : MUNICIPIO DE MATAMOROS

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.

CONTRATO : MAT-OP-REVUPE-010/2024-25

OBJETO DEL CONTRATO : REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM. 0+31 A TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

LUGAR

ESTADO : TAMAULIPAS

MUNICIPIO : MATAMOROS

CALLE : AV VIRGILIO GARZA

NÚMERO EXTERIOR :

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 87390

COLONIA : SECCION 16

PERIODO : DEL 29/04/25 AL 12/06/25

MONTO DEL CONTRATO : 3,242,376.07 MXN

MAT-OP-REVUPE-010/2024-25

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

No. de nota: 1 **Fecha y hora:** 30/04/25, 05:02 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Centro de Trabajo : PRESIDENCIAL MUNICIPAL

Teléfono : 8688108000

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.

Domicilio : Calle : JOSE MARIA MORELOS No. Ext. 413 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MAT-OP-REVUPE-010/2024-25 **Proyecto :** REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE

Plazo : 45 Días naturales. **Fecha de Inicio :** 29/04/25 **Fecha de Término :** 12/06/25

Monto : 3,242,376.07 MXN

Objeto del contrato : REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM. 0+31 A TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES

Latitud : 25.8386839139 **Longitud :** -97.5329645968

Calle : AV VIRGILIO GARZA **Número Interior :** AV VIRGILIO GARZA

Número Exterior : **C.P. :** 87390

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : SECCION 16 **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE IGNACIO RAMIREZ A KM 0+31

Latitud : 25.8353041895 **Longitud :** -97.5342735148

Calle : AV VIRGILIO GARZA **Número Interior :** AV VIRGILIO GARZA

Número Exterior : **C.P. :** 87390

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : SECCION 16 **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO

Latitud : 25.8334235745 **Longitud :** -97.534453973

Calle : AV VIRGILIO GARZA **Número Interior :** AV VIRGILIO GARZA

Número Exterior : **C.P. :** 87390

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : VOLUNTAD Y TRABAJO **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : YURIDIA LARA SANCHEZ
Profesión : ING. CIVIL
Identificación oficial : CÉDULA PROFESIONAL
Domicilio : Calle : MADERO M20 L8 No. Ext. 113 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS
Teléfono :
Correo Electrónico : yuri_lara25@hotmail.com

Residente

Nombre : JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA
Profesión : ING. EN MECÁNICA ELÉCTRICA
Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR
Domicilio : Calle : CALAMAR No. Ext. 123 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS
Teléfono :
Correo Electrónico : jcruquintanilla28@gmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 30 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.
De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Firmada por: YURIDIA LARA SANCHEZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 10/06/25, 12:42 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/04/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: VISITA AL SITIO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REUNEN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS EL RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA CON LA FINALIDAD DE HACER ENTREGA FISICA DEL BIEN INMUEBLE Y DECLARAR FORMALMENTE INICIADOS LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

YURIDIA LARA SANCHEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 10/06/25, 12:47 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/05/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA DE ACUERDO A LOS PRONOSTICOS CLIMATOLOGICOS EL CONTRATISTA INFORMA DE MANERA ECONOMICA A ESTA DEPENDENCIA QUE NO SE INICIAN LOS TRABAJOS DE FRESADO POR LAS PRESIPITACIONES PRONOSTICADAS PARA LA REGION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

YURIDIA LARA SANCHEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 10/06/25, 12:52 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/05/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CONDICIONES CLIMATOLOGICAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA CIUDAD..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

YURIDIA LARA SANCHEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 10/06/25, 12:55 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/05/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJO DE REHABILITACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE DAN INICIO LOS TRABAJOS DE FRESADO DE CARPETA ASFALTICA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

YURIDIA LARA SANCHEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 10/06/25, 12:59 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/05/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS DE REHABILITACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA RECORRIDO A LOS SITIOS DE TRABAJO Y SE VERIFICA QUE LOS TRABAJOS DE FRESADO SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

YURIDIA LARA SANCHEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 10/06/25, 01:03 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/05/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS DE REHABILITACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE LO TRABAJOS Y NO SE TIENE AVANCE SIGNIFICATIVO EN TRABAJOS DE BACHEO POR LO QUE SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

YURIDIA LARA SANCHEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 10/06/25, 01:06 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS DE REHABILITACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA NOTIFICA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE BACHEO CON MATERIAL PRODUCTO DE FRESADO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

YURIDIA LARA SANCHEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 10/06/25, 01:11 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS DE REHABILITACION., SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA RECORRIDO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REALIZAR LIMPIEZA GENERAL Y SE LE INFORMA QUE EL TRAMO ESTA EN CONDICIONES DE RECIBIR CARPETA ASFALTICA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

YURIDIA LARA SANCHEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 10/06/25, 01:13 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS DE REHABILITACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

YURIDIA LARA SANCHEZ (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 18/06/25, 03:16 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 10/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: RENIVELACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRTISTA REALIZA LA NIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS. PRESENTA TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS DE NIVELACION DE CAJAS DE VALVULAS PARA SU REVISION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 18/06/25, 03:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 11/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: ESTIMACIONES, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA A ESTA DEPENDENCIA ESTIMACION Y NUMEROS GENERADORES PARA SU REVISION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 18/06/25, 03:21 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: INSPECCION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA VERIFICACION FISICA DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS LAS CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**

Construcciones RESA, s.a. de c.v.
RFC: CRE091203J50

H. MATAMOROS, TAM, A 09 DE JUNIO DEL 2025.

ASUNTO: **VOLUMEN EXCEDENTE**

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CON RELACIÓN A LA OBRA CONTRATADA CON EL MUNICIPIO DE MATAMOROS A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **No. MAT-OP-REVUPE-010/2024-25**, RELATIVO A **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM. 0+31 A TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**; LE SOLICITO LA REVISION Y/O AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES QUE SE INCLUIRAN EN LA ORDEN DE ACTUALIZACION DE LA ESTIMACION N°2 (DOS), LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3, Zona Centro C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

Construcciones RESA, s.a. de c.v.

RFC: CRE091203J50

H. MATAMOROS, TAM, A 29 DE ABRIL DEL 2025

ASUNTO: **INICIO DE OBRA**

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **No. MAT-OP-REVUPE-010/2024-25**, REFERENTE A: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM. 0+31 A TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**; FUERON INICIADOS EL DIA 29 DE ABRIL DE 2025.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Morelos No. 413 Interior 3, Zona Centro C.P. 87000, Cd. Victoria, Tam. e-mail: construccionesresa@gmail.com

Construcciones RESA, s.a. de c.v.

RFC: CRE091203J50

H. MATAMOROS, TAM, A 29 DE ABRIL DEL 2025.

ASUNTO: **SUPERINTENDENTE DE OBRA**

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTO Y HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL INGENIERO GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA ES DESIGNADO SUPERINTENDENTE DE LA OBRA, QUIEN SERA RESPONSABLE DIRECTO Y REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN EL SITIO QUE SE ENCUENTRA EN RELACION AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **No. MAT-OP-REVUPE-010/2024-25,** REFERENTE A: **REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM. 0+31 A TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**

DATOS DE SUPERINTENDENTE
NOMBRE: YURIA LARA SANCHEZ
PROFESION: INGENIERO CIVIL
PUESTO: SUPERINTENDENTE DE OBRA
CORREO ELECTRONICO: yuri_lara25@hotmail.com

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

JULIAN LERMA AVALOS
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección de
Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 10 DE JUNIO DEL 2025

CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.
JULIÁN LERMA ÁVALOS
Presente.-

En relación a la obra denominada REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILIO GARZA RUIZ, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM. 0+31 A TRAMO 3: DE LEÓN GUZMÁN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCIÓN 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS al amparo del contrato de Obra Pública No.MAT-OP-REVUPE-010/2024-25, hago de su conocimiento que esta Direccion a mi cargo autoriza los Volumenes de Obra Excedentes inscritos en la Orden de Actualizacion incluida en la Estimacion No 2 del Referido Contrato para su tramite y pago

Atentamente

ING FERNANDO REQUENA CHAVEZ
Director de Obras Publicas

c.c.p. archivo

Matamoros Avanza

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE GRADO DE COMPACTACION Y PERMEABILIDAD EN CARPETA ASFALTICA

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE AVE. VIRGILIO GARZA RUIZ DE LOS SIGUIENTES TRAMOS:TRAMO 1 DE LA

TRAMO: CALLE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES TRAMO2: DE IGNACIO RAMIREZ AL KM.0+31 TRAMO 3: DE LEON GUZMAN

SUB-TRAMO: A MARIANO ESCOBEDO EN LAS COLONIAS SECCION 16,HACIENDA EL PUENTE,VOLUNTAD Y TRABAJO,CABRAS PINTAS DEL GOLFO MPIO. MATAMOROS TAMAULIPAS

ENSAYE No CRS/8556-1005

EJECUTORA: CONSTRUCCIONES RESA S.A DE C.V.

FECHA DE INFORME: 4 de junio de 2025

DATOS DE PROYECTO

GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO POR LA CAPA ENSAYADA 95.0% P.V.M.M.

ESPESOR DE PROYECTO: **5.0 Cms.**

No Ensaye	Franja	Ubicación	Espesor Cms.	Peso Volumetrico		% De Compactacion	% de Permeabilidad
				Del Lugar	Maximo		
	TRAMO 1 DE ANTONIO CARRILLO A FRANCISCO ROBLES						
2378	DERECHA	LADO DER.	5.09	2268	2355	96.3	0.00%
2379	IZQUIERDA	LADO CEN.	5.10	2261	2355	96.0	0.00%
2380	IZQUIERDA	LADO IZQ.	5.06	2240	2355	95.1	0.00%
	TRAMO 2 DE IGNACION RAMIREZ A KM. 0+31						
2381	DERECHA	LADO DER.	5.05	2256	2355	95.8	0.00%
2382	IZQUIERDA	LADO CEN.	5.07	2268	2355	96.3	0.00%
	TRAMO 3 DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO						
2383	DERECHA	LADO DER.	5.08	2247	2355	95.4	0.00%
2384	IZQUIERDA	LADO IZQ.	5.12	2261	2355	96.0	0.00%
2385	IZQUIERDA	LADO CEN.	5.09	2254	2355	95.7	0.00%

Referencias: N-CMT-CAR-1-04-006-09-CAL - N-CMT-4-05-00-002/11

N-CTR-CAR-1-01-009/00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

El GRADO DE COMPACTACION,ESPESORES Y PERMEABILIDAD OBTENIDOS EN LA CAPA ENSAYADA,CUMPLE DE ACUERDO A LOS MINIMOS ESPECIFICADOS

EL LABORATORISTA	VO.BO.
Lab. Armando Castiilo Piña	Ing.Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A. de C.V.
