Secretaría de
Desarrollo Urbano

H. Matamoros, Tamaulipas a 15 de julio del 2026

No. De Oficio: SECDU/DIOP-E-0040/2026
ASUNTO: Pago de Factura

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Anexo al Presente envío a usted para su respectivo Pago la siguiente Factura Original con Folio: **MAGS 4404** del Contratista **MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS** Para Pago por: **ESTIMACION No. 1** al amparo del contrato de Obra Pública No. **MAT-OP-FAISMUN-010/2026** Relativo a la Obra **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**

Con un Importe de : $ 1,184,666.84
(UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)

CONTRATO: MAT-OP-FAISMUN-010/2026

PROGRAMA: FAISMUN

Atentamente

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS
2024-2027

Vo. Bo.

ARQ. ALFONSO TREVIÑO RUBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

Vo. Bo. Revision Normativa

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.
2024-2027

Matamoros 200 Bicentenario

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.
RECIBIDO
Laura
20 JUL. 2026
11:40am
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

MAGS

MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS

GOSM800722Q21

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

ALMENDRO, 51, FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, 87448, SECOYA Y AGUACATE, MATAMOROS, Tamaulipas, México

Tel. 8681490280

CLIENTE

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

MMT320612AWA

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 87300

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

6A ENTRE MORELOS Y GONZALEZ, SN, 87300, Heroica Matamoros, ENTRE MORELOS Y GONZALEZ, Matamoros, Tamaulipas, México

Factura MAGS 4404

FOLIO FISCAL (UUID)
F1F0C668-9C8D-4C2F-B724-333995F4AB3B

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707539422

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2026-07-13T14:45:09

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2026-07-13T15:28:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN
87448

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	-3%I.C.I.C	$ 3,093.56
2.00%	-2%D.I.F.	$ 2,062.37
1.00%	1.0 % ORG.TEC DE FISCALIZACION DEL EDO.	$ 1,196.17
5.00%	5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL	$ 5,155.93
	Total	$ 11,508.03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	RECIBI DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE $1,184,666.84 (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 84/100)POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 REFERENTE A REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 , EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS , CONTRATO: MAT-OP-FAISMUN-010/2026 Clave Prod. Serv. - 72141120 Servicio de construcción de líneas de alcantarillado Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1031185.23 Tasa - 0.160000 Importe - $ 164,989.64	$ 1,031,185.23	02 - SI objeto de impuesto.	$ 1,031,185.23

OBRAS PÚBLICAS
2024 - 2027

IMPORTE CON LETRA	UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 84/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO	PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
VERSION	4.0
EXPORTACION	01 - No aplica

SUBTOTAL	$ 1,031,185.23
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 164,989.64
RETENCIÓN LOCAL -3%I.C.I.C 3.00%	$ 3,093.56
RETENCIÓN LOCAL -2%D.I.F. 2.00%	$ 2,062.37
RETENCIÓN LOCAL 1.0 % ORG.TEC DE FISCALIZACION DEL EDO. 1.00%	$ 1,196.17
RETENCIÓN LOCAL 5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL 5.00%	$ 5,155.93
TOTAL	$ 1,184,666.84

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SvA1cKF4cpWmYrhzaBtn2JgqF0H9g/AbqV8zB8Hijhlry78RMMbZ3+6ng+G9WXN6rWEMmtvjYflpYCMmkcJV5S6hSmN6jLTF+QnRmo+EVHN8qBuD4nBQAjrgj8kZrS07UcgggYxmSXlVktCeOww8VWslrR6B+gTbuqXkZUuzxY4hB5ENdXYrGd4EiJylRSROZYnkPW9hCdc4t8Y2ZWINHZpkGeUfni9h/7ZhSKln2QGm2Kq1hUclU766oqt5RKFZonnK/fQkCSWldwLi3DYzYbrlk3mYKyVd3YTcrlKoU5Vp29AZfyHGS1W5m12/Gtljy4rcbqN+nvRgm0q+7D6Sow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

orxbsltwPYhu1c8aoAslA2fp+abweQXZDmBA8AjYmTU47NwatlFhjyC73mr/nnN7phCmMgv7oxMmysUOVWTGXv2N5sL4EfqTKcl6SCPsB5aJ/cs+pE5v3C8lWJc4XCkUyroPsh7exG2lVOXwA9h9ERxXRXH11Jlhlq05lAdY+q2am4U6gHWzm+kCwYerPg7GsyGwRuOkNWuNF/2mbbtg37/VVOe4eg1JsblwWISk7i4ot92YN/o6dPCZejH1egDQ5HsX8tM/O2ZKwhASryM6vDM7A7bXFqOALEoKA4BvS9wF5BFiHhB7/U6uvr8CJR0V5ULU03PfHCHgefON11HNA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F1F0C668-9C8D-4C2F-B724-333995F4AB3B|2026-07-13T14:45:09|STA0903206B9|SvA1cKF4cpWmYrhzaBtn2JgqF0H9g/AbqV8zB8Hijhlry78RMMbZ3+6ng+G9WXN6rWEMmtvjYflpYCMmkcJV5S6hSmN6jLTF+QnRmo+EVHN8qBuD4nBQAjrgj8kZrS07UcgggYxmSXlVktCeOww8VWslrR6B+gTbuqXkZUuzxY4hB5ENdXYrGd4EiJylRSROZYnkPW9hCdc4t8Y2ZWINHZpkGeUfni9h/7ZhSKln2QGm2Kq1hUclU766oqt5RKFZonnK/fQkCSWldwLi3DYzYbrlk3mYKyVd3YTcrlKoU5Vp29AZfyHGS1W5m12/Gtljy4rcbqN+nvRgm0q+7D6Sow==|00001000000711762511||

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
2024 - 2027

Factura Inteligente premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *facturainteligente.blikon.com/xml*

Para facturar en línea ingresa a: *facturainteligente.blikon.com*

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	PERIODO: DEL	19-jun-2026 AL 09-jul-2026
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
0	0	0.00		1,196,174.87

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **1,184,666.84** (UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 1 (UNO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,320,148.03				
PAGOS ANTERIORES: $	0.00				
POR EJERCER: $	1,320,148.03			$	1,320,148.03
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	1,031,185.23				
DEDUCTIVAS: $					
SUB TOTAL: $	1,031,185.23				
16% I.V.A.: $	164,989.64				
SUB TOTAL: $	1,196,174.87	$	1,196,174.87	$	1,196,174.87
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:					
ANTICIPOS: $	0.00				
3‰ I.C.I.C $	3,093.56				
2‰ D.I.F. $	2,062.37				
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	1,196.17				
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	5,155.93				
SUB TOTAL: $	11,508.03	$	11,508.03		
NETO APAGAR: $	**1,184,666.84**	$	**1,184,666.84**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $				$	123,973.16

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. JESUS RODRIGUEZ LOPEZ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-2026 al 09-jul-2026
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:** 1	**DE:**
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
1000.11	TRAZO Y NIVELACION	ML	$ 30.01	147.30	0.00	149.00	149.00	1.70	4,471.49
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	$ 45.26	294.60	0.00	298.00	298.00	3.40	13,487.48
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	$ 848.47	5.89	0.00	6.03	6.03	0.14	5,113.27
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	$ 1,030.51	35.35	0.00	36.21	36.21	0.86	37,314.77
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	$ 260.14	117.84	0.00	0.00	0.00		
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	$ 630.09	117.84	0.00	0.00	0.00		
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	$ 302.30	138.93	0.00	130.96	130.96		39,589.21
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	$ 735.31	11.78	0.00	12.07	12.07	0.29	8,873.19
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	$ 693.76	116.40	0.00	108.46	108.46		75,243.21
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO	ML	$ 908.89	147.30	0.00	149.00	149.00	1.70	135,424.61
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO	ML	$ 294.56	147.30	0.00	149.00	149.00	1.70	43,889.44
								ESTA HOJA $	363,413.67
								ACUMULADO $	363,413.67

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. JESUS RODRIGUEZ LOPEZ ADMINISTRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-2026 al 09-jul-2026
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:** 2	**DE:**
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO.	PIEZA	$ 1,025.62	4.00	0.00	4.00	4.00		4,102.48
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO	PIEZA	$ 1,660.17	4.00	0.00	4.00	4.00		6,640.68
2041. 03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	$ 46,225.39	1.00	0.00	1.00	1.00		46,225.39
1150	ADEME DE MADERA CERRADO.	M2	$ 238.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE. HINCADO DE TUBERIAS. TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	HORA	$ 231.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
10 001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.	POZO	$ 3,358.75	3.00	0.00	3.00	3.00		10,076.25
1.006AY12"	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	$ 13,765.34	27.00	0.00	27.00	27.00		371,664.18
2.006A3.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A TUBO DE 12", DE 3.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2".	PIEZA	$ 6,941.70	14.00	0.00	13.00	13.00		90,242.10
2.006A9.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 12" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL(PEXa)MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2"	PIEZA	$ 9,421.75	13.00	0.00	14.00	14.00	1.00	131,904.50
								ESTA HOJA $	660,855.51
								ACUMULADO $	1,024,269.23

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. JESUS RODRIGUEZ LOPEZ S. (OBRAS)

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-2026 al 09-jul-2026
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:** 3	**DE:**
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza.	$ 6,102.30	1.00	0.00	1.00	1.00		6,102.30
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M. COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	pza	$ 813.68	1.00	0.00	1.00	1.00		813.68
								ESTA HOJA $	2,352,896.38
								ACUMULADO $	1,031,185.23
								ESTA ESTIMACION $	1,031,185.23

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. JESUS RODRIGUEZ LOPEZ ADMINISTRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO: del**	19-jun-2026 **al** 09-jul-2026
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:**	1 **DE:** 4
CONTRATISTA:	**ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS**		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	**CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.**											
1000 11	TRAZO Y NIVELACION			149.00			ML	1.00		149.00		
								TOTAL =		**149.00**	149.00	100%
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO			149.00			ML	**2.00**		**298.00**		
								TOTAL =		**298.00**	298.00	100%
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.			149.00	0.90	0.05	M3	**1.00**		**6.71**		
								SOLO SE ESTIMA =		**6.03**	6.03	100%
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.			149.00	0.90	0.30	M3	**1.00**		**40.23**		
								SOLO SE ESTIMA =		**36.21**	36.21	100%
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA			0.00	0.00		M2	**0.00**		**0.00**		
								TOTAL =		**0.00**	0.00	0.00%
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"			0.00	0.00		M2	**0.00**		**0.00**		
								TOTAL =		**0.00**	0.00	0.00%
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.			75.00	0.90	1.09	M3			**73.58**		
				74.00	0.90	1.08				**71.93**		
								TOTAL =		**145.51**		
								SOLO SE ESTIMA =		**130.96**	130.96	94.26%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO: del**	19-jun-2026 **al** 09-jul-2026
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:**	2 **DE:** 4
CONTRATISTA:	**ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS**		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS											
1130.0	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO			149.00	0.90	0.10	M3	1.00		13.41		
								SOLO SE ESTIMA =		12.07	12.07	100%
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO			75.00	0.90	1.09	M3			73.58	66.22	
				74.00	0.90	1.08				71.93	64.74	
		MENOS	PLANTILLA	149.00	0.90	0.10		-1.00		-13.41	-12.07	
		MENOS	TUBERIA 12"	149.00		0.07		-1.00		-10.43	-10.43	
										121.67		
								TOTAL =		108.46	108.46	93.18%
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO			149.00			ML			149.00		
								TOTAL =		149.00	149.00	100%
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO			149.00			ML			149.00		
								TOTAL =		149.00	149.00	100%
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 MM (12") DE DIAMETRO.						PZA	4.00		4.00		
								TOTAL =		4.00	4.00	100.00%
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO						PZA	4.00		4.00		
								TOTAL =		4.00	4.00	100.00%
2041.03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.						PZA	1.00		1.00		
								TOTAL =		1.00	1.00	100.00%
1150.0	ADEME DE MADERA CERRADO.			0.00	0.00		M2	0.00		0.00		
								TOTAL =		0.00	0.00	#¡DIV/0!

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	PERIODO: del	19-jun-2026 al 09-jul-2026
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	HOJA: 3	DE: 4
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS											
2205.0	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE. HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.						HORA	0.00		0.00		
							TOTAL =			0.00	0.00	#¡DIV/0!
10001 01-P	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA EXISTENTE PARA SU REHABILITACION.						PZA	3.00		3.00		
							TOTAL =			3.00	3.00	100.00%
1.006AY12"	REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45º, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.						PZA	27.00		27.00		
							TOTAL =			27.00	27.00	100.00%
2.006A3.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A TUBO DE 12", DE 3.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXa) MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2".						PZA	13.00		13.00		
							TOTAL =			13.00	13.00	92.86%
2.006A9.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 12" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL(PEXa)MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2"						PZA	14.00		14.00		
							TOTAL =			14.00	14.00	100 %

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO: del**	19-jun-2026 **al** 09-jul-2026
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:** 4	**DE:** 4
CONTRATISTA:	**ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS**		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE	VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS											
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.						PZA	1.00		1.00		
								TOTAL =		1.00	1.00	100.00%
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.						PZA	1.00		1.00		
								TOTAL =		1.00	1.00	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

PERIODO:	HOJA:

ORDEN DE ACTUALIZACION	NUM. CONTRATO:	NUM. DE ESTIMACION:	DEL 19-jun-2026 AL 09-jul-2026	No 1 DE 1
	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	1 (UNO)		

CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LOCALIDAD:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	MUNICIPIO: MATAMOROS	PROGRAMA:	FAISMUN

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN				INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA 1a.	PRORROGA 2a.
1000 11	TRAZO Y NIVELACION	1.70 ML	$30.01	$51.02	1.70			
1000	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	3.40 ML	$45.26	$153.88	3.40			
1000	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	0.14 M3	$848.47	$118.79	0.14			
1000	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	0.86 M3	$1,030.51	$886.24	0.86			
1130	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	0.29 M3	$735.31	$213.24	0.29			
8037	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO	1.70 ML	$908.89	$1,545.11	1.70			
3050	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO	1.70 ML	$294.56	$500.75	1.70			
2.006A9.00ML	REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 12" DE 9.00 ML EN ASFALTO, INCLUYE: MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL(PEXa)MUNICIPEX DE LA LINEA REHAU DE 1/2" DE DIAMETRO, LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCION DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2"	1.00 PIEZA	$9,421.75	$9,421.75	1.00			
			SUMA =	$12,890.78				

EXPLICACION AMPLIA: (QUE, COMO, DONDE,QUIEN, PORQUE, CUANDO)

SE EJECUTA ESTE VOLUMEN ADICIONAL POR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.


CAUSAS

* CONDICIONES NATURALES DIS-TINTAS A LAS SUPUESTAS:	X	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES:	
* CAMBIOS DE DISEÑO:		* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO:	
* CAMBIOS DE LOCALIZACION:		* RETRASO DE NUEVOS PAGOS:	
* ERROR INICIAL:		* RECORTE PRESUPUESTAL:	
* OTROS:			

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION	ING. JESUS RODRIGUEZ LOPEZ ADMINISTRADOR DE PROGRAMA

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-26 al 09-jul-26
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:** 1	DE: . 3 .
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		


CROQUIS

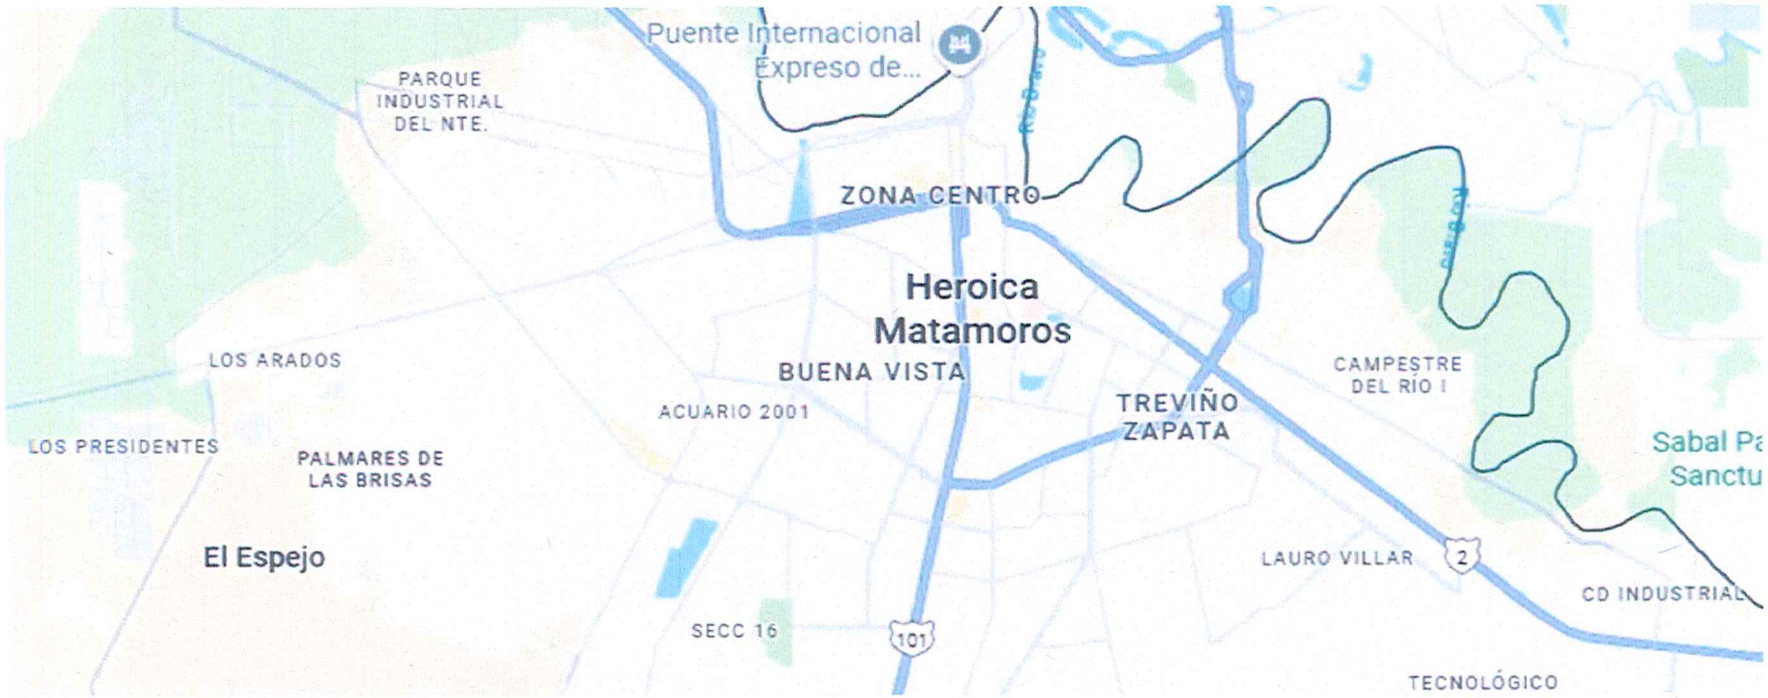

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-26 al 09-jul-26
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:** 2	DE: . 3 .
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		


CROQUIS

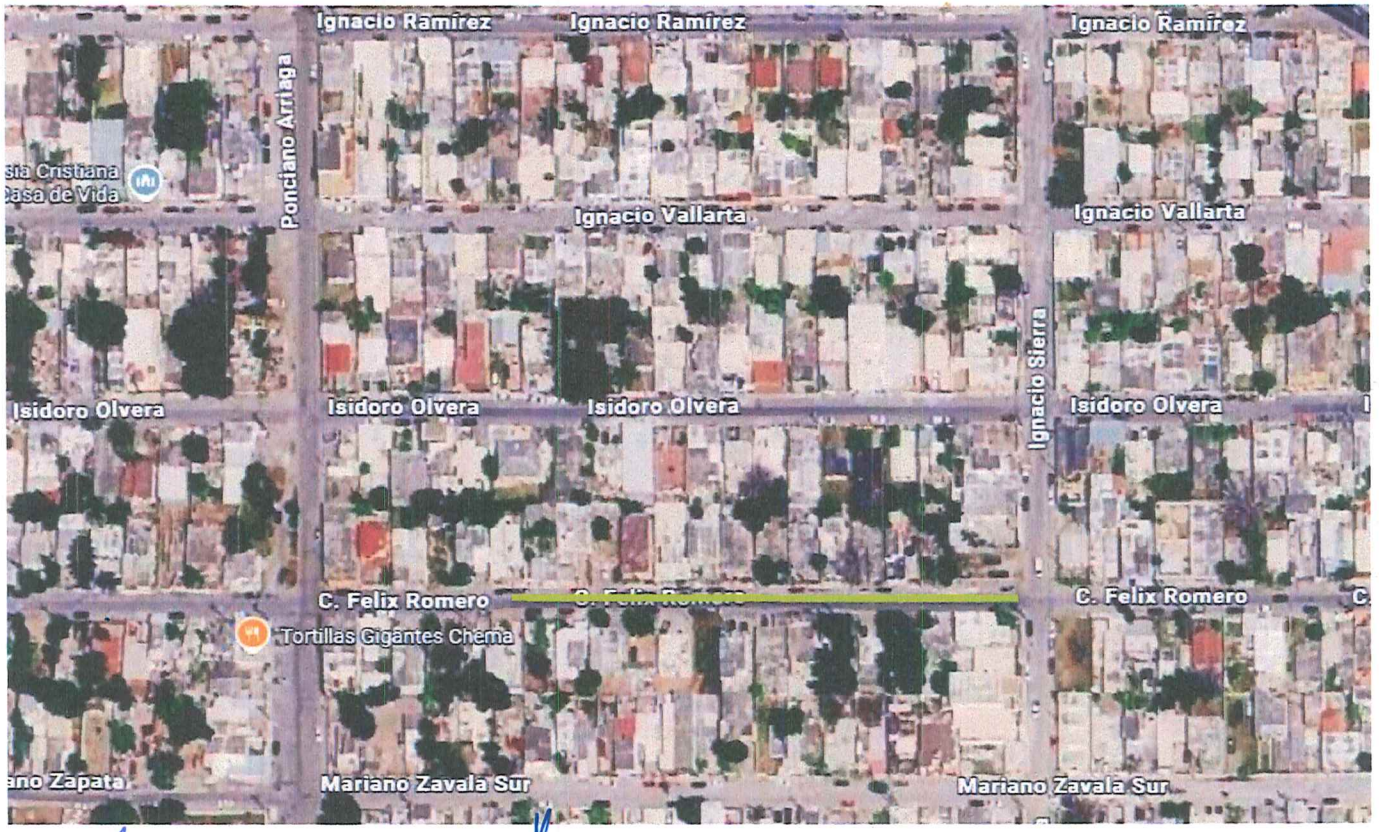

CONTRATISTA :	**SUPERVISO:**	**REVISO:**
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-26 al 09-jul-26
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:** 3	DE: . 3 .
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

CROQUIS

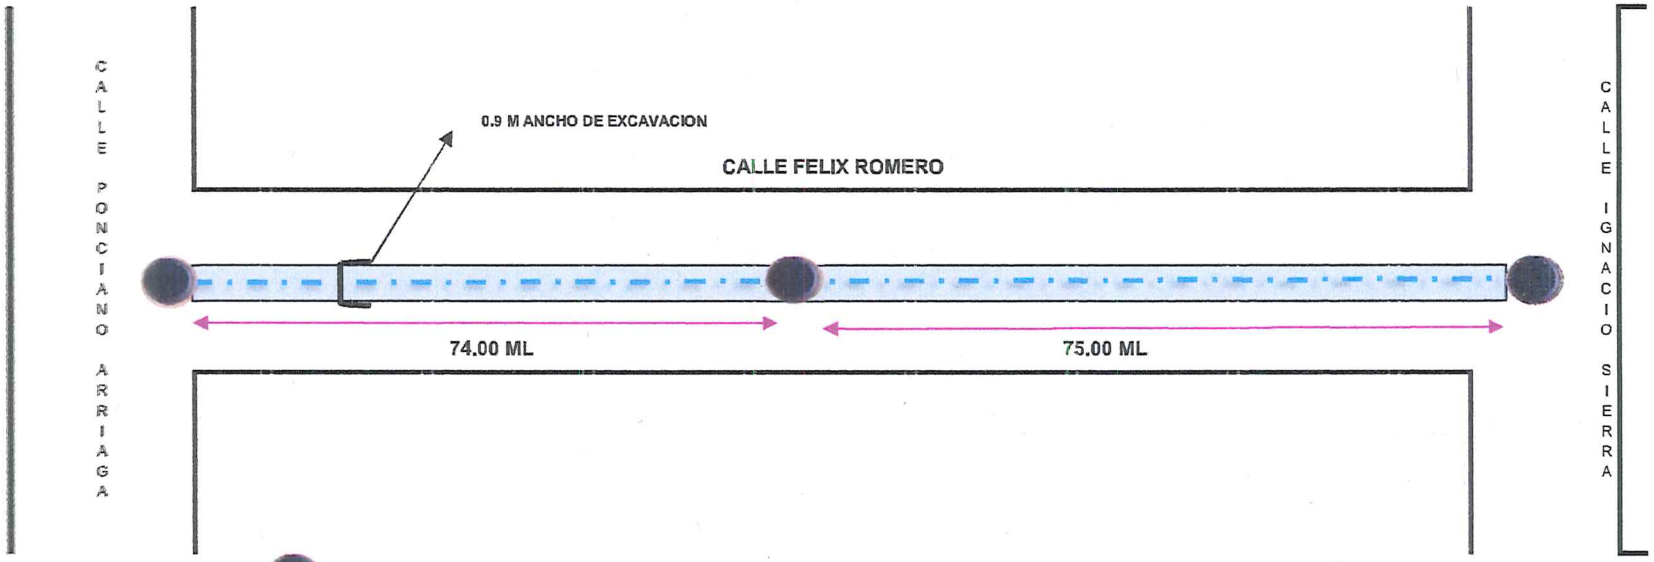


CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-26 al 09-jul-26
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:**	1 DE: 7
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

FOTOGRAFIAS

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO O BASE DE SULFATO, EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA.

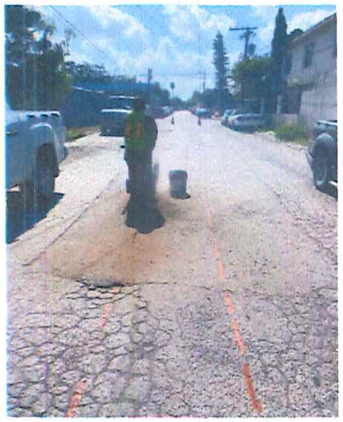









CONTRATISTA :	**SUPERVISO:**	**SUPERVISO:**
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISIÓN

Gobierno Municipal de MATAMOROS




CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-26 al 09-jul-26
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:**	2 DE: 7 .
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

FOTOGRAFIAS

SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA NMX-E-215/1-2003-SCFI-DE 315 mm (12") MM DE DIAMETRO, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

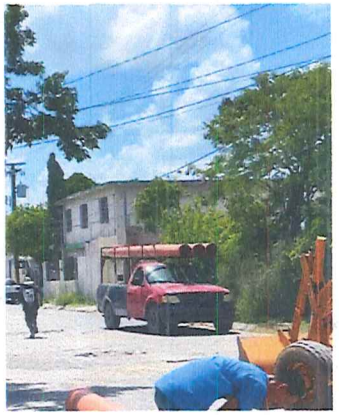


CONTRATISTA : ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	**SUPERVISO:** ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	**SUPERVISO:** ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

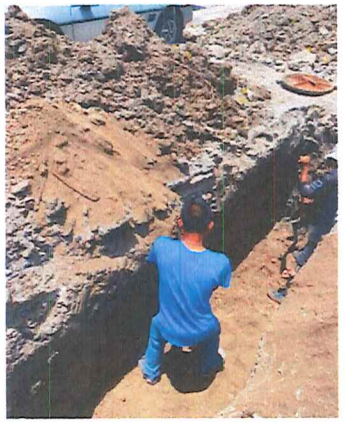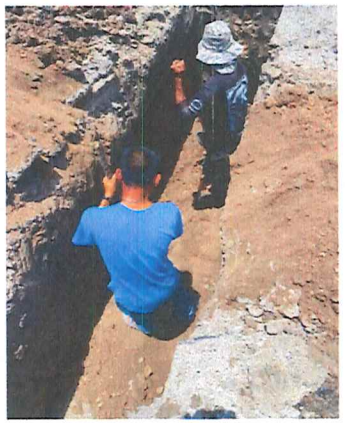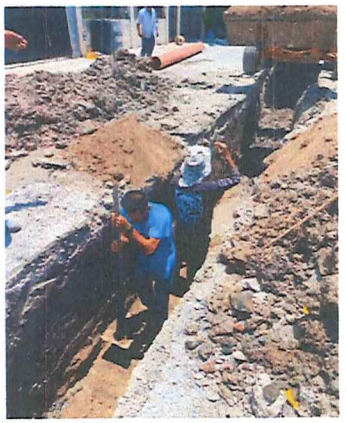CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-26 al 09-jul-26
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:**	3 DE: 7
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

FOTOGRAFIAS

RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

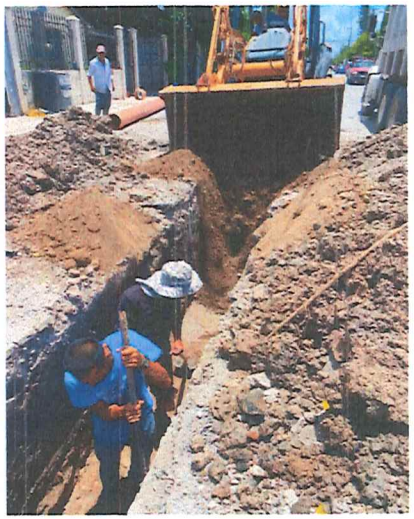


CONTRATISTA :	**SUPERVISO:**	**SUPERVISO:**
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-26 al 09-jul-26
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:**	4 DE: 7 .
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

FOTOGRAFIAS

INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300MM (12") DE DIAMETRO,

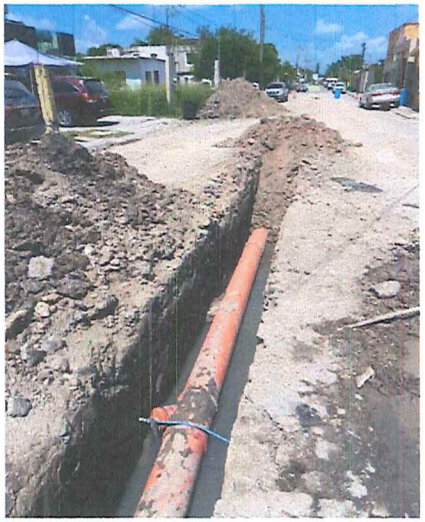

CONTRATISTA :	**SUPERVISO:**	**SUPERVISO:**
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-26 al 09-jul-26
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:**	5 DE: 7 .
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

FOTOGRAFIAS

INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO,LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN INTERIOR DE POZO DE VISITA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO, MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEOS













CONTRATISTA :	**SUPERVISO:**	**SUPERVISO:**
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-26 al 09-jul-26
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:**	6 DE: 7 .
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		


FOTOGRAFIAS

REPOSICIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 6" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M LONGITUD EN ASFALTO, REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A TUBO DE 12", DE 3.00 ML EN ASFALTO, REPOSICIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A TUBO DE 12", DE 9.00 ML EN ASFALTO

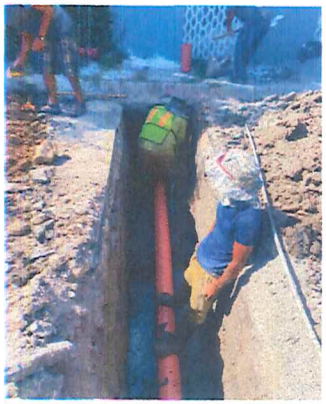





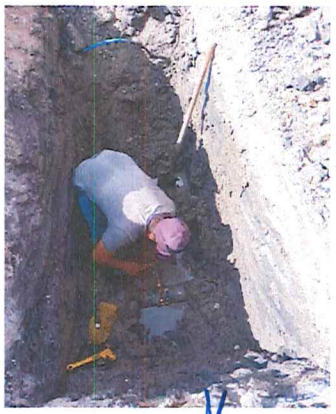

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION


Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-FAISMUN-010/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	FAISMUN	**PERIODO:** del	19-jun-26 al 09-jul-26
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	**FECHA:**	10 de julio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA SECCION 16	**HOJA:**	7 DE: 7 .
CONTRATISTA:	ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS		

FOTOGRAFIAS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2"" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M.



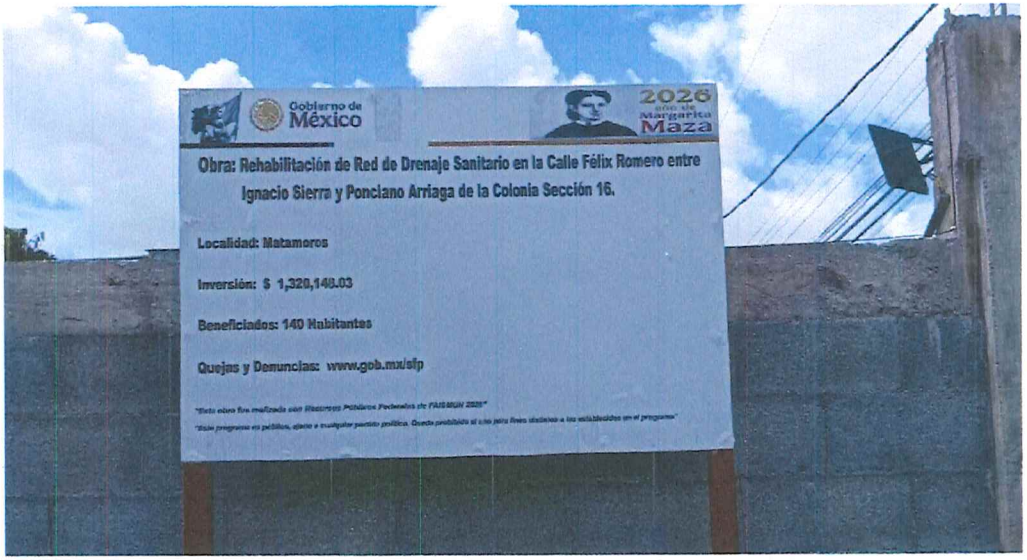

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

SECRETARIA DE DESRROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

BITACORA DE OBRA

No DE CONTRATO:	OBRA	UBICACION:
MAT-OP-FAISMUN-010/2026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	COLONIA SECCION 16

Nota No 1 Fecha 19 de junio de 2026 Tipo APERTURA

Con esta fecha se abre la presente Bitacora de Obra Publica siendo la Dependencia Contratante El Municipio de Matamoros, Tamaulipas con direccion en Calle Sexta s/n Zona Centro y con Numero de Telefono 868 810 80 00

Mediante contrato de fecha 18 de junio de 2026 La Dependencia designa como Empresa contratista a ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS con direccion en CALLE ALMENDRO NO.51 COL. ARBOLEDAS H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, C.P. 87448 y con Numero de Telefono (868)1231523

Esta Bitacora forma parte del Contrato MAT-OP-FAISMUN-010/2026 Con un Importe de $1,320,148.03 inlcuido el Impuesto al Valor Agregado y con un Periodo de Ejecucion de 120 dias habiles con Fecha de inicio el 19 de junio de 2026 y con Fecha de Terminacion el 16 de octubre de 2026

Los trabajos a ejecutar por parte del Contratista consisten en:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

Ubicados en COLONIA SECCION 16 del Municipio de Matamoros, Tam.

Nota No 2 Fecha 19 de junio de 2026 Tipo VALIDACION

RESIDENTE

La Contratante El Municipio de Matamoros, Tam. Designa al (la) C. ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA como Supervisor de la Obra quien fungira como representante del Municipio ante el Contratista y sera la persona Responsable directa de la Supervision, Vigilancia, Control y Revision de los trabajos con Oficio de Fecha 18 de junio de 2026 emitido en cumplimiento del Articulo 53 de la LOPSRM y/o del Articulo 61 de la LOPSRM para el el Estado de Tamaulipas

SUPERINTENDENTE

La Contratista ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS
Designa al (la) C. ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS como Superintendente de la Obra, y quien fungira como Representante de la Contratista ante la Contratante y a quien le otorga completa Facultad para oir y recibir toda clase de Notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como, para la toma de desiciones requeridos en el cumplimiento del contrato

NOTAS DE BITACORA

Tanto el Residente Como el Superintendente acuerdan que la Bitacora de Obra estara disponible y se podran asentar Notas en ella a cualquier hora del dia y durante el tiempo que el contrato y la obra tenga vigencia, Tambien acuerdan ambas partes que se dara un plazo de tres dias habiles para la firma de cualquier nota y pasado este plazo se dara por aceptada la nota, asi mismo por ninguna causa se modificara una Nota y de ser necesario se debera asentar una Nota Aclaratoria al respecto

ESTIMACIONES

Las estimaciones seran con un periodo no mayor a 30 dias calendario y se deberan presentar dentro de los seis dias naturales despues de la fecha del corte, la residendia contará con un periodo no mayor a quince dias naturales para efectuar la revision y autorizacion de las mismas a partir de la fecha de su entrega completa en los terminos del Articulo 132 del RLOPSRM

CONTRATISTA:	SUPERVISOR	JEFE DEL DPT DE SUPERVISION
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU

SECRETARIA DE DESRROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

BITACORA DE OBRA

No DE CONTRATO:	OBRA	UBICACION:
MAT-OP-FAISMUN-010/2026	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	COLONIA SECCION 16

Nota No	3	Fecha	19 de junio de 2026	Tipo	INICIO DE LOS TRABAJOS

Con esta fecha se reunen en el sitio de los trabajos el Residente y el Superintendente de la obra con la finalidad de hacer la entrega fisica del bien inmueble y declarar formalmente iniciados los trabajos motivo de este contrato

Nota No	4	Fecha	20 de junio de 2026	Tipo	PROCESO

El contratista inicia con los trabajos de trazo, nivelacion y corte con cortadora de disco,

Nota No	5	Fecha	22 de junio de 2026	Tipo	PROCESO

Se inician los trabajos de ruptura y demolicion de pavimento asfaltico y base de sulfato existente.

Nota No	6	Fecha	23 de junio de 2026	Tipo	PROCESO

El personal a cargo del contratista realiza maniobra de by pass para desvio de agua de pozos de visita.
Y se comienza a colocar la plantilla con material producto de banco para recibir tubo de 12"

Nota No	7	Fecha	24 de junio de 2026	Tipo	PROCESO

Se realiza la excavacion de zanjas para el retiro de la tuberia existente, y se observa que se ha suministrado la tuberia de pvc sanitaria serie 20 metrica nmx-e-215/1-2003-scfi-de 315 mm (12") mm de diametro.

Nota No	8	Fecha	25 de junio de 2026	Tipo	PROCESO

Se inicia la interconexion al pozo de visita, realizando los trabajos de ranurado en paredes de pozo de vista. Se le indica al contratista que retire la tierra producto de excavacion de la zona de trabajo.
De igual manera se incia con los trabajos de instalacion de tuberia de drenaje de 12 plg y se coloca la manga de empotramiento en primer pozo de visita.

Nota No	9	Fecha	29 de junio de 2026	Tipo	PROCESO

Se registra que el contratista sigue con el evance de introduccion de tuberia de acuardo a proyecto.
Se comienza ranurado en segundo pozo de visita para conectar tuberia de 12" de diametro, se conecta tuberia de 12" y se coloca manga de empotramiento.

Nota No	10	Fecha	30 de junio de 2026	Tipo	PROCESO

Se relaiza visita al sitio de obra y se observa al personal del contratista realizando los trabajos de instalacion de anuncio de obra. El contratista rellena y compacta material de banco el area en donde ya fue colocada la tuberia de 12"

Nota No	11	Fecha	2 de julio de 2026	Tipo	PROCESO

Se comienza ranurado en tercer pozo de visita para conectar tuberia de 12" de diametro, y se finaliza la introduccion de tuberia de 12" colocando manga de empotramiento.

Nota No	12	Fecha	3 de julio de 2026	Tipo	PROCESO

Se sigue realizando relleno y compactacion de material de banco en zanja de tuberia de 12" .
Se comienza con la reposicion de tomas de agua y descargas sanitarias por parte del personal a cargo del contratista

Nota No	13	Fecha	6 de julio de 2026	Tipo	PROCESO

Se finaliza el relleno y compactacion de material de banco en zanja principal de tuberia de 12" .
El contratista sigue avanzando con tomas y descargas y a su vez se rellena con material de banco una vez conectadas.

Nota No	14	Fecha	9 de julio de 2026	Tipo	PROCESO

Se finaliza con la reposicion de tomas de agua y descargas sanitarias.

CONTRATISTA:	SUPERVISOR	JEFE DEL DPT DE SUPERVISION
ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS	ING. GISEL ABIGAIL ALONSO RIVERA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
MAGS

MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS
RFC: GOSM800722Q21
ALMENDRO #51 COL.ARBOLEDAS
TEL:8681231543
CP:87448

H. MATAMOROS TAMPS. A 19 DE JUNIO DEL 2026

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA INFORMAR QUE CON LA FECHA DE ESTE OFICIO SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA**: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.** BAJO EL AMPARO DE **CONTRATO No. MAT-OP-FAISMUN-010/2026.**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES QUEDO DE USTED

ATENTAMENTE

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
MAGS

MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS
RFC: GOSM800722Q21
ALMENDRO #51 COL.ARBOLEDAS
TEL:8681231543
CP:87448

H. MATAMOROS TAMPS. A 19 DE JUNIO DEL 2026

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA INFORMARLE QUE EL **ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS,** SERA EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA DENOMINADA: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.** BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO**: MAT-OP FAISMUN-010/2026.** TENIENDO LAS FACULTADES DE FIRMAR OFICIOS**,** ESTIMACIONES, BITACORA DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES QUEDO DE USTED

ATENTAMENTE

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO. **EJECUTORA:** ING. MIGUEL ANGEL SOLIS GONZALEZ

TRAMO: ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16. **ENSAYE No.:** MAG/3339-1359

CIUDAD: MUNICIPO H. MATAMOROS TAMAULIPAS **FECHA INFORME:** 26 DE JUNIO DEL 2026

REFERENCIAS: N-CTR-CAR-1.04.002

ESPESOR: 10.0 cms. Compactación [X] Recompactación [ ]

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 85.0 CAPA ENSAYADA: **PLANTILLA (MATERIAL DE BANCO)**

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
			CALLE FELIX ROMERO					
3279	-	CENTRO	10.0	16.3	17.5	1643	1780	92.3
3280	-	CENTRO	11.0	15.0	17.5	1629	1780	91.5
3281	-	CENTRO	10.0	15.1	17.5	1643	1780	92.3

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO.

TRAMO: ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16.

CIUDAD: MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No.:** MAG/3340-1360

EJECUTORA: ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS **FECHA INFORME:** 8 de julio de 2026

REFERENCIAS: N-CTR-CAR-1.04.002

ESPESOR: VARIABLE cms. Compactación [X] Recompactación [ ]

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 95.0 CAPA ENSAYADA: RELLENO DE ZANJAS (MATERIAL DE BANCO)

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
			CALLE FELIX ROMERO					
3282	1 A CAPA	CENTRO	19.0	15.00	17.80	1693	1780	95.1
3283	2 A CAPA	CENTRO	19.0	17.00	17.80	1709	1780	96.0
3284	3 A CAPA	CENTRO	21.0	15.20	17.80	1705	1780	95.8
3285	4 A CAPA	CENTRO	19.0	15.10	17.80	1691	1780	95.0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
MAGS

MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS
RFC: GOSM800722Q21
ALMENDRO #51 COL.ARBOLEDAS
TEL:8681231543
CP:87448

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 29 DE JUNIO DE 2026

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EN REFERANCIA AL CONTRATO: MAT-OP-FAISMUN-010/2026. DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS. SOLICITAMOS A USTED LA AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES DE OBRA ADICIONALES INCLUIDOS EN LA ORDEN DE ACTUALIZACION DE LA ESTIMACION No1 (UNO) LOS CUALES FUERON NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES QUEDO DE USTED

ING. MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS
REPRESENTANTE LEGAL

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 10 DE JULIO DEL 2026

MIGUEL ANGEL GONZALEZ SOLIS
Presente.-

En relación a la obra denominada REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIX ROMERO ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS al amparo del contrato de Obra Pública No.MAT-OP-FAISMUN-010/2026, hago de su conocimiento que esta Direccion a mi cargo autoriza los Volumenes de Obra Excedentes inscritos en la Orden de Actualizacion incluida en la Estimacion No 1 del Referido Contrato para su tramite y pago

Atentamente

ING FERNANDO REQUENA CHAVEZ
Director de Obras Publicas

c.c.p. archivo
