Secretaría de
Desarrollo Urbano

H. Matamoros, Tamaulipas a 02 de junio del 2026

No. De Oficio: SECDU/DIOP-E-0010/2026
ASUNTO: Pago de Factura

C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

Anexo al Presente envío a usted para su respectivo Pago la siguiente Factura Original con Folio: **F01 - 39** del Contratista **PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.** Para Pago por: **ESTIMACION No. 1** al amparo del contrato de Obra Pública No. **MAT-OP-OD-003/2026** Relativo a la Obra **PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS**

Con un Importe de : $ 3,922,898.88
(TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)

CONTRATO: MAT-OP-OD-003/2026

PROGRAMA: OBRA DIRECTA

Atentamente

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Vo. Bo.

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
2024 - 2027

Vo. Bo. Revision Normativa

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.
RECIBIDO
Laura
05 JUN. 2026
1108 pm
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027

ESCANEADO

Matamoros 200 Bicentenario

Proyectos de construccion y Urbanizacion ALPE

Cliente

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE

PCU240403FQA

601 - General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

MMT320612AWA

Domicilio fiscal: 87300 - Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

I01 - Construcciones

CFDI Versión 4.0

Folio fiscal

c99a9116-e9c8-43a4-b7df-1cf3def25716

Número de serie del CSD

00001000000709244376

Código postal, fecha y hora de emisión

CP: 66220
01/06/2026 12:07:39 PM

Serie y folio sinube

F01 - 39

Exportación

01

Clave SAT	Código	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj. de impuesto
72141003	72141003	1	E48	SERV	RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE $3,922,898.88 (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) RELATIVO A: PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS CONTRATO: MAT-OP-OD-003/2026	$3,414,660.77	**$3,414,660.77**	02

Tipo imp	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
Traslado	002	Tasa	16.0%	$3,414,660.77	$546,345.72

IMPORTE CON LETRA

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.

Subtotal	$3,414,660.77
Descuento	$0.00
ICIC 3% AL MILLAR 0.3%	$10,243.98
DIF 2% AL MILLAR 0.2%	$6,829.32
INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR 0.5%	$17,073.30
ORG. TEC. DE FISC DEL EDO 1% AL MILLAR 0.12%	$3,961.01
IVA 16.0%	$546,345.72
TOTAL	**$3,922,898.88**

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. MATAMOROS, TAM.

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. MATAMOROS, TAM.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
2024 - 2027

Sello digital del CFDI:

l5ITHLhMgEnkXbe9Nq1Kg8qSqxfJSvjgcQfdEpCAaOR6ioO9rmNxYzmXAILuP/hRgm6apEcBvnz5cEQ/edAtr6ZqC1uqWGbS1A84
bTPk1UQ6MSFPOshO4IMEuuu0/piNOmF2i1ZqBLFBr3bi5pg19/4asjlg7yi8eCHxCHmevzkI+1EtxSTit2JKtdqV6cUoPJ4F2jft
iK3ZJ4OlWJk485crBTX7vcC7phTkB/5WFAXTOcgJ6rsj+UnpPswNhIMt+9+MJIN+uL3I2ZPDnnxsQN2u7jvXcxCAdQX0MNpl4UmL
C7V9Z2fNMRJKbMRyvHv54+XZp0KZJafYbNGxi9SLNw==

Sello del SAT:

MBDS5R+W9Ls0xF9QL30KwqKXWY4Yt3HoGBdEPkQcup4hbFfFhPaayf0QVMMpiCERgukNPtqxdIfBp6wK+4XcINqLEPNN2ClqIJRn
h28NJvPs20+/p7nl738U+qQkV3G392N7jyvCfFZBPHStD/eQZFMEwIpULiJ4BdU5aVhQiaUJUsJrMyqwM6hzh+s69xuaDpM3wHzO
RbGYDbMkZaSlLdlOgpU/s6Q+b43AN5fSaMKyRa8N+Fr1CR9bxVWejzyqLehcgBEONOFNIRGvk/i7IU6gFAPmQJx8JN3eQkCmTvde
fb2AjoEDsWLQ3969Yl++gqL2ChVElBaoUFfw2MYw9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c99a9116-e9c8-43a4-b7df-1cf3def25716|2026-06-01T12:08:40|LSO1306189R5|l5ITHLhMgEnkXbe9Nq1Kg8qS
qxfJSvjgcQfdEpCAaOR6ioO9rmNxYzmXAILuP/hRgm6apEcBvnz5cEQ/edAtr6ZqC1uqWGbS1A84bTPk1UQ6MSFPOshO4IMEuuu0
/piNOmF2i1ZqBLFBr3bi5pg19/4asjlg7yi8eCHxCHmevzkI+1EtxSTit2JKtdqV6cUoPJ4F2jftiK3ZJ4OlWJk485crBTX7vcC7
phTkB/5WFAXTOcgJ6rsj+UnpPswNhIMt+9+MJIN+uL3I2ZPDnnxsQN2u7jvXcxCAdQX0MNpl4UmLC7V9Z2fNMRJKbMRyvHv54+XZ
p0KZJafYbNGxi9SLNw==|00001000000719545303||

No de Serie de Certificado del SAT:

00001000000719545303

Fecha y hora de certificación:

01/06/2026 12:08:40 PM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
Certificado="MIIGhjCCBG6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDkyNDQzNzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVU
CondicionesDePago="CONTADO" Exportacion="01" Fecha="2026-06-01T12:07:39" Folio="39" FormaPago="99" LugarExpedicion="66220" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000709244376"
Sello="l5ITHLhMgEnkXbe9Nq1Kg8qSqxfJSvjgcQfdEpCAaOR6ioO9rmNxYzmXAILuP/hRgm6apEcBvnz5cEQ/edAtr6ZqC1uqWGbS1A84bTPk1UQ6MSFPOshO4IMEuuu0/piNOmF2i1ZqBLFBr3bi5p
Serie="F01" SubTotal="3414660.77" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="3922898.88" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE" RegimenFiscal="601" Rfc="PCU240403FQA"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="87300" Nombre="MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="MMT320612AWA"
  UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1" ClaveProdServ="72141003" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS LA CANTIDAD DE
    $3,922,898.88 ( TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. ) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO)
    RELATIVO A: PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN
    EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS CONTRATO: MAT-OP-OD-003/2026" Importe="3414660.77" NoIdentificacion="72141003" ObjetoImp="02" Unidad="SERV"
    ValorUnitario="3414660.77">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="3414660.77" Importe="546345.72" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="546345.72">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="3414660.77" Importe="546345.72" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="38107.61" TotaldeTraslados="0.00" version="1.0">
      <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="ICIC 3% AL MILLAR" Importe="10243.98" TasadeRetencion="0.30"/>
      <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="DIF 2% AL MILLAR" Importe="6829.32" TasadeRetencion="0.20"/>
      <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="INSPECCION Y VIGILANCIA 5% AL MILLAR" Importe="17073.30" TasadeRetencion="0.50"/>
      <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="ORG. TEC. DE FISC DEL EDO 1% AL MILLAR" Importe="3961.01" TasadeRetencion="0.12"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="c99a9116-e9c8-43a4-b7df-1cf3def25716"
    FechaTimbrado="2026-06-01T12:08:40" RfcProvCertif="LSO1306189R5"
    SelloCFD="l5ITHLhMgEnkXbe9Nq1Kg8qSqxfJSvjgcQfdEpCAaOR6ioO9rmNxYzmXAILuP/hRgm6apEcBvnz5cEQ/edAtr6ZqC1uqWGbS1A84bTPk1UQ6MSFPOshO4IMEuuu0/piNOmF2i1ZqBLF
    NoCertificadoSAT="00001000000719545303"
    SelloSAT="MBDS5R+W9Ls0xF9QL30KwqKXWY4Yt3HoGBdEPkQcup4hbFfFhPaayf0QVMMpiCERgukNPtqxdIfBp6wK+4XcINqLEPNN2ClqIJRnh28NJvPs20+/p7nl738U+qQkV3G392N7jyvCfFZ
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO: DEL	02-may-2026 AL 30-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
PCU240403FQA	S/N	D4246392101		3,961,006.49

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **3,922,898.88** (TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 1 (UNO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	4,026,791.24				
PAGOS ANTERIORES: $	0.00				
POR EJERCER: $	4,026,791.24			$	4,026,791.24
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	3,414,660.77				
DEDUCTIVAS: $					
SUB TOTAL: $	3,414,660.77				
16% I.V.A.: $	546,345.72				
SUB TOTAL: $	3,961,006.49	$	3,961,006.49	$	3,961,006.49
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:					
ANTICIPOS: $	0.00				
3‰ I.C.I.C $	10,243.98				
2‰ D.I.F. $	6,829.32				
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	3,961.01				
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	17,073.30				
SUB TOTAL: $	38,107.61	$	38,107.61		
NETO APAGAR: $	**3,922,898.88**	$	**3,922,898.88**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $				$	65,784.75

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-2026 al 30-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	**HOJA:** 1	**DE:** 2
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
P.01	Trazo y nivelacion	m2	$ 26.75	2,853.65	0.00	2,865.65	2,865.65	12.00	76,656.14
P.02	Excavacion en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40mts.	m3	$ 112.62	986.89	0.00	917.01	917.01		103,273.67
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavacion a limites de la ciudad	m3	$ 268.10	1,282.96	0.00	1,192.12	1,192.12		319,607.37
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio	m2	$ 114.82	2,819.68	0.00	2,865.65	2,865.65	45.97	329,033.93
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Pza	$ 6,965.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Pza	$ 13,121.65	0.00	0.00	0.00	0.00		
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	$ 945.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	$ 771.63	986.89	0.00	1,002.98	1,002.98	16.09	773,929.46
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	$ 630.19	2,853.65	0.00	2,865.65	2,865.65	12.00	1,805,903.97
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	Pza	$ 7,764.38	3.00	0.00	0.00	0.00		
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	Pza	$ 6,256.23	1.00	0.00	1.00	1.00		6,256.23
								ESTA HOJA $	**3,414,660.77**
								ACUMULADO $	**3,414,660.77**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-2026 al 30-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL 2	**HOJA:**	**DE:**
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Pza	$ 8,243.40	2.00	0.00	0.00	0.00		
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Pza	$ 5,142.02	2.00	0.00	0.00	0.00		
0	0	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00		
0	0	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00		
0	0	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00		
0	0	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00		
0	0	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00		
								ESTA HOJA $	**0.00**
								ACUMULADO $	**3,414,660.77**
								ESTA ESTIMACION $	**3,414,660.77**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO: del	02-may-2026 al 30-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	HOJA: 1	DE: 4
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	0										
P.01	Trazo y nivelacion		0 - 40m	40.00	8.45		m2	1.00	338.00		
			40 - 80m	40.00	8.40		m2	1.00	336.00		
			80 - 120m	40.00	8.45		m2	1.00	338.00		
			120 - 160m	40.00	8.40		m2	1.00	336.00		
			160 - 200m	40.00	8.40		m2	1.00	336.00		
			200 - 240m	40.00	8.32		m2	1.00	332.80		
			240 - 280m	40.00	8.35		m2	1.00	334.00		
			280 - 320m	40.00	8.43		m2	1.00	337.20		
			320 - 340.9	20.90	8.50		m2	1.00	177.65		
								TOTAL =	2,865.65	2,865.65	100.00%
P.02	Excavacion en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40mts.		0 - 40m	40.00	8.45	0.32	m3	1.00	108.16		
			40 - 80m	40.00	8.40	0.32	m3	1.00	107.52		
			80 - 120m	40.00	8.45	0.32	m3	1.00	108.16		
			120 - 160m	40.00	8.40	0.32	m3	1.00	107.52		
			160 - 200m	40.00	8.40	0.32	m3	1.00	107.52		
			200 - 240m	40.00	8.32	0.32	m3	1.00	106.50		
			240 - 280m	40.00	8.35	0.32	m3	1.00	106.88		
			280 - 320m	40.00	8.43	0.32	m3	1.00	107.90		
			320 - 340.9	20.90	8.50	0.32	m3	1.00	56.85		
								TOTAL =	917.01	917.01	92.92%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO: del	02-may-2026 al 30-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	HOJA: 2	DE: 4
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	0										
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavacion a limites de la ciudad		0 - 40m	40.00	8.45	0.32	m3	1.30	140.61		
			40 - 80m	40.00	8.40	0.32	m3	1.30	139.78		
			80 - 120m	40.00	8.45	0.32	m3	1.30	140.61		
			120 - 160m	40.00	8.40	0.32	m3	1.30	139.78		
			160 - 200m	40.00	8.40	0.32	m3	1.30	139.78		
			200 - 240m	40.00	8.32	0.32	m3	1.30	138.44		
			240 - 280m	40.00	8.35	0.32	m3	1.30	138.94		
			280 - 320m	40.00	8.43	0.32	m3	1.30	140.28		
			320 - 340.9	20.90	8.50	0.32	m3	1.30	73.90		
								TOTAL =	**1,192.12**	1,192.12	92.92%
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio		0 - 40m	40.00	8.45		m2	1.00	338.00		
			40 - 80m	40.00	8.40		m2	1.00	336.00		
			80 - 120m	40.00	8.45		m2	1.00	338.00		
			120 - 160m	40.00	8.40		m2	1.00	336.00		
			160 - 200m	40.00	8.40		m2	1.00	336.00		
			200 - 240m	40.00	8.32		m2	1.00	332.80		
			240 - 280m	40.00	8.35		m2	1.00	334.00		
			280 - 320m	40.00	8.43		m2	1.00	337.20		
			320 - 340.9	20.90	8.50		m2	1.00	177.65		
								TOTAL =	**2,865.65**	2,865.65	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO: del	02-may-2026 al 30-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	HOJA: 3	DE: 4
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	0										
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	0 - 40m		40.00	8.45	0.35	m3	1.00	118.30		
		40 - 80m		40.00	8.40	0.35	m3	1.00	117.60		
		80 - 120m		40.00	8.45	0.35	m3	1.00	118.30		
		120 - 160m		40.00	8.40	0.35	m3	1.00	117.60		
		160 - 200m		40.00	8.40	0.35	m3	1.00	117.60		
		200 - 240m		40.00	8.32	0.35	m3	1.00	116.48		
		240 - 280m		40.00	8.35	0.35	m3	1.00	116.90		
		280 - 320m		40.00	8.43	0.35	m3	1.00	118.02		
		320 - 340.9		20.90	8.50	0.35	m3	1.00	62.18		
								TOTAL =	1,002.98	1,002.98	100.00%
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	0 - 40m		40.00	8.45		m2	1.00	338.00		
		40 - 80m		40.00	8.40		m2	1.00	336.00		
		80 - 120m		40.00	8.45		m2	1.00	338.00		
		120 - 160m		40.00	8.40		m2	1.00	336.00		
		160 - 200m		40.00	8.40		m2	1.00	336.00		
		200 - 240m		40.00	8.32		m2	1.00	332.80		
		240 - 280m		40.00	8.35		m2	1.00	334.00		
		280 - 320m		40.00	8.43		m2	1.00	337.20		
		320 - 340.9		20.90	8.50		m2	1.00	177.65		
								TOTAL =	2,865.65	2,865.65	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO: del	02-may-2026 al 30-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	HOJA: 4	DE: 4
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
		EJE	TRAMO								
0	0										
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.							1.00	1.00		
								TOTAL =	1.00	1.00	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-26 al 30-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	**HOJA:** 1	DE: 4
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

CROQUIS

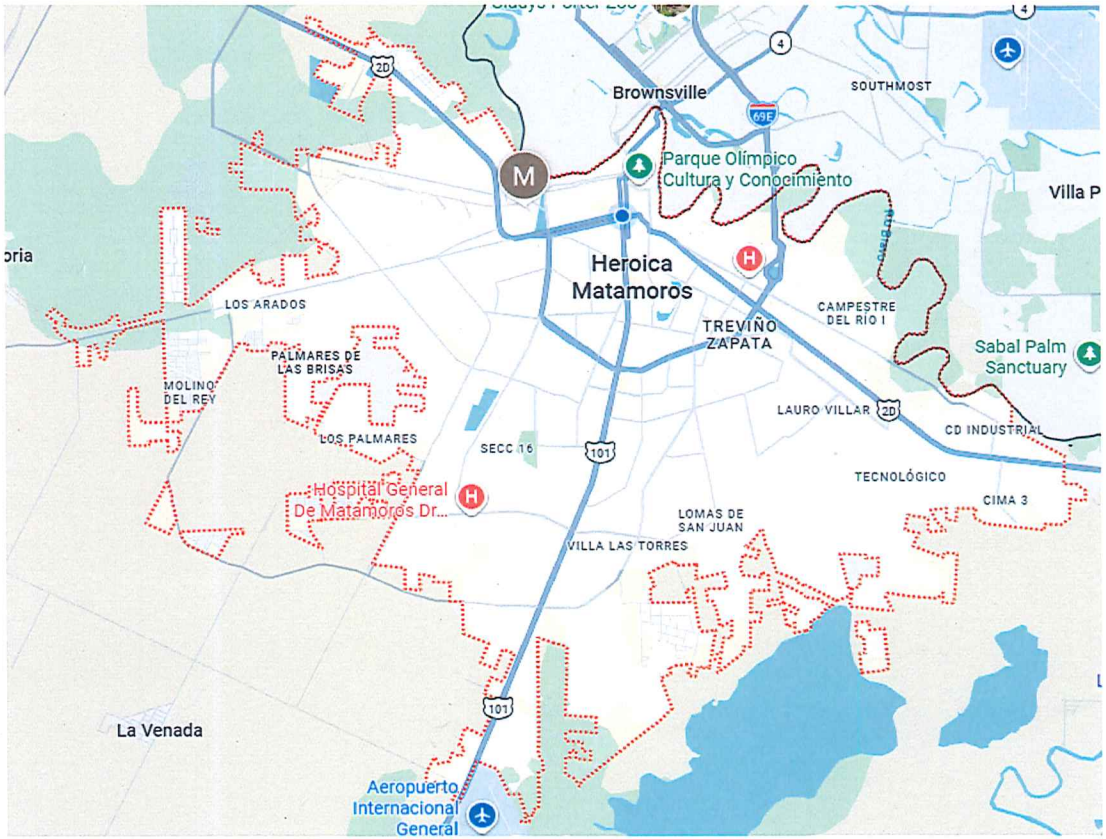

HEROICA MATAMOROS

CONTRATISTA : PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	**SUPERVISO:** ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	**REVISO:** ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-26 al 30-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	**HOJA:** 2	DE: 4
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

CROQUIS

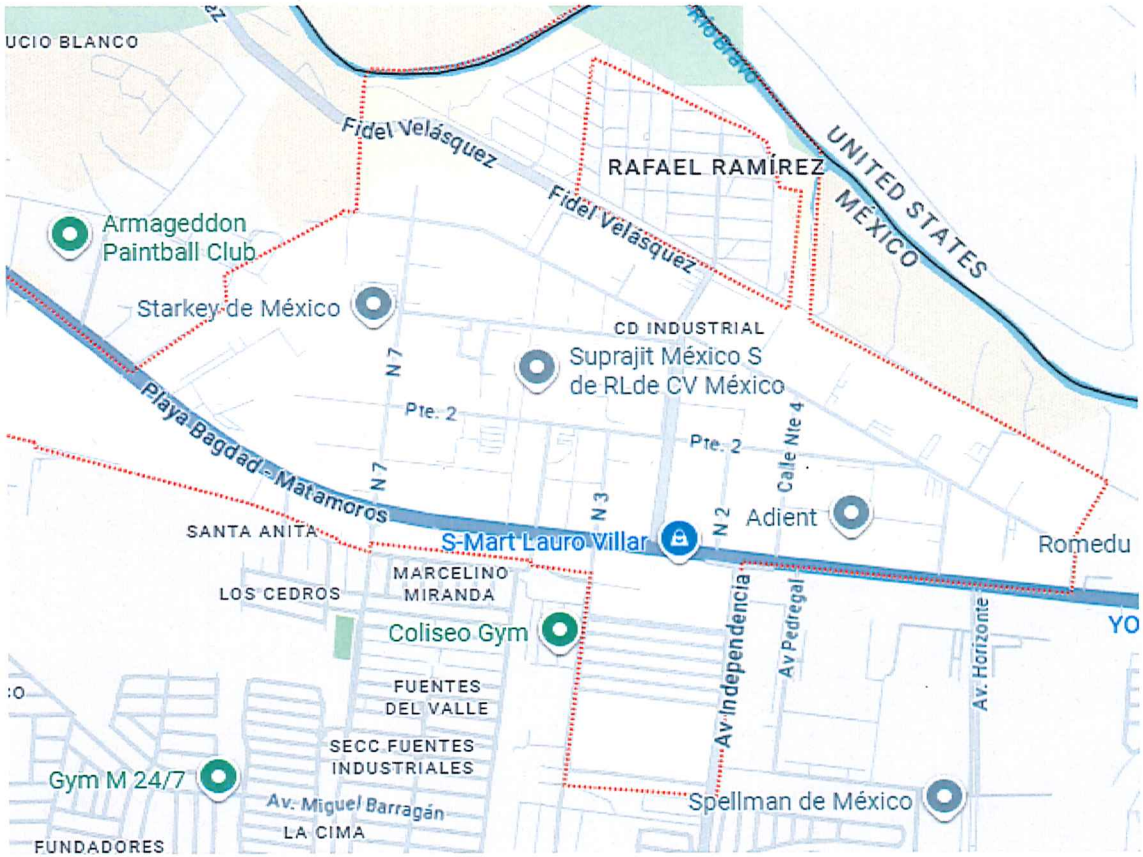

COL. CIUDAD INDUSTRIAL

CONTRATISTA : PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	**SUPERVISO:** ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	**REVISO:** ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-26 al 30-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	**HOJA:** 3	DE: 4
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

CROQUIS

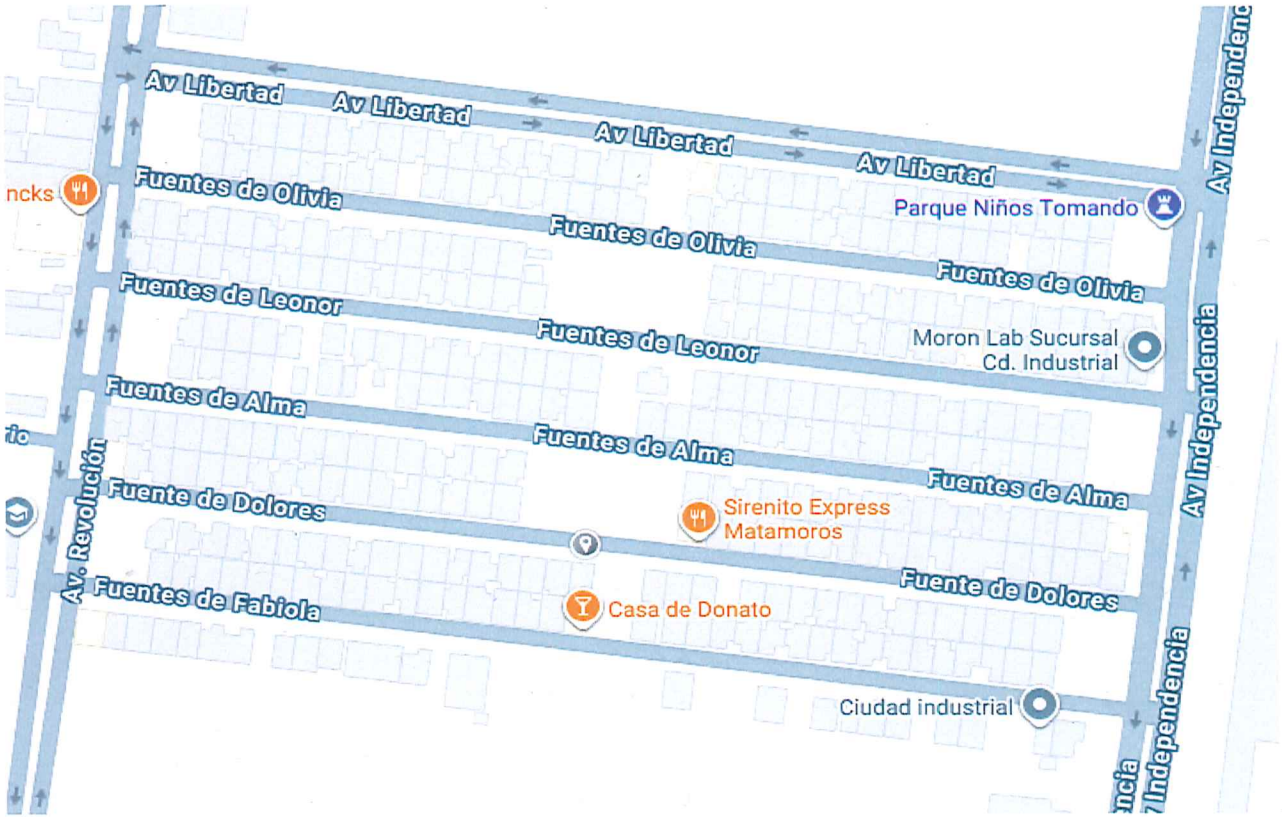

CALLE FUENTES DE DOLORES ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. REVOLUCION

CONTRATISTA :	**SUPERVISO:**	**REVISO:**
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-26 al 30-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	**HOJA:** 4	DE: 4
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

CROQUIS

PLANTA GEOMETRICA



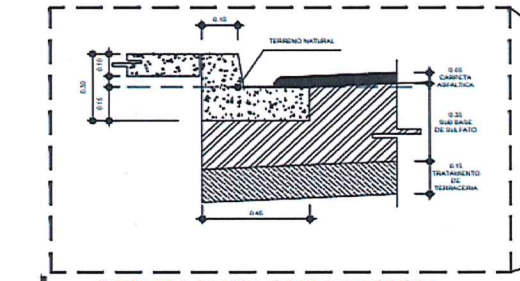

05 DETALLE DE GUARNICION

ESCALA= s/e

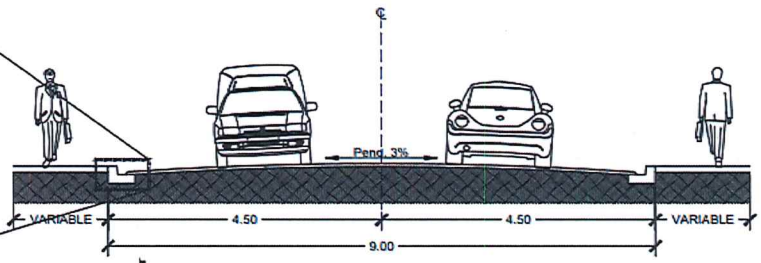

04 SECCION TIPO DE VIALIDAD

ESCALA= s/e

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Proyectos de construcción y Urbanización ALPE

H. MATAMOROS, TAM, A 02 DE MAYO DEL 2026.

ASUNTO: **VOLUMEN EXCEDENTE**

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EN RELACIÓN CON LA OBRA CONTRATADA CON EL MUNICIPIO DE MATAMOROS A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **No. MAT-OP-OD-003/2026**, RELATIVO A: **PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS;** LE SOLICITO LA REVISION Y/O AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES ADICIONALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, LOS CUALES NO CAMBIAN LA FINALIDAD DE LA OBRA, LOS CUALES SERAN INCLUIDOS EN LA ORDEN DE ACTUALIZACION EN LA ESTIMACION 1 (UNO).

SIN MAS DE MOMENTO Y ESPERANDO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA A NUESTRA PETICION QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

Atentamente:

FGMzS.

Francisco de Jesús Martínez Salazar
Representante Legal

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente Colonia del Valle San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 Tel.: + 52 (81) 1094-1420 Móvil: 811-560-5862 http://www.alpeco.mx

Dirección de
Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 01 DE JUNIO DEL 2026

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S.A. DE C.V.
FRANCISCO JESUS MARTINEZ SALAZAR
Presente.-

En relación a la obra denominada PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS al amparo del contrato de Obra Pública No.MAT-OP-OD-003/2026, hago de su conocimiento que esta Direccion a mi cargo autoriza los Volumenes de Obra Excedentes inscritos en la Orden de Actualizacion incluida en la Estimacion No 1 del Referido Contrato para su tramite y pago

Atentamente

ING FERNANDO REQUENA CHAVEZ
Director de Obras Publicas

c.c.p. archivo

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

PERIODO:	HOJA:

ORDEN DE ACTUALIZACION

NUM. CONTRATO:	NUM. DE ESTIMACION:			
MAT-OP-OD-003/2026	1 (UNO)	DEL	02-may-2026	No 1 .
		AL	30-may-2026	DE 1 .

CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	PROGRAMA:
MATAMOROS, TAMPS	MATAMOROS	OBRA DIRECTA

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN				INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA 1a.	PRORROGA 2a.
P.01	Trazo y nivelacion	12.00 m2	$26.75	$321.00	12.00			
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio	45.97 m2	$114.82	$5,278.28	45.97			
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	16.09 m3	$771.63	$12,415.53	16.09			
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	12.00 m2	$630.19	$7,562.28	12.00			
			SUMA =	$25,577.08				

EXPLICACION AMPLIA: (QUE, COMO, DONDE,QUIEN, PORQUE, CUANDO)

SE EJECUTA ESTE VOLUMEN ADICIONAL POR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CAUSAS

* CONDICIONES NATURALES DIS-TINTAS A LAS SUPUESTAS:	X	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES:	
* CAMBIOS DE DISEÑO:		* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO:	
* CAMBIOS DE LOCALIZACION:		* RETRASO DE NUEVOS PAGOS:	
* ERROR INICIAL:		* RECORTE PRESUPUESTAL:	
* OTROS:			

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-26 al 30-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	**HOJA:**	1 DE: 5 .
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS








Recorrido y entrega del inmueble al Contratista

CONTRATISTA :	**SUPERVISO:**	**SUPERVISO:**
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-26 al 30-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	**HOJA:**	2 DE: 5 .
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS





Excavacion del terreno



Trazo y nivelacion del terreno



CONTRATISTA :	**SUPERVISO:**	**SUPERVISO:**
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-26 al 30-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	**HOJA:**	3 DE: 5 .
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS

TRATAMIENTO DE TERRACERIAS



SUMINISTRO Y TENDIDO DE SULFATO DE CALCIO





CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-26 al 30-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	**HOJA:**	4 DE: 5 .
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









Suministro y colocacion de carpeta asfaltica



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-003/2026	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	**PERIODO:** del	02-may-26 al 30-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL	**HOJA:**	5 DE: 5 .
CONTRATISTA:	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS

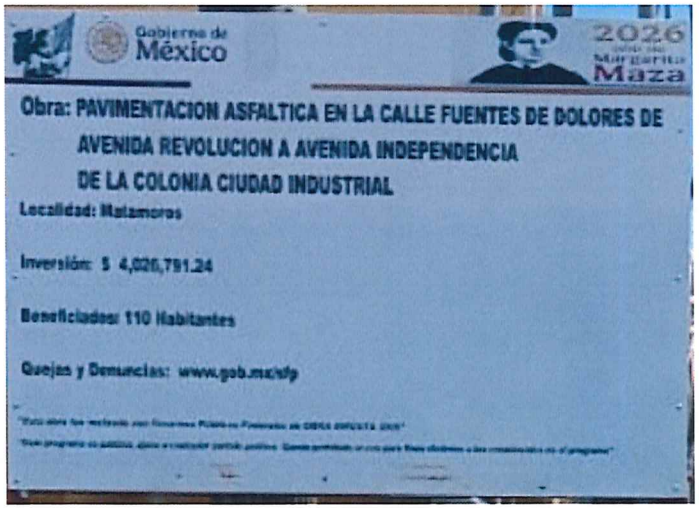





ANUNCIO INFORMATIVO

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

SECRETARIA DE DESRROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

BITACORA DE OBRA

No DE CONTRATO:	OBRA	UBICACION:
MAT-OP-OD-003/2026	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL

Nota No	1	Fecha	1 de mayo de 2026	Tipo	APERTURA

Con esta fecha se abre la presente Bitacora de Obra Publica siendo la Dependencia Contratante El Municipio de Matamoros, Tamaulipas con direccion en Calle Sexta s/n Zona Centro y con Numero de Telefono 868 810 80 00

Mediante contrato de fecha 2 de mayo de 2026 La Dependencia designa como Empresa contratista a PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V. con direccion en AV. VASCONCELOS PTE. No.755 INT.601 ENTRE CALLE RIO LYS Y CALLE y con Numero de Telefono 0

Esta Bitacora forma parte del Contrato MAT-OP-OD-003/2026 Con un Importe de $4,026,791.24 inlcuido el Impuesto al Valor Agregado y con un Periodo de Ejecucion de 90 dias habiles con Fecha de inicio el 2 de mayo de 2026 y con Fecha de Terminacion el 30 de julio de 2026

Los trabajos a ejecutar por parte del Contratista consisten en:
PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Ubicados en CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL del Municipio de Matamoros, Tam.

Nota No	2	Fecha	2 de mayo de 2026	Tipo	VALIDACION

RESIDENTE

La Contratante El Municipio de Matamoros, Tam. Designa al (la) C. ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ como Supervisor de la Obra quien fungira como representante del Municipio ante el Contratista y sera la persona Responsable directa de la Supervision, Vigilancia, Control y Revision de los trabajos con Oficio de Fecha 2 de mayo de 2026 emitido en cumplimiento del Articulo 53 de la LOPSRM y/o del Articulo 61 de la LOPSRM para el el Estado de Tamaulipas

SUPERINTENDENTE

La Contratista PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.
Designa al (la) C. ING. EMILIO MORALES BARAJAS como Superintendente de la Obra, y quien fungira como Representante de la Contratista ante la Contratante y a quien le otorga completa Facultad para oir y recibir toda clase de Notificaciones relacionadas con los trabajos, asi como, para la toma de desiciones requeridos en el cumplimiento del contrato

NOTAS DE BITACORA

Tanto el Residente Como el Superintendente acuerdan que la Bitacora de Obra estara disponible y se podran asentar Notas en ella a cualquier hora del dia y durante el tiempo que el contrato y la obra tenga vigencia, Tambien acuerdan ambas partes que se dara un plazo de tres dias habiles para la firma de cualquier nota y pasado este plazo se dara por aceptada la nota, asi mismo por ninguna causa se modificara una Nota y de ser necesario se debera asentar una Nota Aclaratoria al respecto

ESTIMACIONES

Las estimaciones seran con un periodo no mayor a 30 dias calendario y se deberan presentar dentro de los seis dias naturales despues de la fecha del corte, la residendia contará con un periodo no mayor a quince dias naturales para efectuar la revision y autorizacion de las mismas a partir de la fecha de su entrega completa en los terminos del Articulo 132 del RLOPSRM

CONTRATISTA:	SUPERVISOR	JEFE DEL DPTO DE SUPERVISION
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

SECRETARIA DE DESRROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

BITACORA DE OBRA

No DE CONTRATO:	OBRA	UBICACION:
MAT-OP-OD-003/2026	PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	CALLE FUENTES DE DOLORES COL. CD INDUSTRIAL

Nota No	3	Fecha	2 de mayo de 2026	Tipo	INICIO DE LOS TRABAJOS

Con esta fecha se reunen en el sitio de los trabajos el Residente y Superintendente de la obra con la finalidad de hacer entrega fisica del bien inmueble y declarar formalmente iniciados los trabajos motivo de este contrato.

Nota No	4	Fecha	4 de mayo de 2026	Tipo	PROCESO

En esta fecha se inician los trabajos de trazo y nivelacion del terreno

Nota No	5	Fecha	5 de mayo de 2026	Tipo	PROCESO

Con esta fecha el contratista inicia con trabajos de excavacion de terreno en apertura de caja tomando en cuenta la conservacion de guarniciones existentes

A su vez realizan trabajos de carga y acarreo de material producto de excavacion fuera de la obra

Nota No	6	Fecha	9 de mayo de 2026	Tipo	PROCESO

En esta fecha el contratista realiza trabajos de tratamiento de terraceria en el terreno

Nota No	7	Fecha	14 de mayo de 2026	Tipo	PROCESO

Se hace el suministro de sulfato de calcio para construccion de base.

El material llega con humedad por lo que se recomendo esperar el tiempo correspondiente para iniciar el tendido del mismo

Nota No	8	Fecha	19 de mayo de 2026	Tipo	PROCESO

Se inician trabajos de tendido de sulfato de calcio sobre el terreno.

Nota No	9	Fecha	21 de mayo de 2026	Tipo	PROCESO

Se realizan trabajos de afine de sulfato de calcio y tambien trabajos de riego y compactacion

Nota No	10	Fecha	23 de mayo de 2026	Tipo	PROCESO

Asiste el personal de laboratorio para la realizacion de pruebas correspondientes en base de sulfato

Nota No	11	Fecha	25 de mayo de 2026	Tipo	PROCESO

Se realizan trabajos de colocacion de carpeta asfaltica ubicando los pozos de visita existentes

Nota No	12	Fecha	27 de mayo de 2026	Tipo	PROCESO

Se realiza recorrido con el contratista y se hacen obsevaciones de trabajos realizados

CONTRATISTA:	SUPERVISOR	JEFE DEL DPTO DE SUPERVISION
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.	ING.EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU

Proyectos de construcción y Urbanización ALPE

H. MATAMOROS TAMAULIPAS A 02 DE MAYO DEL 2026

ASUNTO: **DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE**

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESENTE. -

EN REFERANCIA AL CONTRATO: **No. MAT-OP-OD-003/2026**, RELATIVO A: **PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS;** SE DESIGNA COMO SUPERINTENDENTE AL ***ING. EMILIO MORALES BARAJAS*** TENIENDO LAS FACULTADES DE FIRMAR OFICIOS, ESTIMACIONES, BITACORA DE OBRA Y DEMAS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

Atentamente:

FGMzS.

Francisco de Jesús Martínez Salazar
Representante Legal

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente Colonia del Valle San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 Tel.: + 52 (81) 1094-1420 Móvil: 811-560-5862 http://www.alpeco.mx

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES

CARRETERA: DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA INDUSTRIAL

EJECUTORA: PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.

CIUDAD: MUNICIPO H. MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No.:** PCU/3331-1357

REFERENCIAS:M-MMP.1/01/03 **FECHA INFORME:** 9 de mayo de 2026

ESPESOR: 15.0 cms. Compactación [X] Recompactación [ ]

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 95.0 CAPA ENSAYADA: TERRENO NATURAL(MEJ. CON CAL HIDRATADA)

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
		CALLE FUENTES DE DOLORES						
3258	-	IZQUIERDO	16.0	17.5	19.0	1691	1760	96.1
3259	-	CENTRO	15.0	16.8	19.0	1672	1760	95.0
3260	-	DERECHO	15.0	16.8	19.0	1686	1760	95.8

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES
CARRETERA: DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA INDUSTRIAL
EJECUTORA: PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V.
CIUDAD: MUNICIPO H. MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No.:** PCU/3332-1357
REFERENCIAS:M-MMP.1/01/03 **FECHA INFORME:** 23 de mayo de 2026

ESPESOR: 35.0 cms. Compactación [X] Recompactación [ ]
GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 95.0 CAPA ENSAYADA: **SUB-BASE (SULFATO DE CALCIO)**

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
		CALLE FUENTES DE DOLORES						
3261	-	DERECHO	35.0	36.3	39.0	1355	1410	96.1
3262	-	CENTRO	35.0	37.1	39.0	1351	1410	95.8
3263	-	IZQUIERDO	35.0	37.1	39.0	1340	1410	95.0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE GRADO DE COMPACTACION Y PERMEABILIDAD EN CARPETA ASFALTICA

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES

TRAMO: DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA INDUSTRIAL

SUB-TRAMO: MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No:** PCU/3333-1357

EJECUTORA: PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE S.A. DE C.V. **FECHA DE INFORME:** 25 de mayo de 2026

DATOS DE PROYECTO

GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO POR LA CAPA ENSAYADA **95.0%** **P.V.M.M.**

ESPESOR DE PROYECTO: **5.0 Cms.**

No Ensaye	Franja	Ubicación	Espesor Cms.	Peso Volumetrico		% De Compactacion	% de Permeabilidad
				Del Lugar	Maximo		
	CALLE FUENTES DE DOLORES						
3264	IZQUIERDA	DERECHO	5.00	2266	2358	96.1	0.00%
3265	CENTRO	CENTRO	5.01	2259	2358	95.8	0.00%
3266	DERECHO	IZQUIERDO	5.08	2240	2358	95.0	0.00%
Referencias: N-CMT-CAR-1-04-006-09-CAL - N-CMT-4-05-00-002/11							
	N-CTR-CAR-1-01-009/00						

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

El GRADO DE COMPACTACION,ESPESORES Y PERMEABILIDAD OBTENIDOS EN LA CAPA ENSAYADA,CUMPLE DE ACUERDO A LOS MINIMOS ESPECIFICADOS

EL LABORATORISTA	VO.BO.
Lab. Armando Castiilo Piña	Informacion Tecnica en Obras S.A. de C.V.

Calle Caracol No 142 Colonia Acuario 2001 Tel.868031894 H.Matamoros Tamaulipas

Proyectos de construcción y Urbanización ALPE

H. MATAMOROS TAMAULIPAS A 02 DE MAYO DEL 2026

ASUNTO: **INICIO**

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESENTE. -

EN REFERENCIA AL CONTRATO: **No. MAT-OP-OD-003/2026**, RELATIVO A: **PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS;** LE INFORMO QUE CON FECHA 02 DE MAYO DEL 2026, SE INICIARAN LOS TRABAJOS EN OBRA.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO LAS ATENCIONES PRESTADAS, QUEDO DE USTED.

Atentamente:

FCO. MTZ S.

Francisco de Jesús Martínez Salazar
Representante Legal

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente Colonia del Valle San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 Tel.: + 52 (81) 1094-1420 Móvil: 811-560-5862 http://www.alpeco.mx

Proyectos de construcción y Urbanización ALPE

H. MATAMOROS, TAM, A 02 DE MAYO DEL 2026.

ASUNTO: **RENUNCIA A ANTICIPO**

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **No. MAT-OP-OD-003/2026,** RELATIVO A LA OBRA: **PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE FUENTES DE DOLORES DE AVENIDA REVOLUCION A AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CIUDAD INDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS;** SE RENUNCIA AL ANTICIPO DECLARADO EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES, QUEDO DE USTED.

Atentamente:

FCO MTZ S.

Francisco de Jesús Martínez Salazar
Representante Legal

PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE SA DE CV
Av. Vasconcelos 755 Poniente Colonia del Valle San Pedro Garza García, N.L. México C.P. 66220
Tel.: + 52 (81) 1356-5536 Tel.: + 52 (81) 1094-1420 Móvil: 811-560-5862 http://www.alpeco.mx
