Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-2026 al 31-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	**HOJA:** 1	**DE:** 2
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
P.01	Trazo y nivelacion	m2	$ 24.05	1,428.57	0.00	1,437.75	1,437.75	9.18	34,577.89
P.02	Excavacion en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40mts.	m3	$ 108.59	571.43	0.00	718.88	718.88	147.45	78,063.18
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavacion a limites de la ciudad	m3	$ 325.88	742.86	0.00	934.54	934.54	191.68	304,547.90
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio	m2	$ 110.59	1,428.57	0.00	1,437.75	1,437.75	9.18	159,000.77
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Pza	$ 6,388.46	2.00	0.00	5.00	5.00	3.00	31,942.30
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Pza	$ 12,583.01	2.00	0.00	6.00	6.00	4.00	75,498.06
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	$ 899.82	317.46	0.00	335.70	335.70	18.24	302,069.57
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	$ 733.97	478.57	0.00	481.65	481.65	3.08	353,516.65
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	$ 567.77	1,301.59	0.00	1,303.39	1,303.39	1.80	740,025.74
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	Pza	$ 7,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	Pza	$ 10,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00		
								ESTA HOJA $	**2,079,242.06**
								ACUMULADO $	**2,079,242.06**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-2026 al 31-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES 2	**HOJA:**	**DE:**
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	P.U.	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
				PRESUPUESTO	ACUM. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	EXCEDENTE	
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	$ 512.07	254.10	0.00	0.00	0.00		
P.14	Suministro y colocacion de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	Pza	$ 5,815.37	1.00	0.00	1.00	1.00		5,815.37
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTC, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Pza	$ 7,820.83	4.00	0.00	0.00	0.00		
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Pza	$ 4,942.96	4.00	0.00	0.00	0.00		
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ml	$ 105.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	$ 253.63	66.15	0.00	0.00	0.00		
0	0	0.00	$ -	0.00	0.00	0.00	0.00		
								ESTA HOJA $	**5,815.37**
								ACUMULADO $	**2,085,057.43**
								ESTA ESTIMACION $	**2,085,057.43**

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO :	REVISO :
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINITRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	01-may-2026 al 31-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	HOJA: 1	DE: 3
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	0										
P.01	Trazo y nivelacion	Benitos Velez - Las Torres		75.85	9.00		m2	1.00	682.65		
		Las Torres - Tucan		83.90	9.00		m2	1.00	755.10		
								TOTAL =	1,437.75	1,437.75	100.00%
P.02	Excavacion en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40mts.	Benitos Velez - Las Torres		75.85	9.00	0.50	m3	1.00	341.33		
		Las Torres - Tucan		83.90	9.00	0.50	m2	1.00	377.55		
								TOTAL =	718.88	718.88	100.00%
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavacion a limites de la ciudad	Benitos Velez - Las Torres		75.85	9.00	0.50	m3	1.30	443.72		
		Las Torres - Tucan		83.90	9.00	0.50	m2	1.30	490.82		
								TOTAL =	934.54	934.54	100.00%
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio	Benitos Velez - Las Torres		75.85	9.00		m2	1.00	682.65		
		Las Torres - Tucan		83.90	9.00		m2	1.00	755.10		
								TOTAL =	1,437.75	1,437.75	100.00%
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Benitos Velez - Las Torres					Pza	4.00	4.00		
		Las Torres - Tucan					Pza	1.00	1.00		
								TOTAL =	5.00	5.00	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	01-may-2026 al 31-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	HOJA: 2	DE: 3
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	0										
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	Benitos Velez - Las Torres					Pza	5.00	5.00		
		Las Torres - Tucan					Pza	1.00	1.00		
								TOTAL =	6.00	6.00	100.00%
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	Benitos Velez - Las Torres		75.85			ml	2.00	151.70		
		Las Torres - Tucan		83.90			ml	2.00	167.80		
		Benitos Velez (aproche)		8.10			ml	1.00	8.10		
		Tucan (aproche)		8.10			ml	1.00	8.10		
								TOTAL =	335.70	335.70	100.00%
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	Benitos Velez - Las Torres		75.85	9.00	0.20	m3		136.53		
		Benitos Velez - Las Torres		75.85	8.10	0.15	m3		92.16		
		Las Torres - Tucan		83.90	9.00	0.20	m3		151.02		
		Las Torres - Tucan		83.90	8.10	0.15	m3		101.94		
								TOTAL =	481.65	481.65	100.00%
P.10	Sumiristro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	Benitos Velez - Las Torres		75.45	8.20		m2		618.69		
		Las Torres - Tucan		83.50	8.20		m2		684.70		
								TOTAL =	1,303.39	1,303.39	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	01-may-2026 al 31-may-2026
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	HOJA: 3	DE: 3
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION EJE	LOCALIZACION TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO Y/O PESO	UNIDAD	CANTIDAD	ESTE VOLUMEN	VOLUMEN ACUMULADO	% AVANCES
0	0										
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.						Pza	1.00	1.00		
								TOTAL =	1.00	1.00	100.00%

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	HOJA: 1	DE: 4
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

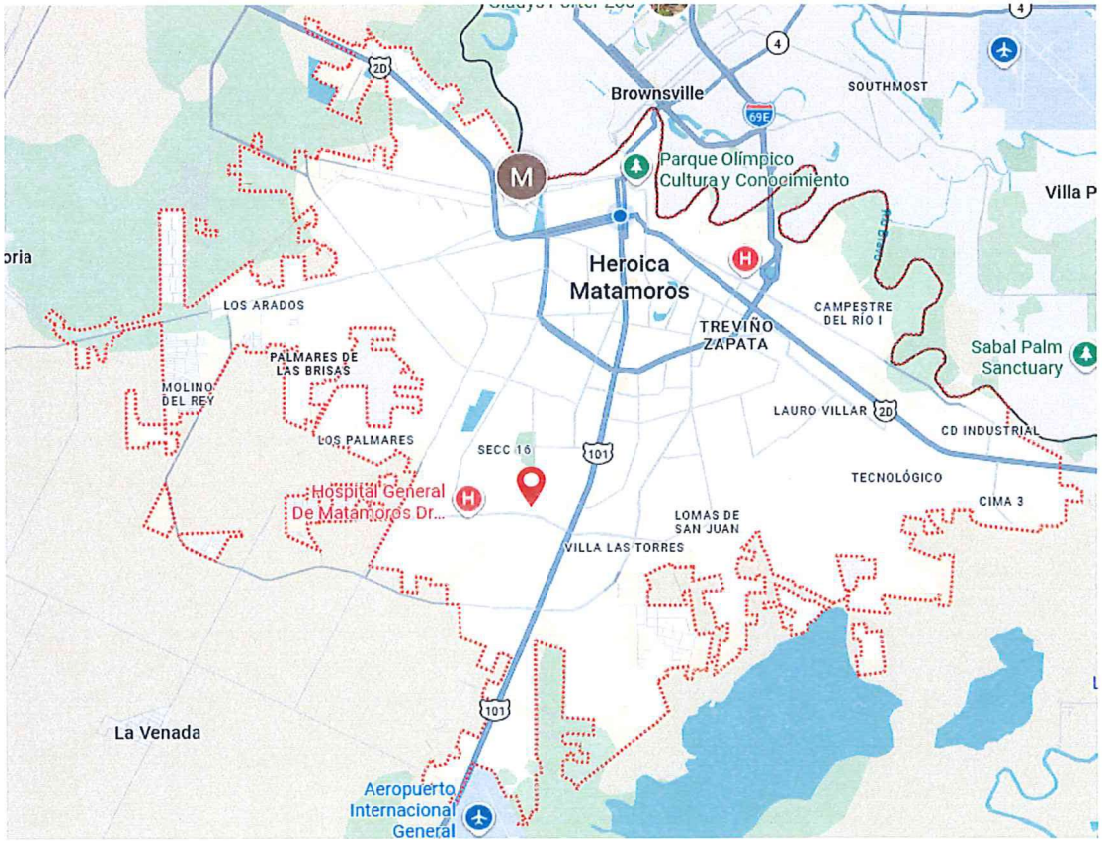

HEROICA MATAMOROS

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	HOJA: 2	DE: 4
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

CROQUIS



COL. LAS TORRES

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	HOJA: 3	DE: 4
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

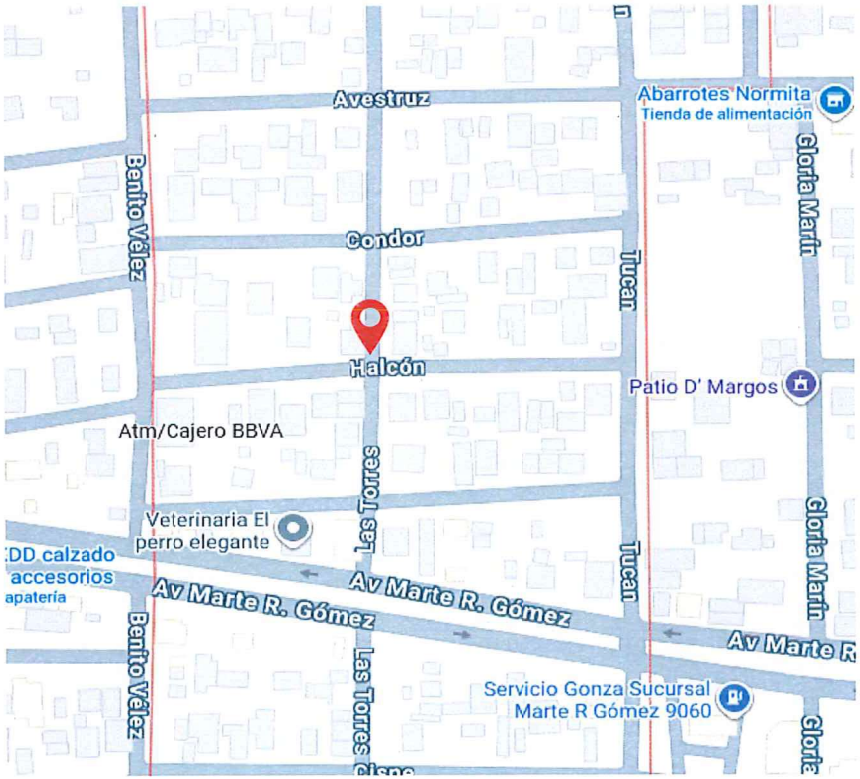

CALLE HALCÓN

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	HOJA: 4	DE: 4
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

CROQUIS

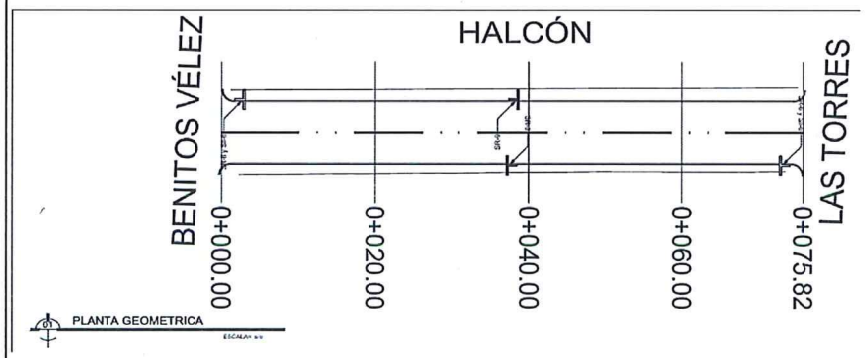

PLANTA GEOMETRICA

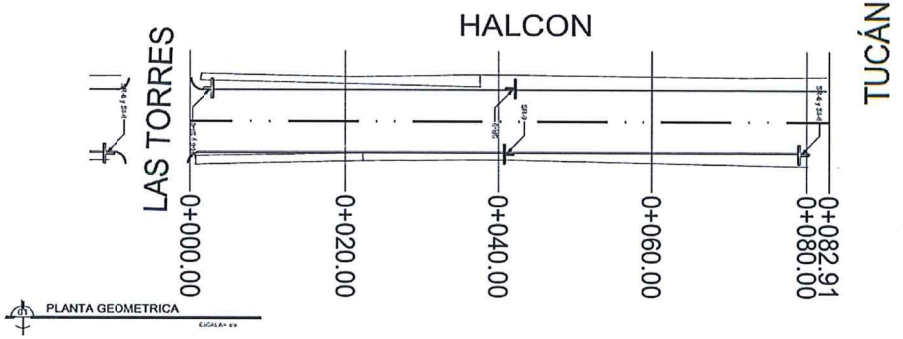

PLANTA GEOMETRICA

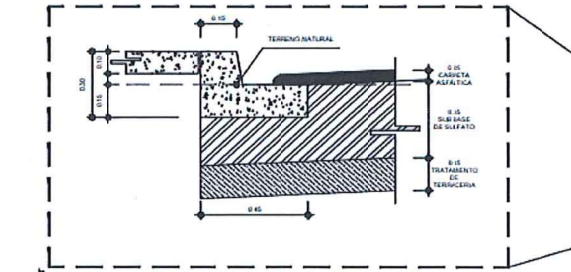

05 DETALLE DE GUARNICION

ESCALA= s/e

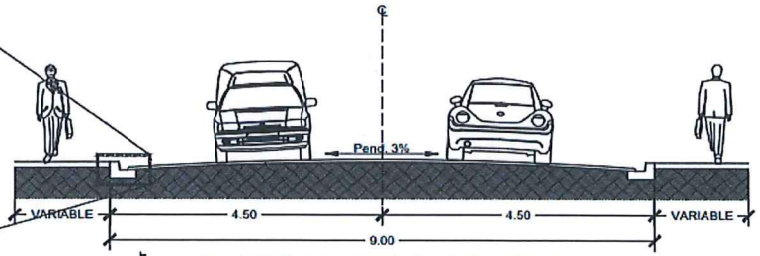

04 SECCION TIPO DE VIALIDAD

ESCALA= s/e

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	**HOJA:**	1 DE: 10 .
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS

Recorrido y entrega del inmueble al Contratista





Calle Halcon de calle Tucan - Av. Las Torres



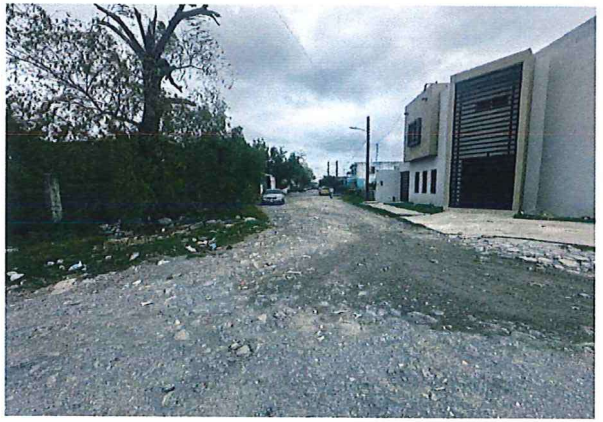

Calle Halcon de calle Benito Velez - Av. Las Torres

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
CREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	**HOJA:**	2 DE: 10 .
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









Trabajos de trazo y nivelacion

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	**HOJA:**	3 DE: 10 .
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









Excavacion del terreno



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	**HOJA:**	4 DE: 10 .
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS









Tratamiento de Terracerias

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	**HOJA:**	5 DE: 10 .
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS



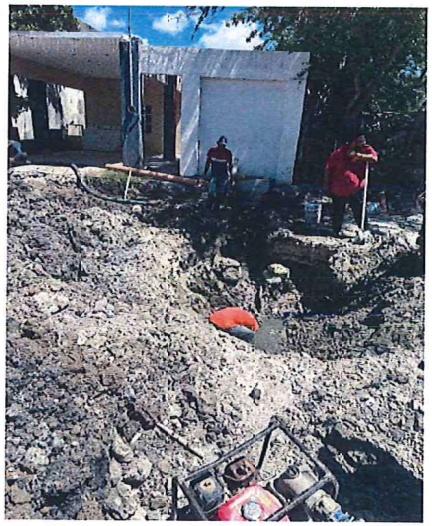







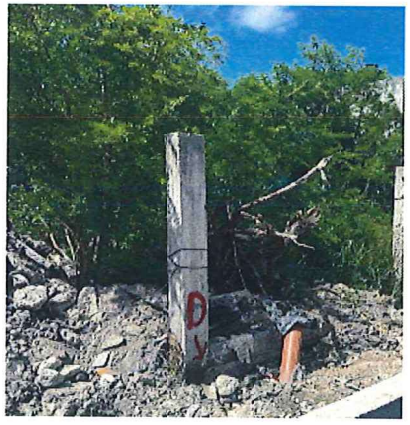

CONSTRUCCION DE TOMAS Y DESCARGAS



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	**HOJA:**	6 DE: 10 .
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS







Tendido de Sulfato de Calcio



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	**HOJA:**	7 DE: 10 .
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS











Construccion de Guarnicion de Concreto



CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	**HOJA:**	8 DE: 10 .
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS

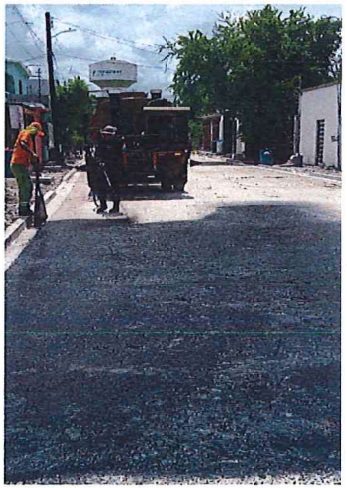







CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	HOJA:	9 DE: 10 .
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS

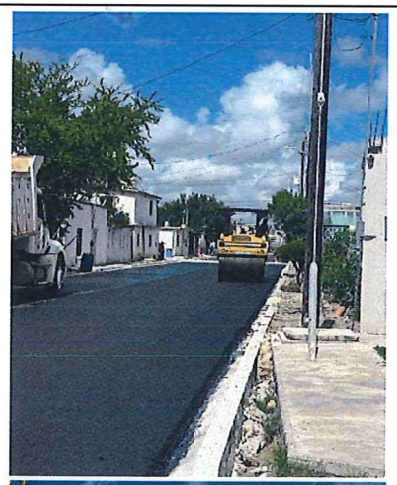





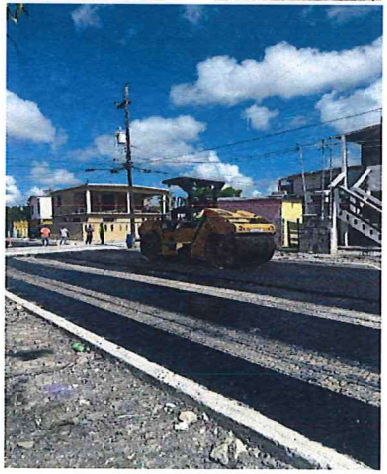





TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	**ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	**PERIODO:** del	01-may-26 al 31-may-26
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	**FECHA:**	1 de junio de 2026
UBICACIÓN:	CALLE HALCON COL. LAS TORRES	**HOJA:**	10 DE: 10 .
CONTRATISTA:	COREFAMEX, S.A. DE C.V.		

FOTOGRAFIAS





Anuncio informativo

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	SUPERVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

PERIODO:	HOJA:
DEL 01-may-2026 AL 31-may-2026	No 1 DE 2

ORDEN DE ACTUALIZACION

NUM. CONTRATO:	NUM. DE ESTIMACION:
MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	1 (UNO)

CONTRATISTA: COREFAMEX, S.A. DE C.V.

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

LOCALIDAD: H. MATAMOROS, TAMPS | MUNICIPIO: MATAMOROS | PROGRAMA: REVUPE

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN				INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA 1a.	PRORROGA 2a.
P.01	Trazo y nivelacion	9.18 m2	$24.05	$220.78	9.18			
P.02	Excavacion en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40mts.	147.45 m3	$108.59	$16,011.60	147.45			
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavacion a limites de la ciudad	191.68 m3	$325.88	$62,464.68	191.68			
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su FVSM a nivel subrasante incluye: escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio	9.18 m2	$110.59	$1,015.22	9.18			
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	3.00 Pza	$6,388.46	$19,165.38	3.00			
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6' con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	4.00 Pza	$12,583.01	$50,332.04	4.00			
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	18.24 ml	$899.82	$16,412.72	18.24			
			SUMA =	$165,622.41				

EXPLICACION AMPLIA: (QUE, COMO, DONDE,QUIEN, PORQUE, CUANDO)

SE EJECUTA ESTE VOLUMEN ADICIONAL POR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CAUSAS

* CONDICIONES NATURALES DIS-TINTAS A LAS SUPUESTAS:	X	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES:	
* CAMBIOS DE DISEÑO:		* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO:	
* CAMBIOS DE LOCALIZACION:		* RETRASO DE NUEVOS PAGOS:	
* ERROR INICIAL:		* RECORTE PRESUPUESTAL:	
* OTROS:			

CONTRATISTA:	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS

PERIODO:	HOJA:

ORDEN DE ACTUALIZACION

NUM. CONTRATO:	NUM. DE ESTIMACION:			
MAT-OP-REVUPE-013/2025-26	1 (UNO)	DEL	01-may-2026	No 2 .
		AL	31-may-2026	DE 2 .

CONTRATISTA: **COREFAMEX, S.A. DE C.V.**

OBRA: **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**

LOCALIDAD: H. MATAMOROS, TAMPS | MUNICIPIO: MATAMOROS | PROGRAMA: **REVUPE**

CONCEPTO (S), PRECIO (S), QUE SE MODIFICA (N) O CUYO PERIODO DE EJECUCION SE AMPLIA

CLAVE	CONCEPTO	NUEVOS CONCEPTOS O INCREMENTOS DE VOLUMEN				INCREMENTO AL PERIODO DE EJECUCION		
		VOL. ADICIONAL QUE SE AUTOR.	P.U. ULTIMO AUTORIZADO	COSTO ESTIMADO	VOL. ADICIONAL ACUM. AUT.	FECHA TERM. CONTRATADA	PRORROGA 1a.	PRORROGA 2a.
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	3.08 m3	$733.97	$2,260.63	3.08 ✓			
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de	1.80 m2	$567.77	$1,021.99	1.80 ✓			
			ESTA HOJA	$3,282.61				
			ACUMULADO	$168,905.02				

EXPLICACION AMPLIA: (QUE COMO, DONDE,QUIEN, PORQUE, CUANDO)

SE EJECUTA ESTE VOLUMEN ADICIONAL POR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CAUSAS

* CONDICIONES NATURALES DIS-TINTAS A LAS SUPUESTAS:	X	* RETRASO EN LA ENTREGA DE PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES:	
* CAMBIOS DE DISEÑO:		* RETRASO EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y/O EQUIPO:	
* CAMBIOS DE LOCALIZACION:		* RETRASO DE NUEVOS PAGOS:	
* ERROR INICIAL:		* RECORTE PRESUPUESTAL:	
* OTROS:			

CONTRATISTA :	SUPERVISO:	REVISO:	REVISO:
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	ING. EDGAR ADRIAN PAREDES RMZ SUPERVISOR DE OBRA	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA

Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UNIDAD LOCAL DE OBRA : MUNICIPIO DE MATAMOROS

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA : COREFAMEX, S.A. DE C.V.

CONTRATO : MAT-OP-REVUPE-013/2025-26

OBJETO DEL CONTRATO : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

LUGAR

ESTADO : TAMAULIPAS

MUNICIPIO : MATAMOROS

CALLE : HALCON

NÚMERO EXTERIOR :

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 87396

COLONIA : LAS TORRES

PERIODO : DEL 01/05/26 AL 29/07/26

MONTO DEL CONTRATO : 2,114,102.18 MXN

MAT-OP-REVUPE-013/2025-26

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

No. de nota: 1 **Fecha y hora:** 30/04/26, 10:03 AM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Centro de Trabajo : OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMPS

Teléfono : 8688108000

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : COREFAMEX, S.A. DE C.V.

Domicilio : Calle : URUAPAN No. Ext. 36 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MAT-OP-REVUPE-013/2025-26 **Proyecto :** REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE

Plazo : 90 Días naturales. **Fecha de Inicio :** 01/05/26 **Fecha de Término :** 29/07/26

Monto : 2,114,102.18 MXN

Objeto del contrato : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN

Latitud : 25.8280759 **Longitud :** -97.5215755

Calle : HALCON **Número Interior :** HALCON

Número Exterior : **C.P. :** 87396

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : LAS TORRES **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CÉDULA PROFESIONAL

Domicilio : Calle : 12 No. Ext. 13 No. Int. SN Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Correo Electrónico : natty_628@hotmail.com

Residente

Nombre : EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : PRIVADA 2 No. Ext. 7 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Correo Electrónico : aparedez9501@gmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 31 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.
De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

Firmada por: NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 30/04/26, 10:11 AM

Tipo de nota: ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.

Contenido

CON FECHA 01/05/2026 EL RESIDENTE ESTATAL EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, REPRESENTANTE DEL (LA) MUNICIPIO DE MATAMOROS, HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA UBICADO EN CALLE: HALCON, COLONIA: LAS TORRES, DELEGACIÓN / MUNICIPIO: MATAMOROS, ESTADO: TAMAULIPAS, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS, C.P.: 87396 SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA QUIEN RECIBE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 05/05/26, 02:05 PM

Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 01/05/2026 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL CONSTA DE: CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PLANOS AUTORIZADOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 05/05/26, 02:07 PM

Tipo de nota: ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.

Contenido

CON FECHA 04/05/2026 EL RESIDENTE ESTATAL EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, REPRESENTANTE DEL (LA) MUNICIPIO DE MATAMOROS, HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA UBICADO EN CALLE: HALCON, COLONIA: LAS TORRES, DELEGACIÓN / MUNICIPIO: MATAMOROS, ESTADO: TAMAULIPAS, LOCALIDAD: HEROICA MATAMOROS, C.P.: 87396 SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL SUPERINTENDENTE NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA QUIEN RECIBE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 05/05/26, 02:13 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 05/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: INICIO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRASTISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HALCON DE CALLE BENITO VELEZ A CALLE TUCAN .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 07/05/26, 08:03 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS FISICOS , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA DE LA CALLE HALCON DE CALLE TUCAN A AV LAS TORRES .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 12/05/26, 08:03 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 01/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA EN LA CALLE HALCON DE TUCAN A AV LAS TORRES.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 12/05/26, 08:14 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EXCAVACION, CARGA Y ACARREO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INICIAN TRABAJOS DE EXCAVACION, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA DE LA CALLE HALCON DE AV LAS TORRES A CALLE BENITO VELEZ .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 12/05/26, 08:28 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 11/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CONSTRUCCION DE SULFATO DE CALCIO - TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO EN LA CALLE HALCON DE CALLE TUCAN A AV LAS TORRES..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 14/05/26, 08:01 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CONSTRUCCION DE SULFATO DE CALCIO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA EL TENDIDO DE SULFATO DE CALCIO EN LA CALLE HALCON DE AV LAS TORRES A CALLE BENITO VELEZ .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 20/05/26, 10:07 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: AFINE DE SULFATO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE AFINE DE SULFATO DE CALCIO EN LA CALLE HALCON DE CALLE TUCAN A CALLE BENITO VELEZ..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 20/05/26, 10:13 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS DE GUARNICIONES DE CONCRETO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INICIAN TRABAJOS PARA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO. TRABAJOS COMO TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ARMADO DE CIMBRA Y COLADO DE CONCRETO. ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA CALLE HALCON DE AV LAS TORRES A CALLE BENITO VELEZ.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 10/06/26, 09:11 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 22/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO CALLE HALCON DE CALLE TUCAN A AV LAS TORRES , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INICIAN TRABAJOS PARA CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO. TRABAJOS COMO TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ARMADO DE CIMBRA Y COLADO DE CONCRETO. ESTOS TRABAJOS SE REALIZAN EN LA CALLE HALCON DE CALLE TUCAN A AV LAS TORRES .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 14 Fecha y Hora: 10/06/26, 01:19 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 10/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: VISITA DE PERSONAL DE LABORATORIO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA INFORMA LA VISITA DE PERSONAL DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS CORRESPONDIENTES AL TRATAMIENTO DE TERRACERIA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 15 Fecha y Hora: 10/06/26, 01:30 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: VISITA DE LABORATORIO EN OBRA , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA INFORMA LA VISITA DE PERSONAL DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 16 Fecha y Hora: 10/06/26, 01:37 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/05/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA , SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE HALCON DE CALLE TUCAN A CALLE BENITO VELEZ.
ASI MISMO POR LA TARDE SE PRESENTA PERSONAL DE LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA CARPETA ASFALTICA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 17 Fecha y Hora: 12/06/26, 07:28 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL 01/06/2026 LOS NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 1, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, ESTADO DE CUENTA, FOTOGRAFÍAS, NÚMEROS GENERADORES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 18 Fecha y Hora: 12/06/26, 07:31 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A NÚMEROS GENERADORES.

Contenido

CON FECHA 02/06/2026 SE APRUEBAN LOS NÚMEROS GENERADORES N°. 1 NORMAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 19 Fecha y Hora: 12/06/26, 07:36 AM

Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

CON FECHA 01/06/2026 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026, POR UN MONTO DE 2,085,057.43 DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE 43/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN: FACTURA
ESTMACION
GENERADORES
CROQUIS
FOTOGRAFIAS
ORDEN DE ACTUALIZACION
BITACORA DE OBRA
LICENCIA DE CONSTRUCCION
OFICIO DE INICIO DE OBRA
OFICIO DE SUPERINTENDENTE
REPORTES DE LABORATORIOS
SOLICITUD DE VOL, EXCEDENTES .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 20 Fecha y Hora: 12/06/26, 07:40 AM

Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 02/06/2026, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026 POR UN IMPORTE DE:
2,085,057.43 DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE 43/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 99.00 %
FINANCIERO: $ 2,085,057.43 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 98.63 %

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

Número de Nota: 21 Fecha y Hora: 12/06/26, 07:49 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 08/06/2026 EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CORRECCION DE NOTA N.7, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN RELACION CON LA NOTA N.7 HUBO UN ERROR AL CAPTURAR LA FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES. SIENDO LA FECHA CORRECTA EL DIA 08/05/2026.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: EDGAR ADRIAN PAREDES RAMIREZ (RESIDENTE)

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**

H. MATAMOROS, TAM, A 01 DE MAYO DEL 2026

ASUNTO: **INICIO DE OBRA**

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EN RELACIÓN CON LA OBRA CONTRATADA CON EL MUNICIPIO DE MATAMOROS A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **No. MAT-OP-REVUPE-013/2025-26**, RELATIVO A **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**; CON ESTA FECHA SE DAN POR INICIADOS LOS TRABAJOS.

SIN MAS DE MOMENTO Y ESPERANDO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA A NUESTRA PETICION QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

COREFAMEX S.A. DE C.V.
Francisco Rincón No. Ext. 73 No. Int. 1 Ex. Ej. Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. Tel: (868)149 00 15

H. MATAMOROS, TAM, A 01 DE MAYO DEL 2026

ASUNTO: **SUPERINTENDENTE DE OBRA**

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A UD. PARA INFORMAR QUE LA ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA, SERA EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA DENOMINADA: **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**; BAJO EL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **No. MAT-OP-REVUPE-013/2025-26**, TENIENDO LAS FACULTADES DE FIRMAR OFICIOS, ESTIMACIONES, BITACORA DE OBRA Y DEMAS DOCUMENOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

SIN MAS DE MOMENTO Y AGRADECIENDO SUS ATENCIONES, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

natalia trujillo

NATALIA TRUJILLO AMAYA

REPRESENTANTE LEGAL

COREFAMEX S.A. DE C.V.
Francisco Rincón No. Ext. 73 No. Int. 1 Ex. Ej. Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. Tel: (868)149 00 15

H. MATAMOROS, TAM, A 27 DE MAYO DEL 2026.

ASUNTO: **VOLUMENES EXCEDENTES**

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EN RELACIÓN CON LA OBRA CONTRATADA CON EL MUNICIPIO DE MATAMOROS A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA **No. MAT-OP-REVUPE-013/2025-26**, RELATIVO A **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS**; LE SOLICITO LA REVISION Y/O AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES QUE SE ENVIARAN EN LA ORDEN DE ACTUALIZACION DE LA ESTIMACION 1, LOS CUALES SON NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y NO CAMBIAN LA FINALIDAD DE LA OBRA.

SIN MAS DE MOMENTO Y ESPERANDO UNA RESPUESTA SATISFACTORIA A NUESTRA PETICION QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ATENTAMENTE

NATALIA TRUJILLO AMAYA

REPRESENTANTE LEGAL

COREFAMEX S.A. DE C.V.
Francisco Rincón No. Ext. 73 No. Int. 1 Ex. Ej. Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. Tel: (868)149 00 15

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE GRADO DE COMPACTACION Y PERMEABILIDAD EN CARPETA ASFALTICA

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON

TRAMO: DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES

SUB-TRAMO: MUNICIPO DE MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No:** CORE/3337-1358

EJECUTORA: COREFAMEX, S.A. DE C.V. **FECHA DE INFORME:** 30 de mayo de 2026

DATOS DE PROYECTO

GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO POR LA CAPA ENSAYAD, **95.0%** **P.V.M.M.**

ESPESOR DE PROYECTO: **5.0 Cms.**

No Ensaye	Franja	Ubicación	Espesor Cms.	Peso Volumetrico		% De Compactacion	% de Permeabilidad
				Del Lugar	Maximo		
	DE CALLE BENITO VELEZ A LAS TORRES						
3175	IZQUIERDA	DERECHO	5.00	2266	2358	96.1	0.00%
3176	CENTRO	CENTRO	5.01	2259	2358	95.8	0.00%
	DE CALLE TORRES A TUCAN						
3277	IZQUIERDA	DERECHO	5.00	2240	2358	95.0	0.00%
3278	CENTRO	CENTRO	5.01	2313	2358	98.1	0.00%

Referencias: N-CMT-CAR-1-04-006-09-CAL - N-CMT-4-05-00-002/11

N-CTR-CAR-1-01-009/00

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

EL GRADO DE COMPACTACION,ESPESORES Y PERMEABILIDAD OBTENIDOS EN LA CAPA ENSAYADA,CUMPLE DE ACUERDO A LOS MINIMOS ESPECIFICADOS

EL LABORATORISTA	VO.BO.
Lab. Armando Castiilo Piña	Informacion Tecnica en Obras S.A. de C.V.

Calle Caracol No 142 Colonia Acuario 2001 Tel .868031894 H.Matamoros Tamaulipas

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON

CARRETERA: DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES

EJECUTORA: COREFAMEX, S.A. DE C.V.

CIUDAD: MUNICIPO H. MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No.:** CORE/3336-1358

REFERENCIAS:M-MMP.1/01/03 **FECHA INFORME:** 18 de mayo de 2026

ESPESOR: 35.0 cms. Compactación [X] Recompactación [ ]

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 95.0 CAPA ENSAYADA: **SUB-BASE (SULFATO DE CALCIO)**

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
		DE CALLE BENITO VELEZ A LAS TORRES						
3271	-	DERECHO	35.0	36.3	39.0	1355	1410	96.1
3272	-	CENTRO	35.0	37.1	39.0	1340	1410	95.0
		DE CALLE TORRES A TUCAN						
3273	-	DERECHO	35.0	36.3	39.0	1351	1410	95.8
3274	-	CENTRO	35.0	37.1	39.0	1355	1410	96.1

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

INFORMACION TECNICA EN OBRAS,S.A. DE C.V.

REPORTE DE LABORATORIO

INFORME DE PESO VOLUMÉTRICO DEL LUGAR

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HALCON

CARRETERA: DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES

EJECUTORA: COREFAMEX, S.A. DE C.V.

CIUDAD: MUNICIPO H. MATAMOROS TAMAULIPAS **ENSAYE No.:** CORE: 3335-1358

REFERENCIAS:M-MMP.1/01/03 **FECHA INFORME:** 10 de mayo de 2026

ESPESOR: 15.0 cms. Compactación [X] Recompactación [ ]

GRADO DE COMPACTACIÓN MÍNIMO ESPECIFICADO % 95.0 CAPA ENSAYADA: TERRENO NATURAL(MEJ. CON CAL HIDRATADA)

Ensaye No.	Estación	Lado	Espesor de la capa Ensayada	Humedad %		Peso Volumétrico Seco kg/m3		% de Compactación
				Del Lugar	Optima	Del Lugar	Máximo	
		DE CALLE BENITO VELEZ A LAS TORRES						
3267	-	IZQUIERDO	15.0	17.5	19.0	1674	1760	95.1
3268	-	CENTRO	15.0	16.8	19.0	1690	1760	96.0
		DE CALLE TORRES A TUCAN						
3269	-	IZQUIERDO	15.0	17.5	19.0	1727	1760	98.1
3270	-	CENTRO	16.0	16.8	19.0	1672	1760	95.0

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES :

LOS RESULTADO OBTENIDOS EN TRAMO ENSAYADO CUMPLEN CON EL MINIMO REQUERIDO.

EL LABORATORISTA	EL JEFE DE LABORATORIO
Lab. Armando Castillo Piña	Ing. Humberto Alcocer Coronado Informacion Tecnica en Obras S.A de C.V.

Dirección de
Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A 01 DE JUNIO DEL 2026

COREFAMEX, S.A. DE C.V.
NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
Presente.-

En relación a la obra denominada PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE HALCON DE LA CALLE BENITO VELEZ A LA CALLE TUCAN DE LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS al amparo del contrato de Obra Pública No.MAT-OP-REVUPE-013/2025-26, hago de su conocimiento que esta Direccion a mi cargo autoriza los Volumenes de Obra Excedentes inscritos en la Orden de Actualizacion incluida en la Estimacion No 1 del Referido Contrato para su tramite y pago

Atentamente

ING FERNANDO REQUENA CHAVEZ
Director de Obras Publicas

c.c.p. archivo
