GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

PROPUESTA TÉCNICA

CONTENIDO DEL SOBRE NO. 1

BASES E INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

AT 1 *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.*

AT 2 *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS.*

AT 3 *CURRICULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.*

AT 4 *RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.*

AT 5 *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.*

AT 6 *MANIFESTACIÓN ESCRITA, EN PAPEL MEMBRETADO, EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.*

AT 7 *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.*

AT 8 *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD*

AT 9 *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.*

AT 10 *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA*

AT 11 *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO:*

A *LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B *MANO DE OBRA.*

C *MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

AT 12 *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.*

AT 13 *PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS*

AT 14 *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

B DE LA MANO DE OBRA.

C *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

D *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJO*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT1.- *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN ESTE ESPACIO LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SERÁ EMPLEADO; PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL SE DEBERÁ INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL DOCUMENTO AT3, QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ DE CALCULAR EN BASE A LOS RENDIMIENTOS MANIFESTADOS EL NUMERO DE MAQUINAS NECESARIAS PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.

SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA EL NO INCLUIR ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** *IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)* ***PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT1**
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **30 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***26 de noviembre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DARA MEDIANTE LA APERTURA DE LA BITACORA DE OBRA Y APERTURA DE CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.40 M, TRATAMIENTO DE TERRACERIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE 0.35 M DE SULFATO DE CALCIO, SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95%, NIVELACION DE POZO DDE VISITA, COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS COLOCANDO LA TAPA, MARCO Y CONTRA MARCO DE FO.FO.EXISTENTE, NIVELACION DE REJILLA DE 0.70X0.60 M. TIPO IRVING DE 4" X 3/8", SOLERA DE 4" X 1/8" Y ANGULO DE 4" X 1/4".

UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS SE PRECEDE A LA LIMPIEZA FINAL Y SE PRESENTA LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO Y CON ESTO PODER REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MISMOS AL AREA CONTRATANTE.



ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Av. Ubaldo Emilio Portes Gil #166 entre Fernando Villarreal y Emilio
El Buena Vista C.P. 87304 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1087CL0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT2.- *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR;

A). -ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B). -COLUMNAS:

EQUIPO N°.:	*SE ENLISTARÁN CON NÚMERO PROGRESIVO LOS EQUIPOS.*
NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:	*EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.*
MARCA:	*LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.*
MODELO:	*EL MODELO CORRESPONDIENTE.*
AÑO	*ANOTAR EL AÑO EN QUE INICIÓ SU FUNCIONAMIENTO*
CAPACIDAD:	*LA CAPACIDAD ESPECIFICADA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.*
COMBUSTIBLE:	*SE INDICARÁ EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO*
POTENCIA DEL MOTOR:	*CON NÚMERO EL CABALLAJE ESPECIFICADO*
UBICACIÓN ACTUAL:	*EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT2.- *RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

(GUÍA DE LLENADO)

DISPONIBILIDAD:	*SE MARCARÁ CON UNA **X** LA COLUMNA CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARÁ CON UNA X SI SE CUENTA CON OPCIÓN DE COMPRA.*
FECHA .	*SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	FECHA DE PRESENTACION: 26/11/2025	DOCUMENTO AT2
LICITACIÓN No: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025) DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	LICITANTE: KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA	HOJA: 1 DE 1

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FÍSICA

EQUIPO No.	CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA MAQUNARIA Y/O EQUIPO	MARCA	CARACTERISTICAS PARTICULARES			SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL (ENT.FED)	DISPONIBILIDAD	FECHA DE PUESTO EN SITIO
				MODELO	TIPO DE MOTOR	POTENCIA DEL MOTOR		PROPIO	
1	EQ-KW-01	Revolvedora para concreto cmarca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt.	MYM	SAE 300	Gasolina		Matamoros Tamps	X	29-nov-25
2	EQ-KW-02	Rodillo vibratorio marca Dynapac modelo PR8 cap.4400 VPM	Dynapac	PR8	DIESEL	4400 VPM	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
3	EQ-KW-03	Cortador de piso marca Target modelo EC205 cap. 6 5/8"	TARGET	EC205	Gasolina	4HP	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
4	EQ-KW-04	Bailarina neumática marca Wacker	WACKER	BS 502i	Gasolina	6HP	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
5	EQ-KW-05	Vibrador de gasolina marca Felsa con motor de gasolina de 4 H. P.	FELSA	PR8	Gasolina	8	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
6	EQ-KW-06	Compactador CS 433C, de 105 hp, 6.77 ton, ancho de tambor 1.68 m	CS	EC205	DIESEL		Matamoros Tamps	X	29-nov-25
7	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	CARTEPILLAR	BS 502i	DIESEL	93 HP	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
8	EQ-KW-08	Camión de volteo tipo torton con caja de 14 m3	MERCEDES BENZ	420 E	DIESEL	93 h.p	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
9	EQ-KW-09	Compactador sobre neumático PS 130B	PS	130B	DIESEL	100 hp	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
10	EQ-KW-10	Tractor de orugas D8RII de 305 hp y 37.594 ton de peso de operaciòn equipados con hoja y sin escarificador		D8RII	DIESEL	305 hp	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
11	EQ-KW-11	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	CARTEPILLAR		DIESEL	100 hp	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
12	EQ-KW-12	Pavimentadora asfaltica Caterpillar AP-1000B 174 hp	CARTEPILLAR	AP-1000B	DIESEL	174 HP	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
13	EQ-KW-13	Compactador de asfalto Caterpillar CB634C de 145 hp	Caterpillar	14H	DIESEL	215 hp	Matamoros Tamps	X	29-nov-25

14	EQ-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	FORD	AP-1000B	Gasolina	174 hp	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
15	EQ-KW-15	Camiòn pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	MERCEDES BENZ	CB634C	DIESEL	145 hp	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
16	EQ-KW-16	Petrolizadora 2100-SR (8000 LT.)		F-250	DIESEL	85 hp	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
17	EQ-KW-17	Nivel SOKKIA B20 aumentos 32x	SOKKIA	2100-SR	SM		Matamoros Tamps	X	29-nov-25
18	EQ-KW-18	Transito eléctrico marca Leica Wild	LEICA		SM	13 hp	Matamoros Tamps	X	29-nov-25
19	EQ-KW-19	Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp.	LINCOLN	SAE 300	KW	300 AMP	Matamoros Tamps	X	29-nov-25

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	DOCUMENTO AT 2
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO NO. *	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES						SITIO DE UBICACIÓN	DISPONIBILIDAD			
			MODELO	AÑO	CAPACIDAD	COMBUSTIBLE	POTENCIA DEL MOTOR	ACTUAL (ENT. FED.)	PROPIO	ALQUILADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA

NOTA: *TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR*

** CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT3.- *CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.*

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE INCLUIRÁ EL CURRICULAR DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

Historial Académico

Profesional (2003-2008)
Instituto Tecnológico de Matamoros
Ingeniería Civil
Especialidad en Infraestructura Municipal.
Título y Cedula Profesional No. 7096131

Habilidades

*Experiencia en Supervisión y Control de Obra.
*Experiencia en Costos y Presupuestos
*Experiencia en Elaboración de Estimaciones.
*Experiencia con el uso de Tránsito y Nivel
*Diseño de Planos de construcción
*Uso del paquete Office
*Uso de AutoCAD
*Experiencia en construcción y diseño de maquetas.

Extracurriculares

Concurso "Construye puentes de palitos" 2006
Obteniendo el 8º Lugar en diseño de estructura y resistencia

Concurso "Construye puentes de palitos" 2007
Obteniendo el 1º Lugar en diseño de estructura y resistencia
XIV Simposio Internacional de Ing. Civil - septiembre 2007 Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

MIEMBRO DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL NORESTE DE TAMAULIPAS, A.C.



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

Experiencia Laboral

- **Constructora TEGA (junio 2006 - agosto 2006)**

Funciones desempeñadas:

*Funciones Topográficas
*Construcción de Plataformas
*Construcción de Calles
*Verificación de Niveles
*Supervisión de Obra

- **Constructora Grupo Decora arquitectos (agosto 2008 – octubre 2008)**

Funciones desempeñadas:

*Residencias profesionales
*Supervisor de obra
*Verificación de Planos
*Cálculo de Materiales

- **Presidencia Municipal de Matamoros – Relleno Sanitario (octubre 2008 – Julio 2009)**

Funciones desempeñadas:

*Coordinador:
-Actividades del Relleno Sanitario.

- **Presidencia Municipal de Matamoros – Almacén de Obras Públicas (Julio 2009 – noviembre 2011)**

Funciones desempeñadas:

*Coordinador:
-Bacheo
-Rastreo
-Albañilería



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Construcciones Universales, S.A. de C.V.**
(diciembre 2011 – mayo 2013)

*Residente de Obra
*Pavimentación Asfáltica en Parque Industrial FINSA
*Remodelación en Centro Histórico de la Ciudad de H. Matamoros, Tam.

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
(agosto 2011 –Presente)

*Representante Legal – Propietario – Responsable Técnico – Superintendente de Obra

Obras Ejecutadas:

- TRABAJOS DE ACABADOS FINALES EN CASA HABITACION.
- IMPERMEABILIZACION EN LOSA Y DEMOLICION DE CONSTRUCCION EN SEGUNDO PISO CASA HABITACION
- CONSTRUCCION DE RECAMARA Y BAÑO COMPLETO EN CASA HABITACION
- TRABAJOS DE ACABADOS FINALES EN CASA RESIDENCIAL
- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN PARQUE INDUSTRIAL FINSA
- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN PLAYA BAGDAD
- MAT-OP-FISM-012-2012
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SAN RAFAEL Y TEXCOCO DE LAGO DE CHAPALA A AV. CANTINFLAS.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.
- PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE TLALOC, DE MONTEALBAN A TEOTIHUACAN.
- PAVIMENTACION ASFALTICA EN ESTACIONAMIENO ES ESCUELA PRIMARIA
- PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CASTAÑOS
- MAT-OP-HABITAT-042/2012PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DECENCIA DE DIAG. LA AMISTAD A PINO
- MAT-OP-HABITAT-006/2012
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EUCALIPTO DE BENITO JUAREZ A ALAMO.
- MAT-OP-FISM-037/2012 RED DE ELECTRIFICACION CALLE DAVID JARAMILLO
- MAT-OP-HABITAT-059/2012
HABILITACION DE EXTERIORES DEL C.D.C. CON LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CALLE SEDUE DE SEGURIDAD PÚBLICA A DESARROLLO URBANO



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
  (continua - Presente)

- MAT-OP-FISM-151/2012
  REHABILITACION DE CAMINOS RURALES BRECHAS DE ACCESO, EJIDOS: LA PALANGANA, POTRERO NUEVO, LOS CARRIZOS, CINCO DE MAYO, LAS BLANCAS, SANTA ADELAIDA Y LA LIBERTAD.

- SOP-IE-DS-551-12-I
  OBRAS DIVERSAS DERIVADAS DE COMPROMISOS DEL EJECUTIVO ESTATAL EN LA ZONA IV: MATAMOROS Y VALLE HERMOSO PAQUETE 7

- SOP-IE-CA-071-13-D
  BACHEO Y RETIRO DE ARENA EN LOS CAMINOS: E.C. (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL (62.0 KM) Y E.C. (AL MEZQUITAL) – LA PLAYA (1.5 KM), LONGITUD 63.5 KM, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FISM-003/2013
  PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRAXEDIS GUERRERO DE DIVISION DEL NORTE A PRIMERO DE MAYO.

- MAT-OP-FISM-013/2013 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MURCIA DE VALENCIA A MADRID

- MAT-OP-FISM-037/2013 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DONACIANO GARCIA DE REYES HEROLES A MUÑOZ LERDO

- MAT-OP-FISM-206/2013 RECONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO.

- CONTRATO: IO-020000877-N6-2013 CONSTRUCCION DE 4123 M^2 DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM^2 DE 8 CM DE ESPESOR.
- AMPLIACION DE NAVE INDUSTRIAL TRICON.

- SOP-IF-FONDEN-369-13-I REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN FERNANDO – SOLEDAD DE LOS PÉREZ) – PASO HONDO, DEL KM. 0+000 AL 21+000. LONGITUD TOTAL 21.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. PAQUETE 38.

- TRABAJOS DE REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO A CONCRETO HIDRAULICO, EN PUENTE INTERNACIONAL DE NUEVO PROGRESO, TAMAULIPAS

- SOP-IF-CA-539-14-I CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: E.C.(VICTORIA-MATAMOROS) EL MEZQUITAL (62.0 KM) E.C. (AL MEZQUITAL)-LA PLAYA (1.5 KM) LONG. 63.50 KM PAQUETE 10.

- ITIFE-FAMBCO15-I-SOP-0060-2015-0170 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.45 M. + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 22.00 X 3.00 M. + 0.30 M. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 70 ML. EN PRIMARIA HIMNO NACIONAL, EJ. LOS ARADOS, MATAMOROS, TAMAULIPAS

- REVESTIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (CARR. PEMEX - POZOS NEJOS) KM. 5.5 - PUERTO LOS ÉBANOS - EL SACRIFICIO, DEL KM. 0+000 AL 12+000, LONGITUD 12.0 KM., MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, PAQUETE 29

- MAT-OP-FISM-042/2015 RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA ETAPA, LOS ANGELES 1

- CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO: LOS VERGELES - LAGUNA MADRE, DEL KM. 21+500 AL KM. 41+500, LONGITUD 20.0 KM., MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
  (continua - Presente)

- SOP-IF-MV-246-16-I MODERNIZACIÓN DE LA AV. DE LAS ROSAS, DE AV. ÁLVARO OBREGÓN A TAMAULIPAS, Y MODERNIZACIÓN DE CALLE LILAS, DE AV. DE LAS ROSAS A TAMAULIPAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- PRESTACION DE SERVICIOS PLANTA KEMET MATAMOROS

- KWC01MX/MEX17/10500 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL Y CANALETA DE AGUAS PLUVIALES EN ESCUELA PRIMARIA RAUL GARATE EN ESTACION RAMIREZ

- SOP-IF-MV-253-17-I PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE QUINTA DE GONZALEZ A BRAVO Y CONSTRUCCION DE EXPLANADA DE CONCRETO ESTAMPADO PARA LA REHABILITACION DE LA AV. ALVARO OBREGON EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA Y AMPLIACIÓN DE CARRILES EN AV. JOSE SULEIMAN CHAGNON Y CARRETERA CIUDAD VICTORIA – MATAMOROS CON LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA.

- CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE LA CUCHILLA UBICADO EN EL KM. 203+000, DE LA CARRETERA: SALTILLO-TORREÓN, TRAMO EMILIANO ZAPATA – EL MIMBRE, EN EL ESTADO DE COAHUILA.

- TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR: MATAMOROS - PUERTO MATAMOROS, DEL KM. 52+500 AL KM. 61+140, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- KWC01MXMEX18/10044 CONSTRUCCIÓN DE 2 OFICINAS DE COORDINACION, REMODELACIÓN DE SALA DE REUNIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN LA DELEGACIÓN ESTATAL DE CRUZ ROJA MEXICANA EN ACAPULCO, GUERRERO.

- SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2018-LP. REHABILITACIÓN DE COLECTORES (DRENAJES CAÍDOS) EN LOS TRAMOS: CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES GENERAL LUCIO BLANCO Y JUSTO SIERRA, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, CALLE RUBÍ ENTRE GAMA Y EMILIO PORTES GIL COLONIA ARCOÍRIS Y CALLE VOLCÁN DEL PARICUTÍN ENTRE CERRO DE PICACHOS Y CERRO DE PADILLA COLONIA ALMAGUER EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

- SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP. REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTORES (DRENAJE CAÍDO) EN LOS TRAMOS: CALLE HONDURAS, ENTRE CALLES EL SALVADOR Y HONDURAS, COLONIA LA CAÑADA, CALLE ORIENTE 2 ENTRE SUR 2 Y SUR 1 COLONIA LAS CUMBRES, CALLE TACUBAYA ENTRE HUMBOLDT Y NORTE 2, COLONIA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

- 2018-28-CF-A-010-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM 55+000 AL KM 59+000, CON UNA META DE 4.0 KM, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- 2018-28-CB-A-044-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERÍODICA MEDIANTE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, PARA LA FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, BACHEO PROFUNDO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM DEL KM. 297+200 AL KM. 300+200 (2 CUERPOS), TRAMO: SAN FERNANDO – MATAMOROS, CARRETERA: CD. VICTORIA – MATAMOROS, CON UNA META DE 6.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

- KWC01MXMEX18/10368 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CISTERNA Y CAMBIO DE ACCESOS EN TRES AULAS EN LA ESCUELA RAUL GARATE, EN MATAMOROS TAMAULIPAS.



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
  (continua - Presente)

- 2018-28-CF-A-013-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM. 55+000 AL KM 59+000, CON UNA META DE 4.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- ITIFE-FAMBCO18-I-SOP-0047/2018 SUBESTACION ELECTRICA CABLEADO, REHABILITACION EN LOSAS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES 28DPR149M, COL. LAS PALMAS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL 215.15 M EN JARDIN DE NIÑOS CONSUELO G. DE GUAJARDO 28DJN0071G, COL. PROGRESO, MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-HIDROCARBUROS-021/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE WASHINGTON DE CALLE COSTA RICA A AV. LAURO VILLAR, EN COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FM-010/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DIVISION DEL NORTE (CUERPO SUR) DE ACCION CIVICA A 0+374 HACIA EL ORIENTE.

- MAT-OP-FM-011/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE LEYES DE REFORMA (CUERPO SUR) DE AV 12 DE MARZO A 0+475 (HACIA EL ORIENTE) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- 2019-28-CF-A-011-W-00-2019 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2019, EN 123.96 KM. EQUIVALENTES 13.96 KM. DE LA RED BÁSICA EN CORREDORES, KM. 201+400 AL KM. 109+500, VIADUCTO REYNOSA Y 110.00 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM 0+000 AL KM 110+000, TRAMO TEJÓN - REYNOSA, CARRETERA: TEJÓN-REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FISM-002/2019 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NOGALITOS Y MIGUEL HIDALGO DE CASTAÑO A LIMITE NORTE EN LA COLONIA NOGALAR PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FORTAMUN-003/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. SENDERO NACIONAL DE RIGO TOVAR A 0+418.00 OTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

- MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-002/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV LAURO VILLAR DE SAN CARLOS A GOBERNACION.

- ITIFE-CIEN17-LP-SOP-016-2019-0019, CONSTRUCCION DE UN TALLER DE PUERICULTURA SIN MOBILIARIO 7 EE ESTR. 715 (U1-C) AISLADO + ANDADOR 12 X 3 M + OBRA EXTERIOR EN ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO 28ETC0006G, FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- 2019-28-CB-A-033-W-00-2019, TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIODICA MEDIANTE RECUPERACION DE 10.0 CM. DE CARPETA EXISTENTE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA DE 5.0 CM. DE ESPESOR, DEL KM. 291+200 AL KM. 297+200, TRAMO: SAN FERNANDO-MATAMOROS, CARRETERA: CIUDAD VICTORIA-MATAMOROS, CON UNA LONGITUD DE 6.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

- MAT-OP-FISM-029/2019 RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOMA PRIETA DE AV. DIEGO RIVERA A MIGUEL A. RUIZ (INCLUYE EL REEQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO LOMAS DE SAN JUAN) EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- SEDATU-OP-04-2019 CONSTRUCCION DEL MODULO DEPORTIVO DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA CD. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
  (continua - Presente)

- 2020-28-CF-A-019-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CORREDOR AGRÍCOLA NORTE, DEL KM. 3+500 AL KM. 9+500, CON UNA META DE 6.00 KM., EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FISM-020/2020 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LEALTAD DE HUMANIDAD A TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-CPFPV-002/2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV LAURO VILLAR (CARRILES CENTRALES NORTE Y CARRILES LATERALES NORTE) DE CALLE ARIZONA A (1+480) A KM 2+200 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- ITIFE-FAMMS20-LP-SOP-021-2020-0040 CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE CONCRETO + OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS 28EUT0002Z, CARRETERA A REYNOSA KM. 8.5, MATAMOROS TAMAULIPAS.

- VH-OP-FISM-016/2020 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, EN BRECHA 118 DE CALLE JOSE MARIA MORELOS A CALLE JOSE SILVA SANCHEZ, COL. JOSE SILVA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEHERMOSO, TAMAULIPAS.

- VH-OP-FISM-019/2020 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, EN CALLE JOSE SILVA SANCHEZ DE BRECHA 118 A CALLE ING. E. CHAVEZ, COL. JOSE SILVA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.

- 2021-28-CB-A-005-W-00-2021, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RECUPERACION EN FRIO DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CARPETA ASFALTICA DE ALTO DESEMPEÑO, CON UNA META DE 8.0 KM., DEL KM. 0+000 AL 8+000, DEL TRAMO: LIBRAMIENTO SAN FERNANDO, CARRETERA: CIUDAD VICTORIA-MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- SOP-REY-FONDEN-048-2021-LP REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA, TENDIDA EN CALIENTE, EN VARIAS CALLES (CIRCUITO INDEPENDENCIA, BLVD. LA CIMA, FUENTE DE DIANA, LOMA LINDA Y LOMA BLANCA) DE LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS.

- SOP-IF-MV-091-2-1P PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICINES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FISM-011/2021 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE CARRETERA AL MEZQUITAL A ESCUELA EN LA COLONIA POBLADO HIGUERILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

- 2021-28-CB-A-037-W-00-2021 CONSERVACIÓN INMEDIATA DE DESYERBE, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, REMOCIÓN DE DERRUMBES Y AFINE DEL DERECHO DE VÍA, EN 123.96 KILÓMETROS EQUIVALENTES (ZONA 4), DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS".

- MAT-OP-FISM-013/2021 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE OBRERO MUNDIAL Y SECCION 16 EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
(continua - Presente)

- SEDATU-OP-08-2019 CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- SEDATU-OP-09-2019 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA MZA. 6, LOTE 1, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE UNION Y JILGUERO COLONIA 5 DE MARZO, EN LA CD. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- SEDATU-OP-25-2019 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: MIGUEL ALEMÁN/MIGUEL HIDALGO DE AV. BENJAMÍN GAONA A MIGUEL DE LA MADRID, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SONORA DE BENJAMÍN GAONA A JESÚS RAMÍREZ, CALLE VICTORIA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE TRES, COL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO Y AMPLIACIÓN REFORMA SUR; CALLE ARCA DE NOÉ DE AVENIDA BENITO JUÁREZ A LÍMITE ORIENTE, CALLE JERUSALÉN DE ARCA DE NOÉ A AV. MANUELCHAPA, CALLE GALILEA DE ARCA DE NOÉ A CALLE LEVI, COL. NUEVA JERUSALÉN; CALLE MANUEL SOLÍS BEJARANO DE BEETHOVEN GALÁN A MIGUEL A. RUÍZ Y CALLE MIGUEL A. RUÍZ DE MANUEL SOLÍS BEJARANO A LOMA BONITA, COL. ABELARDO DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- 2019-28-CB-A-048-W-00-2019 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN EL KM. 299+520, TRAMO: SAN FERNANDO-MATAMOROS, CARRETERA: CD. VICTORIA – MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- 2019-28-CB-A-052-W-00-2019 TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE RENIVELACIONES Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, DEL KM. 40+000 AL KM. 47+000, TRAMO: VILLA DE CASAS-SOTO LA MARINA, CARRETERA: CD. VICTORIA-SOTO LA MARINA, CON UNA LONGITUD DE 7.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

- 2020-28-CB-A-003-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2020, EN 185.26 KM. EQUIVALENTES; 118.56 KM. DE LA RED BÁSICA EN CORREDORES, KM. 7+000 AL KM. 64+500 Y KM. 73+500 AL KM. 80+000, CARRETERA: MATAMOROS – REYNOSA; KM. 253+900 AL KM. 300+200 CARRETERA: CD. VICTORIA - MATAMOROS; 25.0 KM. DE LA RED BÁSICA, DEL KM. 10+000 AL KM 35+000, TRAMO REYNOSA - DIAZ ORDAZ, CARRETERA: REYNOSA –NUEVO LAREDO Y 41.70 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM. 9+700 AL KM. 37+600, CARRETERA; MATAMOROS – PLAYA LAURO VILLAR, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- 2020-28-CB-A-023-W-00-2020, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RECUPERACIÓN EN FRIO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS Y CARPETA ASFÁLTICA, CON UNA META DE 6.0 KM, DEL KM. 49+000 AL KM. 55+000, DEL TRAMO: MATAMOROS – RIO BRAVO, DE LA CARRETERA: MATAMOROS - REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- 2020-28-CB-A-030-W-00-2020, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO, CON UNA META DE 6.6 KM., DEL KM. 42+500 AL KM. 49+100, DEL TRAMO: T. LAS URRACAS – REYNOSA, DE LA CARRETERA: SAN FERNANDO – REYNOSA.

- VH-OP-MUNI-001/2020 CONFORMACIÓN DE BRECHA KM 114 NORTE DE CARRETERA 182 A BRECHA 179, INCLUYE: RECARGUES CON MATERIAL DE BANCO EN AREAS DAÑADAS.

- MAT-OP-FORTAMUN-011/2020 REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES DE SENDERO NACIONAL A VIAS DE FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
  (continua - Presente)

- MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2021 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. LAURO VILLAR CUERPO SUR DE AV. LAS CULTURAS (3+180) A GREGORIO GARZA FLORES (3+635.8) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- ITIFE-FAMREM20-I-SOP-053-2021-0067 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 24 M. + EXPLANADA DE 20 X 24 M. EN PRIMARIA FRANKLIN D ROOSEVELT 28DP0456A, ZONA CENTRO, MATAMOROS TAMAULIPAS.

- 2022-28-CB-A-001-W-00-2022 ATENCIÓN A UN P UNTO DE CONFLICTO UBICADO EN EL KM. 200+100, TRAMO: T. IZQ. DÍAZ ORDAZ-REYNOSA, CARRETERA: MONTERREYREYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- SIS-RP-13/22-CP REHABILITACION DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 1 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

- SOP-IE-MV-025-22-P PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- 2022-28-CB-A-015-W-00-2022 CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RENIVELACIONES LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO CON UNA META DE 9.0 KM, DEL KM 169+500 AL KM 178+500, TRAMO: MIER-NUEVO LAREDO, CARRETERA: REYNOSA-NUEVO LAREDO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

- SOP-IF-MV-065-22-P PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

- 2022-28-CB-A-015-W-00-2022 CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RENIVELACIONES LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO CON UNA META DE 9.0 KM, DEL KM 169+500 AL KM 178+500, TRAMO: MIER-NUEVO LAREDO, CARRETERA: REYNOSA-NUEVO LAREDO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- SIS-RP-30/22-CP REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA (TRAMO I) DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO A LA CALLE SALTO DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

- MAT-OP-OD-016/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TARAHUMARA DE CALLE PLAYA HORNOS A AV. CANTINFLAS (2 CUERPOS), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

- OP-VH-FISMUN-012/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VICTORIA, DE CALLE ING. SANTIAGO GUAJARDO A CALLE 5 DE MAYO, COLONIA LAS AMERICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.

- OP-VH-FISMUN-014/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRIMERA DE CALLE ROSALINDA A BOULEVARD AMERICO VILLARREAL COLONIA MEXICO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.

- OP-VH-FISMUN-015/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CUAUHTEMOC DE CUARTA A SEXTA COLONIA SARH DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
  (continua - Presente)

- OP-VH-FISMUN-019/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TAMAULIPAS DE CALLE SEPTIMA A CALLE NOVENA COLONIA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.

- MAT-OP-OD-032/2022 INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO NOM-002-CONAGUA-2011 CALLE FRANCISCO RINCON ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y SAN JAVIER EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- OP-VH-FISMUN-020/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE AMERICA DE BRECHA 118 A CALLE INGENIERO SANTIAGO GUAJARDO COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.

- SOP-IE-MV-001/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA (LADO PONIENTE) DE DIAGONAL CUAUHTÉMOC A AV. LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. ETAPA 1 (PUENTE VIEJO). REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA (LADO PONIENTE) DE DIAGONAL CUAUHTÉMOC A AV. LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS ETAPA 2 (PUENTE NUEVO).

- OP-VH-FORTA-016/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TAMAULIPAS DE NOVENA A CALLE ONCE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.

- OP-VH-FORTA-018/2022 CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO EN CALLE 29 ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.

- OP-VH-FORTA-026/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CALLE INSURGENTES A CALLE REVOLUCION EN POBLADO ANAHUACA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.

- OP-VH-FORTA-027/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE FUNDADORES DE CARRETERA INDEPENDENCIA A CALLE PROGRESO EN POBLADO ANAHUAC MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.

- OP-VH-FORTA-031/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE JUAN DE LA TORRE DE CARRETERA 82 A CALLE SATURNINO MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.

- OP-VH-FORTA-032/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE 19 DE CALLE TAMAULIPAS A CALLE AMERICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.

- OP-VH-R23-001/2023 REPAVIMENTACION EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.

- OP-VH-R23-002/2023 REPAVIMENTACION EN CALLE MORELOS DE CALLE PRIMERA A CALLE SEGUNDA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS

- 2023-28-CB-A-001-W-00-2023 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 327.76 KM EN LAS RUTAS 2, 30, 40, 54 Y 85: RUTA 2, CARRETERA REYNOSA – NUEVO LAREDO, TRAMO: REYNOSA -CD. MIER, DEL KM 38.0 AL 101.2, LONGITUD 46.7 KM; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO DE CAMARGO, DEL KM 0.0 AL 4.5, LONGITUD 4.5 KM; TRAMO RAMAL A L PTE. INT. DE CAMARGO, DEL KM 3.0 AL 6.8, LONGITUD 3.8 KM; TRAMO RAMAL PASO POR NVA CD. GUERRERO, DEL KM 0.0 AL 3.5, LONGITUD 3.5 KM; TRAMO RAMAL A AEROPISTA NVA. CD. GUERRERO, DEL KM 0.0 AL 2.8, LONGITUD 2.8 KM; TRAMO CD. MIER–T. RUTA 85 (MONTERREY – NUEVO LAREDO), DEL



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- **Kawac Construcciones, S.A. de C.V.**
(continua - Presente)

KM 104.3 AL 221.1, LONGITUD 116.8 KM; RUTA 30, CARRETERA PARÁS - NVA. CD. GUERRERO, TRAMO PARÁS (LIM. EDOS N.L./TAM) - NVA. CD. GUERRERO, DEL KM 13.1 AL 30.1, LONGITUD 17.0 KM; RUTA 40, CARRETERA MONTERREY - CD. REYNOSA, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM - REYNOSA, DEL KM 181.05 AL 202.0, LONGITUD 41.9 KM; TRAMO RAMAL AL PTE. INT. REYNOSA - MCALLEN (ANZALDÚAS), DEL KM 0.0 AL 10.376, LONGITUD 16.8 KM; RUTA 54, CARRETERA MONTERREY – CD. MIER, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM -CD. MIER, DEL KM 132.8 AL 155.6, LONGITUD 22.8 KM; RUTA 85, CARRETERA MONTERREY – NVO. LAREDO, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM -NVO. LAREDO, DEL KM 204.52 AL 214.0, LONGITUD 18.96 KM; TRAMO LIBRAMIENTO DE NUEVO LAREDO II, DEL KM 0.0 AL 32.2, LONGITUD 32.2 KM; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FAISM-005/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HIGUERA ENTRE FRESNO Y PARAISO EN LA COLONIA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-FAISM-006/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TOLTECA ENTRE CHICHIMECA Y BIENESTAR Y CALLE CHICHIMECA ENTRE TOLTECA Y EMILIO PORTES GIL EN LA COLONIA VALLE DE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- SIS-RP-61/23-CP REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN CARRILES PRINCIPALES (TRAMO I) DE RIO LA SILLA A LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

- T2B03/25/007/23C REPARACION EN VIALIDADES BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AREA DE CARRILES LIGEROS Y AREAS DE BANQUETAS.

- SIS-FAISMUN-01/23-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

- MAT-OP-OD-016/2023 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1A ETAPA) EN AV. PEDRO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- MAT-OP-REPUVE-010/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES 1.-HUAMUCHIL DE CALLE 6 DE MARZO A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (61.00 M.L.) 2. CALLE STA. ALICIA DE CALLE SANTA ALICIA A DREN 20 DE NOVIEMBRE (23.50 M.L.) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- SC-PEI-CP-C-OE-09/2023 REHABILITACIÓN DE CAMINO GENERAL ZARAGOZA-LA ENCANTADA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN.

- SIS-RP-04/24-CP REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE AV. RUIZ CORTINES (PONIENTE – ORIENTE), ENTRE AV. RANGEL FRIAS Y AV. ABRAHAM LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.

- MAT-OP-REPUVE-027/2023-24 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DEL LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE CALLE FERNANDO VILLARREAL A AVENIDA 12 DE MARZO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+720 DE LAS COLONIAS VILLARREAL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

- SIS-RP-41/24-CP MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AV. PROL. RUIZ CORTINES ENTRE LA CALLE 19 DE OCTUBRE Y CALLE DE RENACIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.



CURRÍCULUM VITAE

NOMBRE: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
FECHA DE NACIMIENTO: 28 DE OCTUBRE DE 1985
DIRECCIÓN: URUAPAN N.º 36
CEL.: (868) 124-2498
EMAIL : ING.MEMOGLZ@GMAIL.COM

- 2024-28-CB-O-004-W-00-2024 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 364.26 KM, EN LAS RUTAS 101 Y 107; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- MAT-OP-CPFPN-001/2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CRUCE PEATONAL A NIVEL EN BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA (SUR) DE CALLE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- FAISMUN/2024/33021 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "MIGUEL HIDALGO" DE EL POBLADO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
Cedula Profesional No. 7096131

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: ***SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.***

DOCUMENTO AT4.- *IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A). -ENCABEZADO:

.

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*

B). - COLUMNAS:

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.*
LUGAR:	*EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.*
MONTO DEL CONTRATO:	*CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS.*
FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN:	*SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).*
OBSERVACIONES:	*LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM VITAE

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

DATOS GENERALES:

▽ **NOMBRE DE LA EMPRESA:**

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

▽ **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:**

KCO110823CE0

▽ **REGISTRO PATRONAL:**

E9437116101

▽ **DOMICILIO:**

AV. LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y ESQUINA #160, EJ BUENA VISTA, C.P. 87394
H. MATAMOROS TAMAULIPAS

▽ **TELEFONO:**

- 868-8124672
- 8681-242498

▽ **CORREO ELECTRONICO:**

kawac.construcciones@gmail.com
kawac.construcciones@kawaconstruction.com
kawac.construcciones@hotmail.com

▽ **PAGINA WEB:**

http://kawaconstruction.com/

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REGISTROS

- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.**
  - R0199
- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**
  - - 145MMT-CM-OP/2024
- ∇ **PADRON DE PROVEEDORES DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**
- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.**
- ∇ **PADRON DE PROVEEDORES DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.**
- ∇ **PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.**
  - MTY-SIS-073

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- ▽ **PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON**

- ▽ **PADRON DE PROVEEDORES DE ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS**

- ▽ **PADRON DE CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL R. AYUNTAMIENTO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.**

- ▽ **PADRON DE PROVEEDORES DE ADQUISICIONES DEL R. AYUNTAMIENTO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS.**

- ▽ **REGISTRO CMIC**
- 00125075

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

OBJETO SOCIAL:

Fabricación, Suministro y Colocación de Mezclas asfálticas, Construcción, Edificación, Infraestructura Urbana, Infraestructura de Transporte, Infraestructura Vial, Renta de Equipo y Maquinaria Pesada, Acabados, Recubrimientos, Instalaciones, Remodelaciones, Proyectos Estructurales, Proyectos Arquitectónicos, Levantamientos Topográficos, Gerencia y Supervisión de Obra.

MISIÓN:

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. de C.V, es una Empresa Mexicana dedicada a brindar Servicios de Construcción, Pavimentos y Mezclas asfálticas, Diseño y Renta de Maquinaria en el ámbito público y privado, cuya misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes antes, durante y después de finalizado el proyecto.

Lo anterior cumpliendo los estándares y normas de calidad, respetando el medio ambiente, el personal laboral y todo aquello que tenga relación con nuestra empresa, buscando siempre oportunidades para el desarrollo de sus trabajadores, generando vínculos estratégicos con sus proveedores y creando valor a sus dueños y accionistas.

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

VISIÓN:

Crecer y Posicionarnos como Empresa Líder en Pavimentos, Diseño y Construcción en nuestro País, actualizando constantemente nuestros servicios, utilizando las mejores tecnologías, materiales, equipo y así también nuestro personal, para ofrecer y brindar a nuestros clientes calidad y costo.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

VALORES:

- **RESPETO**

  Fomentar el respeto mutuo entre el personal, clientes y proveedores, para crear un ambiente sano de trabajo.

- **CONFIABILIDAD**

  Nuestro objetivo es que nuestros clientes tengan la seguridad y la tranquilidad de que realizaremos los trabajos siempre de manera honesta y sin afectar a terceros.

- **CALIDAD**

  Proporcionar servicios de acuerdo con las normas de calidad exigidas por la industria y nuestros clientes, logrando además la optimización de los costos y materiales.

- **INNOVACION**

  Desarrollar servicios y productos de calidad utilizando creatividad y tecnología, para garantizar la eficacia de nuestros trabajos en un futuro.

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

SERVICIOS

- **KAWAC ASFALTOS**
  - **FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO ASFALTICO**
  - **FABRICACION Y COLOCACION EMULSION ASFALTICA**
  - **FABRICACION Y COLOCACION DE SELLO ASFALTICO**
    - 3ª
    - 3E
    - 3S

- **INFRAESTRUCTURA URBANA**
  - **BANQUETAS**
  - **GUARNICIONES**
  - **REDES ELECTRICAS**
  - **SUBESTACIONES ELECTRICAS**
  - **ALUMBRADO PUBLICO**
  - **SEÑALAMIENTO**
    - **HORIZONTAL**
      - **PINTURA TERMOPLASTICA EN PAVIMENTO, GUARNICIONES**
    - **VERTICAL**
      - **TABLEROS PREVENTIVOS, INFORMATIVOS, RESTRICTIVOS, SERVICIOS**

  - **RED DE AGUA Y DRENAJE**

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
  - **CAMINOS**
    - TERRACERIAS
    - ACARREOS
    - BACHEO
    - SELLO ASFALTICO
    - CONSERVACION RUTINARIA
  - **PAVIMENTACION DE CALLES**
    - BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO
    - CONSERVACION RUTINARIA
  - **PUENTES PEATONALES**

- **INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
  - PERFORACIONES DE POZOS DE AGUA

- **EDIFICACION**
  - **VIVIENDA**
    - CASA HABITACION
    - RESIDENCIAL
  - **COMERCIAL**
    - LOCALES
  - **INDUSTRIAL**
    - BODEGAS Y NAVES
  - **INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
    - JARDINES DE NIÑOS
    - ESCUELAS (PRIMARIAS, SECUNDARIAS)
    - TECHUMBRES

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **EDIFICACION**
  - **CULTURAL**
    - RESTAURACION DE INMUEBLES DE INTERES ARTISTICO E HISTORICO (MUSEOS, TEATROS, BIBLIOTECAS)
  - **RECREATIVO Y TURISTICO**
    - PARQUES, PLAZAS, JARDINES

- **PROYECTOS, REMODELACION Y AMPLIACION**
  - **INDUSTRIAL**
  - **HABITACIONAL**
  - **ARQUITECTONICO**
  - **COMERCIAL**

- **MANTENIMIENTO**
  - **INDUSTRIAL**
  - **ESTRUCTURAS METALICAS**
  - **EDIFICACION**
  - **AIRES ACONDICIONADOS**
  - **SOLDADURA**

- **INSTALACIONES**
  - **ELECTRICAS**
    - ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION
  - **HIDRAULICAS**
  - **SANITARIAS**
  - **GAS**

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS**
  - **PINTURA**
    - **VINILICA**
    - **ACRILICA**
    - **ESMALTES**
    - **SELLADORES**
  - **PLAFON**
  - **VIDRIOS**
  - **ALUMINIO**
  - **HERRERIA**
  - **IMPERMEABILIZACION**
  - **PISOS Y AZULEJOS**
  - **CANTERA**
  - **MARMOL**
  - **GRANITO**
  - **ONIX**
  - **EBANISTERIA**
  - **CONCRETO ESTAMPADO**
  - **CONCRETO OXIDADO**

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **RENTA DE MAQUINARIA PESADA**
  - **EXCAVADORA**
  - **RETROEXCAVADORA**
  - **MOTOCONFORMADORA**
  - **CARGADOR FRONTAL**
  - **CAMION DE VOLTEO**

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **RENTA DE MAQUINARIA PESADA**
  - **PIPA DE AGUA**
  - **VIBROCOMPACTADOR, TANDEM**
  - **PATA DE CABRA**
  - **TRACTOCAMION**
  - **VOLTEO TIPO GONDOLA**
  - **CARGADOR FRONTAL**
  - **PAVIMENTADORA**
  - **NEUMATICO**
  - **PETROLIZADORA**
  - **PLANTA DE ASFALTO**
  - **FRESADORA**
  - **LOWBOY**
  - **GRUA 15 TON – 35 MTS ALTURA**
  - **EQUIPO DE LEVANTE**
    - **GENIE ELECTRICO – 36 PIES**
    - **GENIE ARTICULADO – 45 PIES**

- **RENTA DE EQUIPO MENOR**
  - **PLANTA DE LUZ**
  - **PLANTA SOLDAR**
  - **COMPACTADOR MECANICO (BAILARINA)**
  - **CORTADORA DE CONCRETO**
  - **ROTOMARTILLO ELECTRICO**
  - **HIDROLAVADORA**
  - **REMOLQUE**

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

- **RENTA DE EQUIPO MENOR**
  - **TRAILA**
  - **EQUIPO TOPOGRAFICO**
    - TRANSITO
    - NIVEL
    - ESTACION TOTAL

- **GERENCIA**
  - **ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA**
  - **ESTIMACIONES**
  - **LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS**
  - **SUPERVISION TECNICA DE OBRA**

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Atentamente

Ing. Guillermo Antonio Gonzalez Mancilla
Representante Legal

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ORGANIGRAMA

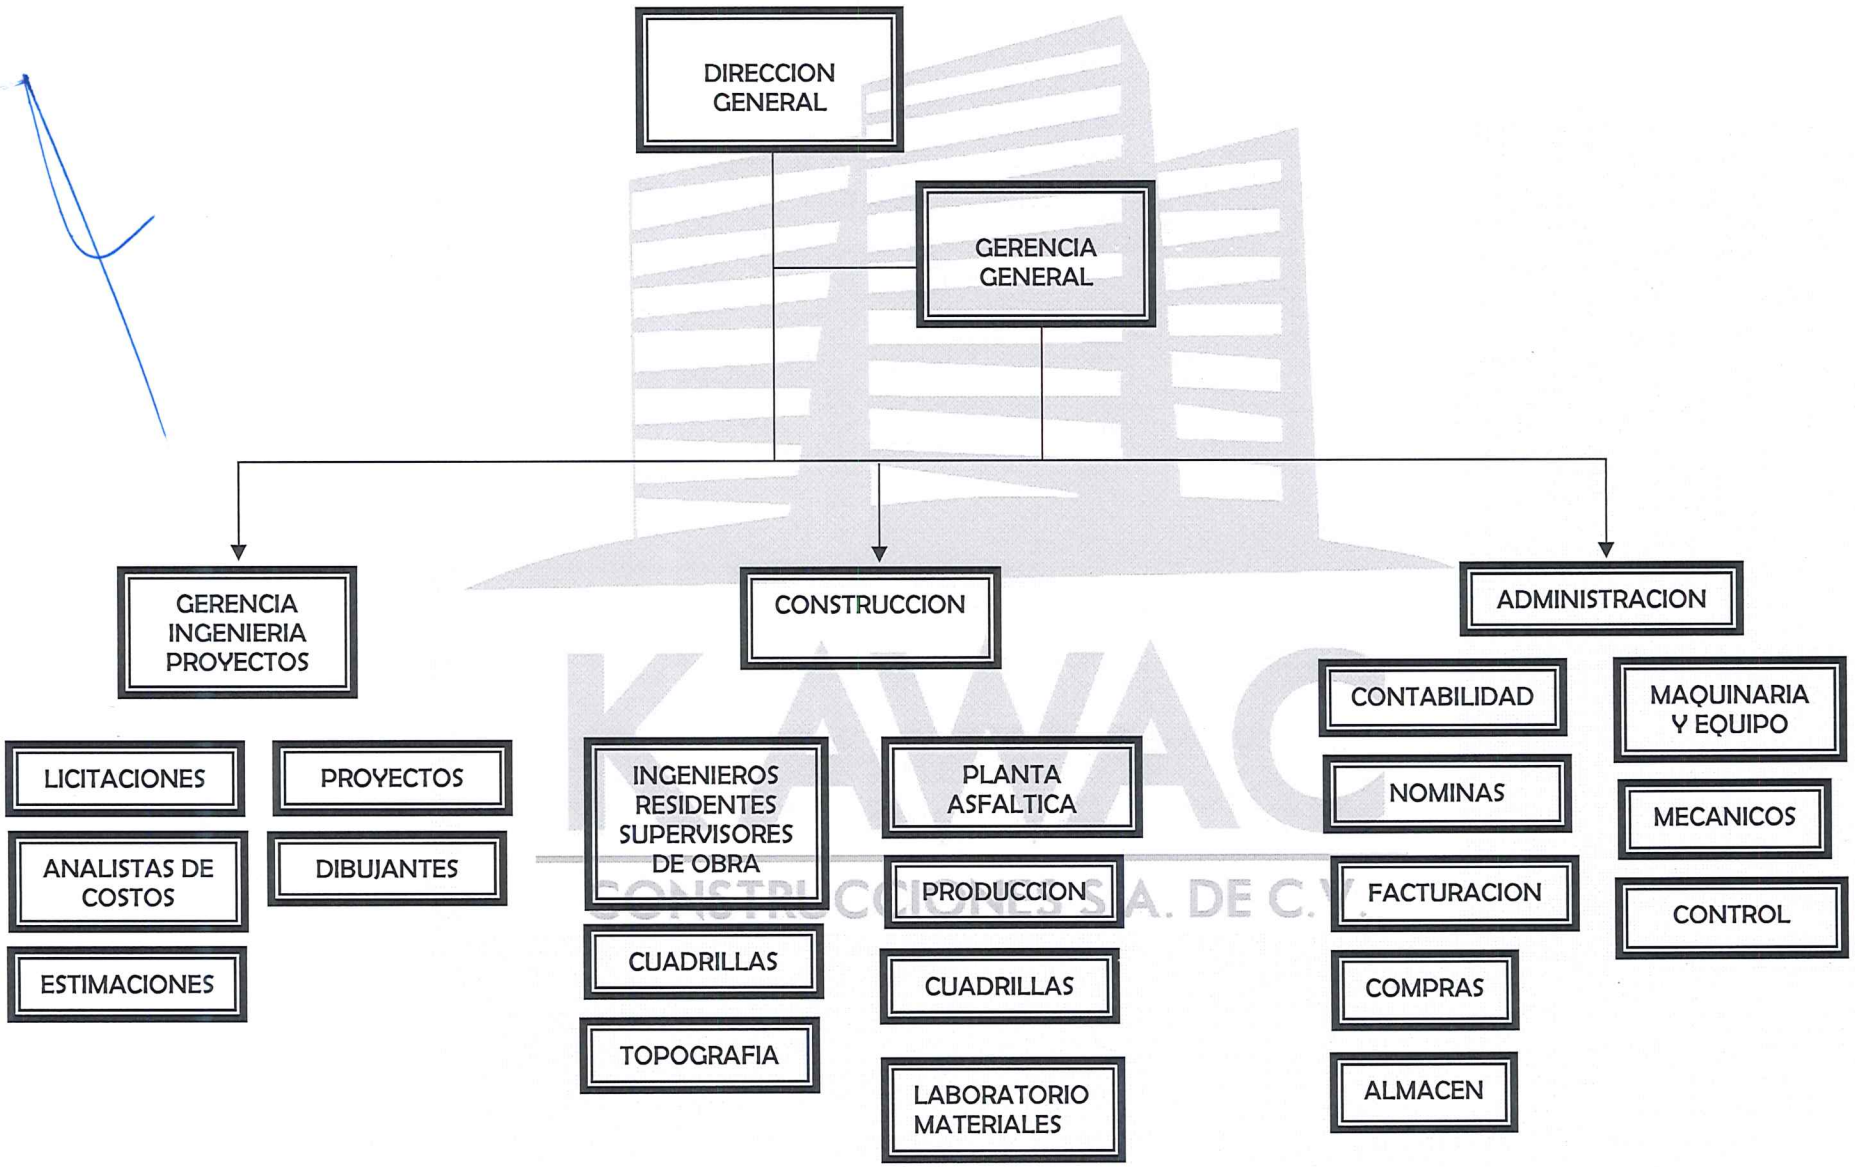

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACION	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
PARTICULAR	TRABAJOS DE ACABADOS FINALES EN CASA HABITACION	MATAMOROS, TAMAULIPAS	13/12/11 – 13/02/12	$ 120,963.62	PRIVADO	FINIQUITADO
PARTICULAR	IMPERMEABILIZACION Y DEMOLICION DE CONSTRUCCION EN SEGUNDO PISO CASA HABITACION	MATAMOROS, TAMAULIPAS	12/12/11 – 30/12/11	$ 72,380.28	PRIVADO	FINIQUITADO
PARTICULAR	CONSTRUCCION DE RECAMARA Y BAÑO COMPLETO EN CASA HABITACION	MATAMOROS, TAMAULIPAS	30/01/12 – 27/02/12	$ 88,411.88	PRIVADO	FINIQUITADO
PARTICULAR	TRABAJOS DE ACABADOS FINALES EN CASA RESIDENCIAL	MATAMOROS, TAMAULIPAS	23/01/12 – 20/03/12	$ 131,027.05	PRIVADO	FINIQUITADO
CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN PARQUE INDUSTRIAL FINSA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	14/12/11 – 18/04/12	$ 300,000.00	PRIVADO	FINIQUITADO
CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EN PLAYA BAGDAD	PLAYA BAGDAD, MATAMOROS, TAMAULIPAS	14/12/11 – 18/04/12	$ 120,000.00	PRIVADO	FINIQUITADO
CONSTRUCCIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	AMPLIACION CARRETERA EL MEZQUITAL 0+000 AL 14+000	CARR. EL MEZQUITAL	23/02/12 - 05/05/12	$3,000,000.00	SUB-CONTRATO SCT ESTADO	FINIQUITADO
DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: E.C.(VICTORIA-MATAMOROS) EL MEZQUITAL (62.0 KM) E.C. (AL MEZQUITAL)-LA PLAYA (1.5 KM) LONG. 63.50 KM PAQUETE 8	CARR. VICTORIA-MATAMOROS-MEZQUITAL	16/03/12 – 31/12/12	$ 2,682,281.90	SUB-CONTRATO GOB. EDO	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-012-2012 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE SAN RAFAEL Y TEXCOCO DE LAGO DE CHAPALA A AV. CANTINFLAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	08/05/12 – 15/06/12	$ 644,507.94	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR EN CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	01/06/12 - 01/07/12	$ 111,000.00	SUB-CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
OMAR ANTONIO VALENCIA RAMOS	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE TLALOC, DE MONTEALBAN A TEOTIHUACAN.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	16/07/12 – 18/08/12	$ 911,504.41	SUB-CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
OMAR ANTONIO VALENCIA RAMOS	PAVIMENTACION ASFALTICA EN ESTACIONAMIENO ES ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	11/07/12 – 15/08/12	$ 314,041.43	SUB-CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
OMAR ANTONIO VALENCIA RAMOS	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE CASTAÑOS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	13/08/12 - 29/09/12	$ 400,581.20	SUB-CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HABITAT-042/2012 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DECENCIA DE DIAG. LA AMISTAD A PINO	MATAMOROS, TAMAULIPAS	04/07/12 – 30/08/12	$ 287,023.38	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HABITAT-006/2012 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EUCALIPTO DE BENITO JUAREZ A ALAMO.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	16/07/12 – 05/09/12	$ 439,791.70	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-037/2012 RED DE ELECTRIFICACION CALLE DAVID JARAMILLO	MATAMOROS, TAMAULIPAS	16/07/12 – 13/09/12	$ 249,391.56	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HABITAT-059/2012 HABILITACION DE EXTERIORES DEL C.D.C. CON LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CALLE SEDUE DE SEGURIDAD PUBLICA A DESARROLLO URBANO	MATAMOROS, TAMAULIPAS	23/07/12 – 20/09/12	$ 148,373.94	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-151/2012 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES BRECHAS DE ACCESO, EJIDOS: LA PALANGANA, POTRERO NUEVO, LOS CARRIZOS, CINCO DE MAYO, LAS BLANCAS, SANTA ADELAIDA Y LA LIBERTAD.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	19/09/12 – 22/11/12	$ 657,318.80	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IE-DS-551-12-I OBRAS DIVERSAS DERIVADAS DE COMPROMISOS DEL EJECUTIVO ESTATAL EN LA ZONA IV: MATAMOROS Y VALLE HERMOSO PAQUETE 7	MATAMOROS, TAMAULIPAS Y VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	22/11/12 – 31/08/13	$ 2,500,000.00	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IE-CA-071-13-D BACHEO Y RETIRO DE ARENA EN LOS CAMINOS: E.C. (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL (62.0 KM) Y E.C. (AL MEZQUITAL) – LA PLAYA (1.5 KM), LONGITUD 63.5 KM, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	18/03/13 – 01/04/13	$ 124,875.00	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-003/2013 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PRAXEDIS GUERRERO DE DIVISION DEL NORTE A PRIMERO DE MAYO.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	24/05/13 – 22/07/13	$ 195,263.03	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-013/2013 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MURCIA DE VALENCIA A MADRID	MATAMOROS, TAMAULIPAS	29/05/13 – 11/08/13	$ 357,167.56	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-037/2013 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DONACIANO GARCIA DE REYES HEROLES A MUÑOZ LERDO	MATAMOROS, TAMAULIPAS	24/05/13 – 22/07/13	$ 114,522.57	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRA$

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-206/2013 RECONSTRUCCION DE CASA DEL PUEBLO.	ESTACION RAMIREZ, MATAMOROS, TAMAULIPAS	30/08/13 – 15/11/13	$ 444,631.48	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	CONTRATO: IO-020000877-N6-2013 CONSTRUCCION DE 4123 M² DE PISO FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM² DE 8 CM DE ESPESOR.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	09/09/13 - 08/11/13	$ 876,551.08	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
INDUSTRIAS TRICON	AMPLIACION DE NAVE INDUSTRIAL TRICON.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	08/11/13 - 20/01/14	$500,000.00	CONTRATO PRIVADO	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IF-CA-243-13-I CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: E.C.(VICTORIA-MATAMOROS) EL MEZQUITAL (62.0 KM) E.C. (AL MEZQUITAL)-LA PLAYA (1.5 KM) LONG. 63.50 KM PAQUETE 2	MATAMOROS, TAMAULIPAS	28/10/13 – 28/12/13	$774,000.00	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IF-FONDEN-369-13-I REHABILITACIÓN DEL CAMINO: E.C. (SAN FERNANDO – SOLEDAD DE LOS PÉREZ) – PASO HONDO, DEL KM. 0+000 AL 21+000. LONGITUD TOTAL 21.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. PAQUETE 38.	SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	17/01/14 - 17/05/14	$3'700,671.32	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
INDAABIN	AUPFNP/006/14 TRABAJOS DE REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO A CONCRETO HIDRAULICO, EN PUENTE INTERNACIONAL DE NUEVO PROGRESO, TAMAULIPAS	NUEVO PROGRESO, TAMAULIPAS	14/04/14 – 14/05/14	$ 508,000.00	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
INDAABIN	AUPFTLC/03/14 REMODELACION DE FACHADA DEL EDIFICIO DE DEPENDENCIAS CONSISTENTE EN RETIRO DE CANCELERIA EXISTENTE Y REMPLAZO POR MUROS DE BLOCK Y CANCELERIA EN VENTANALES EN PUENTE FRONTERIZO TLC LUCIO BLANCO.	LUCIO BLANCO, TAMAULIPAS	01/07/14 – 29/08/14	$ 438,874.41	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
SEDENA	SDN/23798/2014/03 SUMINISTRO DE LAMPARAS EOLICO-SOLARES PARA LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PAVIMENTOS DE RODAMIENTO EN CRUCE VEHICULAR, REMODELACION DE BAÑOS Y LUMINARIAS EN EL PUERTO FRONTERIZO DE MATAMOROS III, TAMPS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	07/10/14 - 26/12/14	$ 1,479,316.39	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
SEDENA	SDN/23798/2014/06 SUMINISTRO DE LAMPARAS EOLICO-SOLARES PARA LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PAVIMENTOS DE RODAMIENTO EN CRUCE VEHICULAR, REMODELACION DE BAÑOS Y LUMINARIAS EN EL PUERTO FRONTERIZO DE MATAMOROS III, TAMPS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	07/10/14 - 26/12/14	$ 828,417.18	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IF-CA-539-14-I CONSERVACION RUTINARIA DE LOS CAMINOS: E.C.(VICTORIA-MATAMOROS) EL MEZQUITAL (62.0 KM) E.C. (AL MEZQUITAL)-LA PLAYA (1.5 KM) LONG. 63.50 KM PAQUETE 10	MATAMOROS, TAMAULIPAS	10/11/14 - 31/12/14	$ 3'099,488.34	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
SEDENA	SDN/23798/2014/07 CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO EN CARPETA ASFALTICA PARA LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PAVIMENTOS DE RODAMIENTO EN CRUCE VEHICULAR, REMODELACION DE BAÑOS Y LUMINARIAS EN EL PUERTO FRONTERIZO DE MATAMOROS III, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	01/12/14 - 15/12/14	$ 510,400.00	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ITIFE-FAMBCO15-I-SOP-0060-2015-0170 CONSTRUCCION Y MOBILIARIO DE 3 AULAS ESTRC. REG. 750 AISLADA + 0.45 M. + CONSTRUCCION DE ANDADOR DE 22.00 X 3.00 M. + 0.30 M. + OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA 70 ML. EN PRIMARIA HIMNO NACIONAL, EJ. LOS ARADOS, MATAMOROS, TAMAULIPAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	04/09/15 - 05/01/16	$ 1,218,385.63	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IF-CA-264-15-I REVESTIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (CARR. PEMEX – POZOS NEJOS) KM. 5.5 - PUERTO LOS ÉBANOS – EL SACRIFICIO, DEL KM. 0+000 AL 12+000, LONGITUD 12.0 KM., MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS, PAQUETE 29	SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	19/10/15 - 17/12/15	$ 1,799,977.58	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-042/2015 RED DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA ETAPA, LOS ANGELES 1	MATAMOROS, TAMAULIPAS	26/11/15 – 23/02/16	$ 845,456.37	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO: LOS VERGELES – LAGUNA MADRE, DEL KM. 21+500 AL KM. 41+500, LONGITUD 20.0 KM., MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.	SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.	04/11/15 – 31/01/16	$ 10,000,000.00	SUB-CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IF-MV-246-16-I MODERNIZACIÓN DE LA AV. DE LAS ROSAS, DE AV. ÁLVARO OBREGÓN A TAMAULIPAS, Y MODERNIZACIÓN DE CALLE LILAS, DE AV. DE LAS ROSAS A TAMAULIPAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	11/08/16 – 06/02/17	$ 9'230,924.82	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
KEMET DE MEXICO SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PLATA KEMET MATAMOROS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	12/08/16 - 12/08/19	$ 10'000,000.00	CONTRATO PRIVADO	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	ACTUAL		CONTRATO MUNICIPAL	EN PROCESO
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	JAD-AR-047/2017 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	11/09/17 – 28/02/18		CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	JAD-AR-048/2017 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	11/09/17 – 28/02/18		CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA	KWC01MX/MEX17/10500 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL Y CANALETA DE AGUAS PLUVIALES EN ESCUELA PRIMARIA RAUL GARATE EN ESTACION RAMIREZ	MATAMOROS TAMAULIPAS	16/10/17 – 16/12/17	$ 507,631.05	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IF-MV-253-17-I PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE QUINTA DE GONZALEZ A BRAVO Y CONSTRUCCION DE EXPLANADA DE CONCRETO ESTAMPADO PARA LA REHABILITACION DE LA AV. ALVARO OBREGON EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS TAMAULIPAS	07/12/17 – 07/18	$ 3'040,802.52	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA Y AMPLIACIÓN DE CARRILES EN AV. JOSE SULEIMAN CHAGNON Y CARRETERA CIUDAD VICTORIA – MATAMOROS CON LIBRAMIENTO NACIONES UNIDAS Y LIBRAMIENTO GUADALUPE VICTORIA.	CARRETERA CD VICTORIA – MATAMOROS	12/01/18 – 10/07/18	$ 7,499,999.74	SUBCONTRATO	FINIQUITADO
INMOBILIARIA LONDER SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE LA CUCHILLA UBICADO EN EL KM. 203+000, DE LA CARRETERA: SALTILLO-TORREÓN, TRAMO EMILIANO ZAPATA – EL MIMBRE, EN EL ESTADO DE COAHUILA.	SALTILLO – TORREON COAHUILA	16/02/18 - 25/07/18	$ 26'492,945.27	SUBCONTRATO	FINIQUITADO
PAVIMENTOS Y CAMINOS LORE SA DE CV	PROGRAMA DE BACHEO Y REENCARPETEO EN MATAMOROS Y VALLE HERMOSO.	MATAMOROS VALLE HERMOSO, MPOS DEL EDO DE TAMAULIPAS	23/03/18 – 21/12/18	$ 50,953,998.49	SUBCONTRATO	FINIQUITADO
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ALIMENTADOR: MATAMOROS – PUERTO MATAMOROS, DEL KM. 52+500 AL KM. 61+140, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	MATAMOROS TAMAULIPAS	02/04/18 – 30/06/18	$28'000,000.00	SUBCONTRATO	FINIQUITADO
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA	KWC01MXMEX18/10044 CONSTRUCCIÓN DE 2 OFICINAS DE COORDINACION, REMODELACIÓN DE SALA DE REUNIONES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, EN LA DELEGACIÓN ESTATAL DE CRUZ ROJA MEXICANA EN ACAPULCO, GUERRERO.	ACAPULCO, GUERRERO	02/04/18 – 20/07/18	$ 1'059,723.24	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	SOP-REY-RAMO 28 RFE-096-2018-LP. REHABILITACIÓN DE COLECTORES (DRENAJES CAÍDOS) EN LOS TRAMOS: CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLES GENERAL LUCIO BLANCO Y JUSTO SIERRA, COLONIA RESERVA TERRITORIAL CAMPESTRE, CALLE RUBÍ ENTRE GAMA Y EMILIO PORTES GIL COLONIA ARCOÍRIS Y CALLE VOLCÁN DEL PARICUTÍN ENTRE CERRO DE PICACHOS Y CERRO DE PADILLA COLONIA ALMAGUER EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REYNOSA, TAMAULIPAS	01/06/18 – 08/09/18	$ 1'032,327.37	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	SOP-REY-FORTAMUN-109-2018-LP. REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTORES (DRENAJE CAÍDO) EN LOS TRAMOS: CALLE HONDURAS, ENTRE CALLES EL SALVADOR Y HONDURAS, COLONIA LA CAÑADA, CALLE ORIENTE 2 ENTRE SUR 2 Y SUR 1 COLONIA LAS CUMBRES, CALLE TACUBAYA ENTRE HUMBOLDT Y NORTE 2, COLONIA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	REYNOSA, TAMAULIPAS	01/06/18 – 08/09/18	$ 696,971.41	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2018-28-CF-A-010-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM. 55+000 AL KM 59+000, CON UNA META DE 4.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	16/07/18 – 14/11/18	$ 14'047,568.22	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2018-28-CB-A-044-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERÍODICA MEDIANTE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, PARA LA FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, BACHEO PROFUNDO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM DEL KM. 297+200 AL KM. 300+200 (2 CUERPOS), TRAMO: SAN FERNANDO – MATAMOROS, CARRETERA: CD. VICTORIA – MATAMOROS, CON UNA META DE 6.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	01/08/18 – 30/11/18	$ 13'399,682.46	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA	KWC01MXMEX18/10368 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, CISTERNA Y CAMBIO DE ACCESOS EN TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA RAUL GARATE EN ESTACION RAMIREZ	MATAMOROS TAMAULIPAS	06/08/18 – 04/11/18	$ 702362.75	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2018-28-CF-A-013-W-00-2018 TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM. 55+000 AL KM 59+000, CON UNA META DE 4.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	MATAMOROS TAMAULIPAS	16/08/18 – 14/11/18	$ 5'183,253.98	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ITIFE-FAMBC018-I-SOP-0047/2018 SUBESTACION ELECTRICA CABLEADO, REHABILITACION EN LOSAS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES 28DPR149M, COL. LAS PALMAS, MATAMOROS, TAMAULIPAS. TERMINACION DE BARDA PERIMETRAL 215.15 M EN JARDIN DE NIÑOS CONSUELO G. DE GUAJARDO 28DJN0071G, COL. PROGRESO, MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS TAMAULIPAS	11/10/18 - 09/03/19	$ 2,564,244.15	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-ODI-003/2018 TRABAJOS DE BACHEOS EN PAVIMENTOS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS TAMAULIPAS	01/11/18 – 30/11/18	$ 892,742.15	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-021/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE WASHINGTON DE CALLE COSTA RICA A AV. LAURO VILLAR, EN COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS TAMAULIPAS	09/11/18 – 08/12/18	$ 1,733,796.40	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FM-010/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DIVISION DEL NORTE (CUERPO SUR) DE ACCION CIVICA A 0+374 HACIA EL ORIENTE	MATAMOROS TAMAULIPAS	07/12/18 – 26/12/18	$ 1,389,050.55	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FM-011/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE LEYES DE REFORMA (CUERPO SUR) DE AV 12 DE MARZO A 0+475 (HACIA EL ORIENTE) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS TAMAULIPAS	07/12/18 – 26/12/18	$ 1,386,376.97	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2019-28-CB-A-011-W-00-2019 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2019, EN 123.96 KM. EQUIVALENTES 13.96 KM. DE LA RED BÁSICA EN CORREDORES, KM. 201+400 AL KM. 109+500, VIADUCTO REYNOSA Y 110.00 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM 0+000 AL KM 110+000, TRAMO TEJÓN – REYNOSA, CARRETERA: TEJÓN-REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	REYNOSA, TAMAULIPAS	01/02/19 – 30/11/19	$ 6,949,345.48	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-002/2019 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NOGALITOS Y MIGUEL HIDALGO DE CASTAÑO A LIMITE NORTE EN LA COLONIA NOGALAR PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	27/02/19 – 12/04/19	$ 2,664,459.39	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2019-28-CF-A-004-W-00-2019, TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM 20+000 AL KM 30+000 CON UNA META DE 10.00 KM EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS; Y EL CAMINO: RAMAL A VALLE HERMOSO – RÍO BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 4+000 CON UNA META DE 4.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	01/04/19 – 31/08/19	$ 13'923,975.22	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-003/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTIVO EN AV. SENDERO NACIONAL DE RIGO TOVAR A 0+418.00 OTE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	04/03/19 – 02/04/19	$2,653,042.72	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-002/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV LAURO VILLAR DE SAN CARLOS A GOBERNACION.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	25/03/19 – 23/04/19	$ 4,843,132.61	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	ITIFE-CIEN17-LP-SOP-016-2019-0019, CONSTRUCCION DE UN TALLER DE PUERICULTURA SIN MOBILIARIO 7 EE ESTR. 715 (U1-C) AISLADO + ANDADOR 12 X 3 M + OBRA EXTERIOR EN ITACE-CECYTE; INSTITUTO TAMAULIPECO DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO 28ETC0006G, FRACC. SAN JAVIER, MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	01/04/19 – 19/06/19	$ 1,878,229.98	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2019-28-CB-A-033-W-00-2019, TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIODICA MEDIANTE RECUPERACION DE 10.0 CM. DE CARPETA EXISTENTE Y CARPETA DE CONCRETO ASFALTICA DE 5.0 CM. DE ESPESOR, DEL KM. 291+200 AL KM. 297+200, TRAMO: SAN FERNANDO-MATAMOROS, CARRETERA: CIUDAD VICTORIA-MATAMOROS, CON UNA LONGITUD DE 6.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	15/04/19 – 31/10/19	$ 22,394,094.05	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-029/2019 RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. LOMA OPRIETA DE AV DIEGO RIVERA A MIGUEL A. RUIZ (INCLUYE EL EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO LOMAS DE SAN JUAN) EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE MATAMROS TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	28/07/19 - 05/09/19	$ 4,320,524.11	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	SEDATU-OP-04-2019 CONSTRUCCION DEL MODULO DEPORTIVO DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN LA CD. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	12/08/19 – 08/03/20	$ 15,979,390.39	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	SEDATU-OP-08-2019 CONSTRUCCION DE UN MODULO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	12/08/19 – 08/03/20	$ 16,136,625.92	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	SEDATU-OP-09-2019 CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA MZA. 6, LOTE 1, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE UNION Y JILGUERO COLONIA 5 DE MARZO, EN LA CD. DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	12/08/19 – 08/03/20	$ 21,517,309.22	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	SEDATU-OP-25-2019 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LAS CALLES: MIGUEL ALEMÁN/MIGUEL HIDALGO DE AV. BENJAMÍN GAONA A MIGUEL DE LA MADRID, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SONORA DE BENJAMÍN GAONA A JESÚS RAMÍREZ, CALLE VICTORIA DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS A CALLE TRES, COL. AMPLIACIÓN LUIS DONALDO COLOSIO Y AMPLIACIÓN REFORMA SUR; CALLE ARCA DE NOÉ DE AVENIDA BENITO JUÁREZ A LÍMITE ORIENTE, CALLE JERUSALÉN DE ARCA DE NOÉ A AV. MANUELCHAPA, CALLE GALILEA DE ARCA DE NOÉ A CALLE LEVI, COL. NUEVA JERUSALÉN; CALLE MANUEL SOLÍS BEJARANO DE BEETHOVEN GALÁN A MIGUEL A. RUÍZ Y CALLE MIGUEL A. RUÍZ DE MANUEL SOLÍS BEJARANO A LOMA BONITA, COL. ABELARDO DE LA TORRE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	30/08/19 – 03/03/20	$ 41,709,361.21	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2019-28-CB-A-048-W-00-2019 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL EN EL KM. 299+520, TRAMO: SAN FERNANDO-MATAMOROS, CARRETERA: CD. VICTORIA – MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	09/09/19 – 07/12/19	$ 6,889,863.09	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2019-28-CB-A-052-W-00-2019 TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA MEDIANTE RENIVELACIONES Y RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, DEL KM. 40+000 AL KM. 47+000, TRAMO: VILLA DE CASAS-SOTO LA MARINA, CARRETERA: CD. VICTORIA-SOTO LA MARINA, CON UNA LONGITUD DE 7.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS	25/10/19 – 09/12/19	$6,999,600.21	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2020-28-CB-A-003-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2020, EN 185.26 KM. EQUIVALENTES; 118.56 KM. DE LA RED BÁSICA EN CORREDORES, KM. 7+000 AL KM. 64+500 Y KM. 73+500 AL KM. 80+000, CARRETERA: MATAMOROS – REYNOSA; KM. 253+900 AL KM. 300+200 CARRETERA: CD. VICTORIA – MATAMOROS; 25.0 KM. DE LA RED BÁSICA, DEL KM. 10+000 AL KM 35+000, TRAMO REYNOSA – DIAZ ORDAZ, CARRETERA: REYNOSA –NUEVO LAREDO Y 41.70 KM. DE LA RED SECUNDARIA, KM. 9+700 AL KM. 37+600, CARRETERA; MATAMOROS – PLAYA LAURO VILLAR, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	MATAMOROS – REYNOSA, VICTORIA – MATAMOROS REYNOSA – NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	02/01/20 – 30/11/20	$ 8,999,217.35	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2020-28-CB-A-023-W-00-2020, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RECUPERACIÓN EN FRIO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS Y CARPETA ASFÁLTICA, CON UNA META DE 6.0 KM, DEL KM. 49+000 AL KM. 55+000, DEL TRAMO: MATAMOROS – RIO BRAVO, DE LA CARRETERA: MATAMOROS – REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	MATAMOROS – RIO BRAVO, MATAMOROS – REYNOSA, TAMAULIPAS	03/02/20 – 02/07/20	$13,295,556.46	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2020-28-CB-A-030-W-00-2020, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO, CON UNA META DE 6.6 KM., DEL KM. 42+500 AL KM. 49+100, DEL TRAMO: T. LAS URRACAS – REYNOSA, DE LA CARRETERA: SAN FERNANDO – REYNOSA.	REYNOSA – SAN FERNANDO, TAMAULIPAS	03/02/20 – 02/07/20	$9,851,372.01	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VH-OP-MUNI-001/2020 CONFORMACIÓN DE BRECHA KM 114 NORTE DE CARRETERA 182 A BRECHA 179, INCLUYE: RECARGUES CON MATERIAL DE BANCO EN AREAS DAÑADAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	03/03/20 – 31/03/20	$ 1,385,831.51	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-011/2020 REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES DE SENDERO NACIONAL A VIAS DE FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS.	24/04/20 – 08/06/20	$ 6,608,802.67	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA SA DE CV	CPR/0001/TAM/MAT/KCO/2020/05 TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO: JIMENEZ – LA LOBA, DEL KM. 1+000 AL KM. 4+500 Y DEL KM, 7+500 AL KM. 14+500, CON UNA META DE 10.50 KM., EN EL MUNICIPIO DE JIMENEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	JIMENEZ, TAMAULIPAS.	15/05/20 - 14/11/20	$ 11,184,765.46	CONTRATO PRIVADO	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2020-28-CF-A-019-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CORREDOR AGRÍCOLA NORTE, DEL KM. 3+500 AL KM. 9+500, CON UNA META DE 6.00 KM., EN EL MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	RIO BRAVO, TAMAULIPAS.	15/05/20 – 14/11/20	$ 8,249,582.85	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-020/2020 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LEALTAD DE HUMANIDAD A TAMAULIOAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS.	22/07/20 - 19/10/20	$ 1,351,333.18	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-CPFPV-002/2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV LAURO VILLAR (CARRILES CENTRALES NORTE Y CARRILES LATERALES NORTE) DE CALLE ARIZONA A (1+480) A KM 2+200 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS.	27/07/20 - 25/08/20	$ 4,742,126.46	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VH-OP-FORTA-AD-005/2020 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL DE COLOR AMARILLO Y/O BLANCO, EN AV. LAZARO CARDENAS DE CALLE AMERICA A AV. LAS PALMAS, EN ESTE MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	14/09/20 - 01/10/20	$ 147,360.08	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ITIFE-FAMMS20-LP-SOP-021-2020-0040 CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE CONCRETO + OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS 28EUT0002Z, CARRETERA A REYNOSA KM. 8.5, MATAMOROS TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS.	21/10/20 - 18/04/21	$ 16,499,552.86	CONTRATO ESTATAL	FINIQUTADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VH-OP-FISM-016/2020 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, EN BRECHA 118 DE CALLE JOSE MARIA MORELOS A CALLE JOS SILVA SANCHEZ, COL. JOSE SILVA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	20/10/20 - 03/12/20	$ 526,439.63	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VH-OP-FISM-019/2020 CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, EN CALLE JOSE SILVA SANCHEZ DE BRECHA 118 A CALLE ING. E. CHAVEZ, COL. JOSE SILVA SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	20/10/20 - 03/12/20	$ 1,005,734.37	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2021-28-CB-A-005-W-00-2021, CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RECUPERACION EN FRIO DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CARPETA ASFALTICA DE ALTO DESEMPEÑO, CON UNA META DE 8.0 KM., DEL KM. 0+000 AL 8+000, DEL TRAMO: LIBRAMIENTO SAN FERNANDO, CARRETERA: CIUDAD VICTORIA-MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	CD VICTORA – MATAMOROS, TAMAULIPAS	15/02/21 - 15/08/21	$ 22,985,222.75	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IF-MV-091-21-P PROGRAMA 2021 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICINES Y BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES, CUARTA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	05/05/21 - 01/10/21	$ 21,599,457.59	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-011/2021 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ACCESO PRINCIPAL DE CARRETERA AL MEZQUITAL A ESCUELA EN LA COLONIA POBLADO HIGUERILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	25/05/21 - 07/08/21	$4,043,286.07	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2021-28-CB-A-037-W-00-2021 CONSERVACIÓN INMEDIATA DE DESYERBE, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, REMOCIÓN DE DERRUMBES Y AFINE DEL DERECHO DE VÍA, EN 123.96 KILÓMETROS EQUIVALENTES (ZONA 4), DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS".	RED FEDERAL (ZONA 4), TAMAULIPAS	01/06/21 - 31/08/21	$1,358,973.81	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-013/2021 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE OBRERO MUNDIAL Y SECCION 16 EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	21/06/21 - 03/09/21	$ 1,818,326.58	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VH-OP-FISM-023/2021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE BUGAMBILIA DE CALLE AZHAR A CALLE ROSAL FRACC. LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	02/08/21 - 15/10/21	$1,187,996.14	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VH-OP-FISM-024/2021 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE NIQUEL DE CALLE CUARTA A CALLE QUINTA, COL. INDEPENDENCIA SUR EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	02/08/21 - 15/10/21	$1,033,097.80	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2021 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. LAURO VILLAR CUERPO SUR DE AV. LAS CULTURAS (3+180) A GREGORIO GARZA FLORES (3+635.8) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	23/08/21 - 21/09/21	$ 5,404,070.84	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	ITIFE-FAMREM20-I-SOP-053-2021-0067 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 20 X 24 M. + EXPLANADA DE 20 X 24 M. EN PRIMARIA FRANKLIN D ROOSEVELT 28DP0456A, ZONA CENTRO, MATAMOROS TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	09/11/21 - 18/03/22	$ 2,510,726.69	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SIS-RP-13/22-CP REHABILITACION DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 1 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	MONTERREY, NUEVO LEON	07/03/22 - 04/06/22	$ 7,299,930.17	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IE-MV-025-22-P PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	24/03/22 - 18/11/22	$ 9,851,044.37	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2022-28-CB-A-001-W-00-2022 ATENCIÓN A UN PUNTO DE CONFLICTO UBICADO EN EL KM. 200+100, TRAMO: T. IZQ. DÍAZ ORDAZ-REYNOSA, CARRETERA: MONTERREY-REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	REYNOSA, TAMAULIPAS	01/04/22 - 29/07/22	$ 5,999,001.94	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IF-MV-065-22-P PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	26/04/22 - 21/12/22	$ 14,772,482.74	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2022-28-CB-A-015-W-00-2022 CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RENIVELACIONES LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO CON UNA META DE 9.0 KM, DEL KM 169+500 AL KM 178+500, TRAMO: MIER-NUEVO LAREDO, CARRETERA: REYNOSA-NUEVO LAREDO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	REYNOSA, TAMAULIPAS	01/05/22 - 30/10/22	$ 15,899,897.28	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-008/2022 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLES DE ACCESO A ESCUELAS EN LOS EJIDOS LA GLORIA, LAS RUSIAS, Y SANTA LIBRADA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS,	MATAMOROS, TAMAULIPAS	13/05/22 - 10/08/22	$ 6,788,831.35	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SIS-RP-30/22-CP REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA (TRAMO I) DE LA AV. IGNACIO MORONES PRIETO A LA CALLE SALTO DEL AGUA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	MONTERREY, NUEVO LEON	30/05/22 - 26/09/22	$ 43,099,938.05	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-016/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TARAHUMARA DE CALLE PLAYA HORNOS A AV. CANTINFLAS (2 CUERPOS), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	30/05/22 - 28/06/22	$6,271,640.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FISMUN-012/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE VICTORIA, DE CALLE ING. SANTIAGO GUAJARDO A CALLE 5 DE MAYO, COLONIA LAS AMERICAS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	13/10/22 - 11/11/22	$459,739.90	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FISMUN-014/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRIMERA DE CALLE ROSALINDA A BOULEVARD AMERICO VILLARREAL COLONIA MEXICO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	13/10/22 - 11/11/22	$368,338.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FISMUN-015/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE CUAUHTEMOC DE CUARTA A SEXTA COLONIA SARH DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	13/10/22 - 11/11/22	$1,309,756.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FISMUN-019/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TAMAULIPAS DE CALLE SEPTIMA A CALLE NOVENA COLONIA LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	14/10/22 - 14/11/22	$1,419,840.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-032/2022 INTRODUCCION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO NOM-002-CONAGUA-2011 CALLE FRANCISCO RINCON ENTRE FERNANDO VILLARREAL Y SAN JAVIER EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	01/11/22 - 30/11/22	$2,813,831.79	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FISMUN-020/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE AMERICA DE BRECHA 118 A CALLE INGENIERO SANTIAGO GUAJARDO COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	04/11/22 - 06/12/22	$1,969,100.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IE-MV-001/2022 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA (LADO PONIENTE) DE DIAGONAL CUAUHTÉMOC A AV. LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. ETAPA 1 (PUENTE VIEJO). REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA (LADO PONIENTE) DE DIAGONAL CUAUHTÉMOC A AV. LEYES DE REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS ETAPA 2 (PUENTE NUEVO).	MATAMOROS, TAMAULIPAS	09/11/22 - 08/03/23	$9,150,087.38	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO

KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY	SIS-RP-71/22-CP ADECUACIÓN EN INTERSECCIÓN VIAL PARA CRUCERO SEGURO EN LA AV. ABRAHAM LINCOLN ENTRE REAL DE CUMBRES Y PASEO DE CUMBRES, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	MONTERREY, NUEVO LEON	09/11/22 - 08/03/23	$7,399,591.80	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-016/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TAMAULIPAS DE NOVENA A CALLE ONCE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	16/11/22 - 23/12/22	$1,096,200.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-018/2022 CONSTRUCCION DE TRAMO DE PAVIMENTO EN CALLE 29 ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	18/11/22 - 25/12/22	$49,590.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-026/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE CALLE INSURGENTES A CALLE REVOLUCION EN POBLADO ANAHUACA MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	05/12/22 - 09/12/22	$ 1,352,850.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-027/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE FUNDADORES DE CARRETERA INDEPENDENCIA A CALLE PROGRESO EN POBLADO ANAHUAC MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	05/12/22 - 09/12/22	$404,077.84	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-031/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE JUAN DE LA TORRE DE CARRETERA 82 A CALLE SATURNINO MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	23/12/22 - 30/12/22	$265,680.90	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-032/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE 19 DE CALLE TAMAULIPAS A CALLE AMERICA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	23/12/22 - 30/12/22	$425,875.80	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-R23-001/2023 REPAVIMENTACION EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE CUARTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS		624,117.98	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-R23-002/2023 REPAVIMENTACION EN CALLE MORELOS DE CALLE PRIMERA A CALLE SEGUNDA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS		$704,552.02	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
CENTRO SCT TAMAULIPAS	2023-28-CB-A-001-W-00-2023 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 327.76 KM EN LAS RUTAS 2, 30, 40, 54 Y 85: RUTA 2, CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO, TRAMO: REYNOSA -CD. MIER, DEL KM 38.0 AL 101.2, LONGITUD 46.7 KM; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO DE CAMARGO, DEL KM 0.0 AL 4.5, LONGITUD 4.5 KM; TRAMO RAMAL A L PTE. INT. DE CAMARGO, DEL KM 3.0 AL 6.8, LONGITUD 3.8 KM; TRAMO RAMAL PASO POR NVA CD. GUERRERO, DEL KM 0.0 AL 3.5, LONGITUD 3.5 KM; TRAMO RAMAL A AEROPISTA NVA. CD. GUERRERO, DEL KM 0.0 AL 2.8, LONGITUD 2.8 KM; TRAMO CD. MIER–T. RUTA 85 (MONTERREY – NUEVO LAREDO), DEL KM 104.3 AL 221.1, LONGITUD 116.8 KM; RUTA 30, CARRETERA PARÁS - NVA. CD. GUERRERO, TRAMO PARÁS (LIM. EDOS N.L./TAM) - NVA. CD. GUERRERO, DEL KM 13.1 AL 30.1, LONGITUD 17.0 KM; RUTA 40, CARRETERA MONTERREY - CD. REYNOSA, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM - REYNOSA, DEL KM 181.05 AL 202.0, LONGITUD 41.9 KM; TRAMO RAMAL AL PTE. INT. REYNOSA - MCALLEN (ANZALDÚAS), DEL KM 0.0 AL 10.376, LONGITUD 16.8 KM; RUTA 54, CARRETERA MONTERREY – CD. MIER, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM - CD. MIER, DEL KM 132.8 AL 155.6, LONGITUD 22.8 KM; RUTA 85, CARRETERA MONTERREY – NVO. LAREDO, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM -NVO. LAREDO, DEL KM 204.52 AL 214.0, LONGITUD 18.96 KM; TRAMO LIBRAMIENTO DE NUEVO LAREDO II, DEL KM 0.0 AL 32.2, LONGITUD 32.2 KM; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	REYNOSA – NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	16/02/23 - 15/12/23	$21,749,734.73	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-005/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HIGUERA ENTRE FRESNO Y PARAISO EN LA COLONIA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	17/04/23 - 15/07/23	$1,307,720.92	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-006/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TOLTECA ENTRE CHICHIMECA Y BIENESTAR Y CALLE CHICHIMECA ENTRE TOLTECA Y EMILIO PORTES GIL EN LA COLONIA VALLE DE ANAHUAC EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	17/04/23 - 15/07/23	$1,515,962.17	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SIS-RP-61/23-CP REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE LA AV. EUGENIO GARZA SADA EN CARRILES PRINCIPALES (TRAMO I) DE RIO LA SILLA A KA AV. IGNACIO MORONES PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	MONTERREY, NUEVO LEON	29/05/23 - 25/09/23	$53,297,749.83	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
INDAABIN COMITÉ DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DEL PUERTO FRONTERIZO GRAL IGNACIO ZARAGOZA MATAMOROS III PUERTO FRONTERIZO MATAMOROS 3	T2B03/25/007/23C REPARACION EN VIALIDADES BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AREA DE CARRILES LIGEROS Y AREAS DE BANQUETAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	07/07/23 - 07/09/23	$1,260,616.02	CONTRATO FEDERAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SIS-FAISMUN-01/23-CP CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	MONTERREY, NUEVO LEON	31/07/23 - 27/11/23	$17,508,211.16	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-016/2023 CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS (1A ETAPA) EN AV. PEDRO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	08/09/23 - 05/03/24	$20,602,677.20	CONTRATO MUNICIPAL	EN PROCESO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-010/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES 1.-HUAMUCHIL DE CALLE 6 DE MARZO A JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (61.00 M.L.) 2. CALLE STA. ALICIA DE CALLE SANTA ALICIA A DREN 20 DE NOVIEMBRE (23.50 M.L.) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	02/10/23 - 29/01/24	$1,857,495.58	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON	SC-PEI-CP-C-OE-09/2023 REHABILITACIÓN DE CAMINO GENERAL ZARAGOZA-LA ENCANTADA DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN.	GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN	12/10/23 - 21/12/23	$6,473,290.68	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SIS-RP-04/24-CP REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE AV. RUIZ CORTINES (PONIENTE – ORIENTE), ENTRE AV. RANGEL FRIAS Y AV. ABRAHAM LINCOLN EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	MONTERREY NUEVO LEON	19/02/24 - 17/07/24	$61,198,468.40	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MAT-OP-REPUVE-027/2023-24 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DEL LIBRAMIENTO EMILIO PORTES GIL DE CALLE FERNANDO VILLARREAL A AVENIDA 12 DE MARZO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+720 DE LAS COLONIAS VILLARREAL, ADOLFO LOPEZ MATEOS, INTEGRACION FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MATAMOROS TAMAULIPAS	22/03/24 - 19/07/24	$8,879,569.22	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VH-OP-R23-004/2024 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 22.5 DE CALLE INDEPENDENCIA A CALLE ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	26/03/24 - 24/05/24	$135,284.58	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VH-OP-R23-005/2024 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE INDEPENDENCIA DE CALLE 22 A CALLE 23 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	26/03/24 - 24/05/24	$ 182,612.21	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VH-OP-R23-006/2024 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 23 ENTRE CARRETERA LUIS ECHEVERIA (82) Y CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	26/03/24 - 24/05/24	$86,696.29	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VH-OP-R23-007/2024 REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE DE LOS CACHORROS ENTRE CALLE DOCTOR LUIS GARCÍA LÓPEZ (TERCERA) Y CALLE QUINTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	26/03/24 - 24/05/24	$606,892.50	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VH-OP-R23-009/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE CACHORROS ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	26/03/24 - 24/05/24	$606,892.50	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VH-OP-R23-010/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE LOS LEONES Y CALLE CACHORROS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	26/03/24 - 24/05/24	$204,761.14	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OPM-VH-002-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 2 DE ABRIL DE CALLE AMERICA A CALLE TAMAULIPAS ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	16/04/24 - 16/05/24	$ 538,464.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OPM-VH-003-2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE 10 ENTRE ZARAGOZA Y MORELOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	16/04/24 - 16/05/24	$ 318,240.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-004/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE VICTORIA DE CALLE ARGENTINA A BRECHA 118 COLONIA UNION EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	14/05/24 - 12/07/24	$ 1,232,712.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-006/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE QUINTA DE CALLE RIO PAPALOAPAN A CALLE RIO NAZAS POBLADO EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	17/05/24 - 15/07/24	$ 369,708.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-007/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE ONCE DE RIO COLORADO A CALLE RIO NAZAS POBLADO EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	17/05/24 - 15/07/24	$ 188,160.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FAISMUN-008/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE QUINCE DE CALLE RIO PAPALOAPAN A BORDO DE CANAL EN POBLADO EL REALITO MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	17/05/24 - 30/06/24	$ 598,986.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SIS-FAISMUN-011/24-CP REHABILITACION DE PAVIMIENTO DE LA CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE ENTRE LAS CALLES VILLAGRAN Y BERNARDO REYES, COLONIA BELLA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	MONTERREY NUEVO LEON	27/05/24 - 15/12/24	$ 9,115,455.76	CONTRATO MUNICIPAL	EN PROCESO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OPM-VH-019/2024 REPAVIMENTACION EN CALLE TERCERA ENTRE CALLE CACHORROS Y CALLE EUSEBIO ELIZALDE DE LA COLONIA CLUB DE LEONES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	03/06/24 - 01/08/24	$318,372.60	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OPM-VH-020/2024 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES DE LA CARRETERA 82 Y BRECHA 123, DE LA CARRETERA 82 Y CALLE J. CASTILLO M., DE LA CARRETERA 82 Y R. GARCIA, DE LA CARRETERA 82 Y S. GUAJARDO, DE LA 82 Y L.G. LOPEZ Y DE LA 82 Y RUBEN MOLINA, TODAS A TOPAS CON CALLE JOSE ROBLES DE LA COLONIA MAGUEYES EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	03/06/24 - 01/08/24	$816,777.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SIS-RP-41/24-CP MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA AV. PROL. RUIZ CORTINES ENTRE LA CALLE 19 DE OCTUBRE Y CALLE DE RENACIMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	MONTERREY NUEVO LEON	17/06/24 - 13/12/24	$ 43,614,330.46	CONTRATO MUNICIPAL	EN PROCESO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-HID-001/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. INGENIERO SANTIAGO GUAJARDO DE AV. LAS PALMAS A CALLE REVOLUCION Y DE CALLE VICTORIA A CALLE MODELO, COL. LOS CONEJOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	03/06/24 - 01/08/24	$ 338,275.20	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-R23-012/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ROSALINDA GUERRERO ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	09/07/24 - 07/08/24	$ 449,105.58	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-R23-013/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE ING. SANTIAGO GUAJARDO EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	09/07/24 - 07/08/24	$ 782,466.96	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-R23-016/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE 24 DE CARRETERA 82 A CALLE ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	09/07/24 - 07/08/24	$ 413,339.85	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-R23-017/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ZAPATA ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	09/07/24 - 07/08/24	$ 132,930.14	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-R23-019/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE GARDENIAS DE BRECHA 119 A CALLE VIOLETA EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	11/07/24 - 09/08/24	$ 1,975,842.18	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-R23-020/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ING. SANTIAGO GUAJARDO ENTRE CALLE AMERICA Y AV. LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	11/07/24 - 09/08/24	$ 261,298.44	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-009/2024 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HIDALGO DE BRECHA 118 A CALLE PRIMERA, COLONIA INDEPENDENCIA NORTE EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	03/09/24 - 02/10/24	$ 340,334.40	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-010/2024 PAVIMENTACION ASFALTICA EN BRECHA 124 DE CALLE SAN LUIS A CALLE PRIVADA NACIONAL, COLONIA SAN LUIS, COLONIA SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	03/09/24 - 02/10/24	$ 1,638,255.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-012/2024 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO CHAPA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, EN COL. AMP. FLORES MAGON, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	05/09/24 - 04/10/24	$ 676,460.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-FORTA-013/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN LA BRECHA 124 DE LA CALLE SAN LUIS A LA CARRETERA 82, COLONIA SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	05/09/24 - 04/10/24	$ 434,160.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
R. AYUNTAMIENTO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	OP-VH-HID-001/2024 REPAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. INGENIERO SANTIAGO GUAJARDO DE AV. LAS PALMAS A CALLE REVOLUCION Y DE CALLE VICTORIA A CALLE MODELO, COL. LOS CONEJOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS.	VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	14/09/24 - 13/10/24	$ 338,275.20	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
CENTRO SICT TAMAULIPAS	2024-28-CB-O-004-W-00-2024 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS EN 364.26 KM, EN LAS RUTAS 101 Y 107; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	TAMAULIPAS	15/11/24 - 28/02/25	$12,950,077.18	CONTRATO ESTATAL	EN PROCESO

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CURRICULUM DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN	FECHAS	MONTO C/IVA	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-CPFPN-001/2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CRUCE PEATONAL A NIVEL EN BLVD MANUEL CAVAZOS LERMA (SUR) DE CALLE 18 DE JULIO A LIB. EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	18/11/24 - 31/12/24	$7,136,280.56	CONTRATO MUNICIPAL	EN PROCESO
R. AYUNTAMIENTO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS	FAISMUN/2024/33021 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "MIGUEL HIDALGO" DE EL POBLADO LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS	RIO BRAVO, TAMAULIPAS	22/11/24 - 19/02/24	$1,821,142.44	CONTRATO MUNICIPAL	EN PROCESO

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Atentamente

Ing. Guillermo Antonio Gonzalez Mancilla
Representante Legal

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquin
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.cor

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

PRINCIPALES CLIENTES

NOMBRE	DIRECCION	TELEFONO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	CALLE SEXTA S/N, CENTRO, 87300 HEROICA MATAMOROS, TAMPS., MÉXICO	868-8108000
MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS	ING. EDUARDO CHÁVEZ, 496, ZONA CENTRO, 87500 VALLE HERMOSO, TAMPS., MÉXICO	894 850 4010
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES TAMAULIPAS	CALLE ALONDRA 109, COL. 7 DE NOVIEMBRE C.P. 87070, CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS	834 1856000
MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON	IGNACIO ZARAGOZA S/N, CENTRO, 64000 MONTERREY, N.L., MÉXICO	81 8130 6565
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	PISO 22, PARQUE BICENTENARIO, C.P. 87020, 87020 CDAD. VICTORIA, TAMPS., MÉXICO	834 1078529
MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS	PLAZA HIDALGO #2, S/N ZONA CENTRO, 88900, RÍO BRAVO, TAMPS., MÉXICO	899-9340011

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Atentamente

Ing. Guillermo Antonio Gonzalez Mancilla
Representante Legal

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 4**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS	N° DE CONTRATO	LUGAR	IMPORTES			FECHA DE TERMINACIÓN
			TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER	

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***DOCUMENTO AT5**.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

(ANEXO MODELO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA* MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
B).- TEXTO	
CONVOCATORIA Nª	*SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.*
FECHA:	*SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA*
LICITACIÓN Nª	*SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.*
REPRESENTANTE LEGAL DE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** *IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)* *PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.*	**DOCUMENTO AT5**
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **30 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: *26 de noviembre de 2025*	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA

miércoles 26 de noviembre de 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)*** de la obra ***PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***
Sobre el particular, YO ***ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V*** . manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.
Igualmente manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA del municipio de MATAMOROS TAM. Proporciono.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y UN PLANO CONSTRUCTIVO
Así mismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Escuela
Ej. Buena Vista C.P. 87314 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823C10
Tel: (868)812 36 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

Obra: REHABILITACIÓN ASFÁLTICA

Ubicación: CALLE DIVISION DEL NORTE LADO NORTE DE ACCION CÍVICA A TOMAS A. EDISON DE LAS COLONIAS LAS PALMAS, ABOLEDAS GUILLERMO GUAJARDO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LARGO 957.26 ANCHO 2.50

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
P.01	Trazo y nivelación.	m2	2,393.15		
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.52 mts.	m3	1,244.44		
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1,617.77		
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	2,393.15		
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00		
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00		
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	1,841.60		
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 45 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	1,313.86		
P.09	Construcción de base de hidráulica de 15 cm de espesor, incluye: suministro, trituracion, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	0.00		
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 7 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	3,398.34		

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Obra: REHABILITACIÓN ASFÁLTICA

Ubicación: CALLE DIVISION DEL NORTE LADO NORTE DE ACCION CÍVICA A TOMAS A. EDISON DE LAS COLONIAS LAS PALMAS, ABOLEDAS GUILLERMO GUAJARDO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LARGO 957.26 ANCHO 2.50

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	3.00		
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	0.00		
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	379.68		
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00		
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	8.00		
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00		
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00		
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00		

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 2024-2027

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Obra: REHABILITACIÓN ASFÁLTICA

Ubicación: CALLE DIVISION DEL NORTE LADO NORTE DE ACCION CÍVICA A TOMAS A. EDISON DE LAS COLONIAS LAS PALMAS, ABOLEDAS GUILLERMO GUAJARDO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LARGO 957.26 ANCHO 2.50

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ml	2,182.61		
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	4,799.38		
P.21	Corte con cortadora de disco diamante en concreto hidraulico, con un espesor de 10 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	957.26		
P.22	Demolicion de Carpeta asfaltica de 5 cm de espesor incluye: corte de contorno con cortadora asfaltica y demolicion con retroexcavadora con martillo rompedor asi como carga mecanica de escombros en camion, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	833.33		
P.23	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza	0.00		
P.23	Demolicion de concreto hidraulico de 10 cm de espesor incluye: demolición con retroexcavadora con martillo rompedor asi como carga mecanica de escombros en camion, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00		

Suma: $ -
16% I.V.A.: $ -
Total: $ -

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 2024 - 2027

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

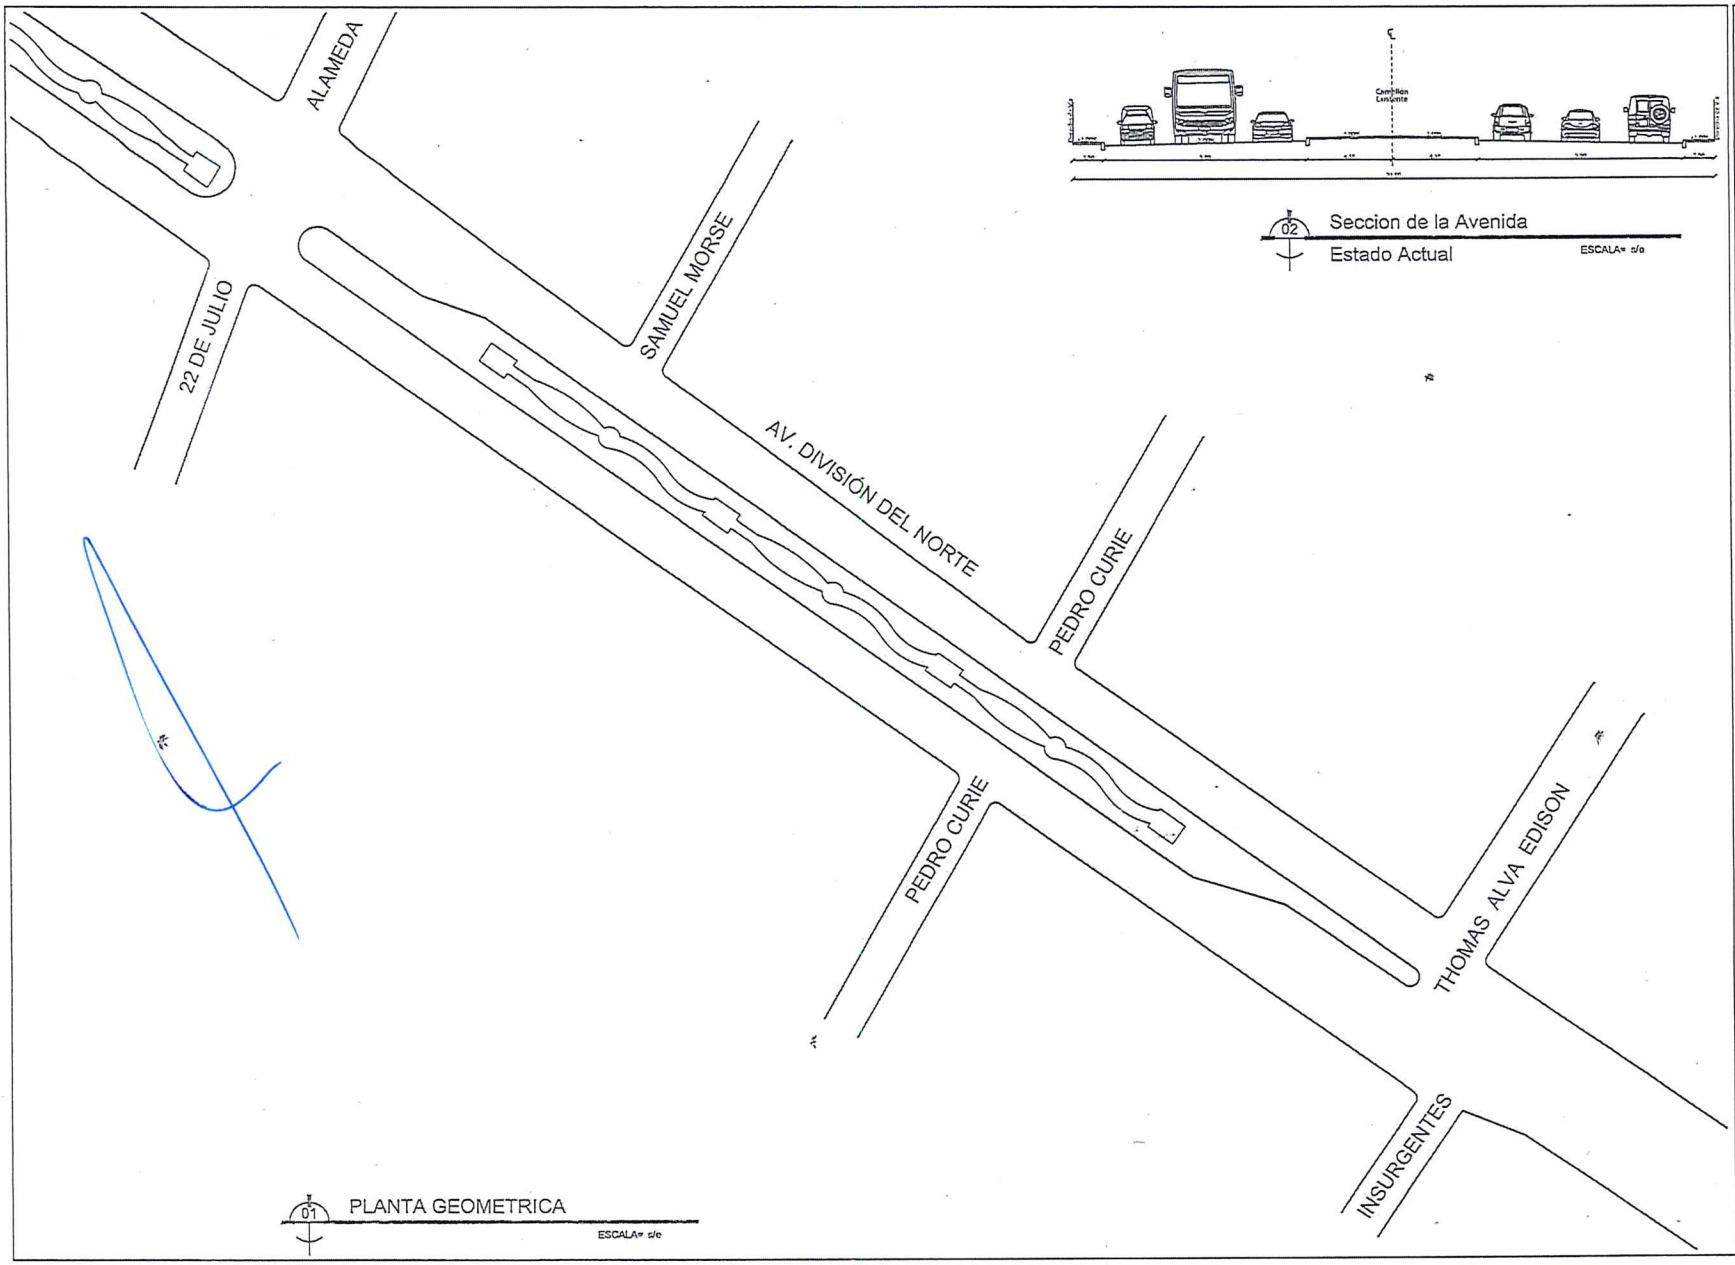

02 Seccion de la Avenida
Estado Actual
ESCALA= s/e

01 PLANTA GEOMETRICA
ESCALA= s/e

Gobierno Municipal de
MATAMOROS

Secretaría de
Desarrollo Urbano
Dirección de
Obras Públicas
Departamento de
Proyectos y Presupuestos

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTAS GENERALES
Y
SIMBOLOGIA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PROYECTO:
AMPLIACION DE CALLES Y AVENIDAS
AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE ALAMEDA A THOMAS ALVA EDISON, COL. LOS FRESNOS, GUILLERMO GUAJARDO, LAS ARBOLEDAS, PROGRESO.

CONTENIDO:
PLANTA GEOMÉTRICA (ESTADO ACTUAL).

AUTORIZO:
REVICO:
PROYECTO:
DIBUJO:
ESCALA: S / E
FECHA:

1c

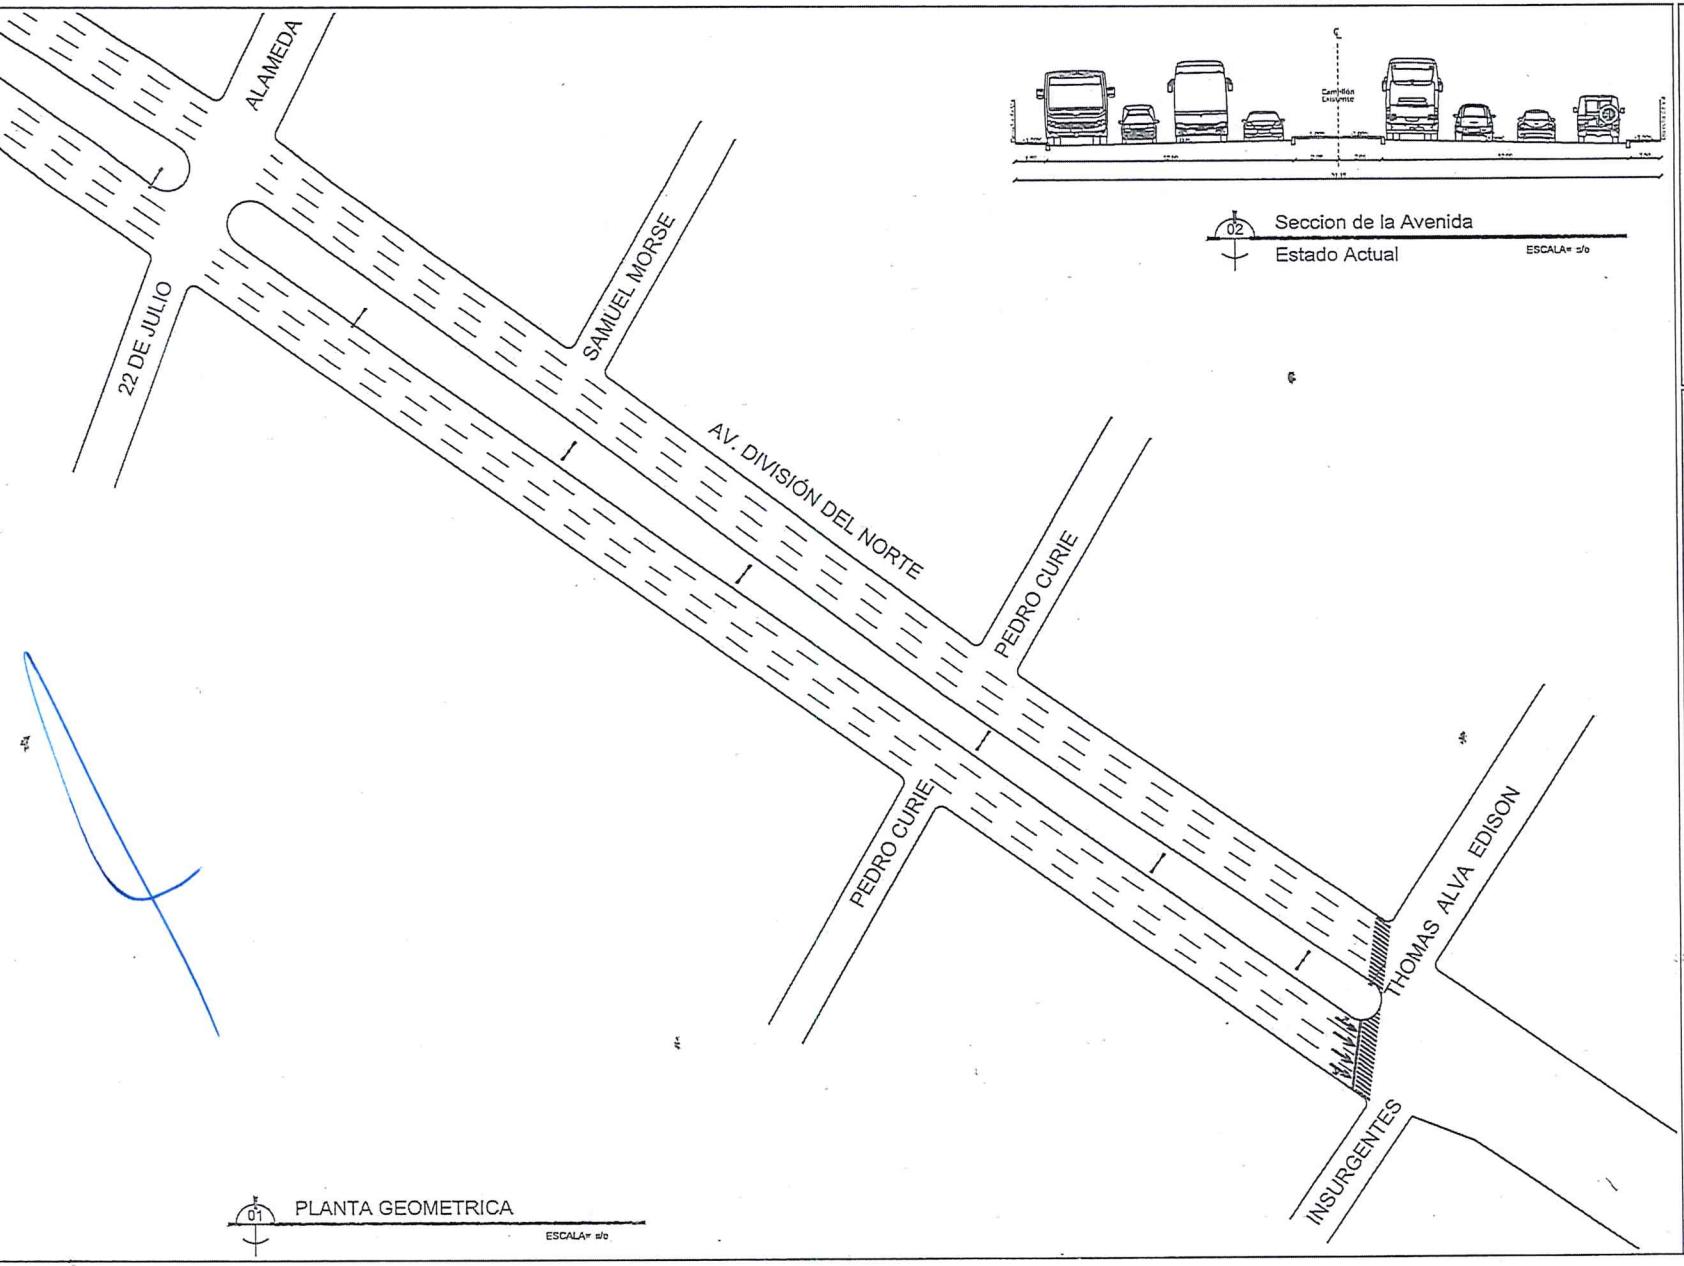

01 PLANTA GEOMETRICA

ESCALA= s/e

02 Seccion de la Avenida
Estado Actual

ESCALA= s/e

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024-2027

Secretaría de
Desarrollo Urbano
Dirección de
Obras Públicas
Departamento de
Proyectos y Presupuestos

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTAS GENERALES
Y
SIMBOLOGIA:

PROYECTO:
AMPLIACION DE CALLES Y AVENIDAS
AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE ALAMEDA A THOMAS ALVA EDISON, COL. LOS FRESNOS, GUILLERMO GUAJARDO, LAS ARBOLEDAS, PROGRESO.

CONTENIDO:
PLANTA GEOMÉTRICA (PROPUESTA).

AUTORIZO:
PROYECTO:
ESCALA: S/E
REVISO:
DIBUJO:
FECHA:

2c

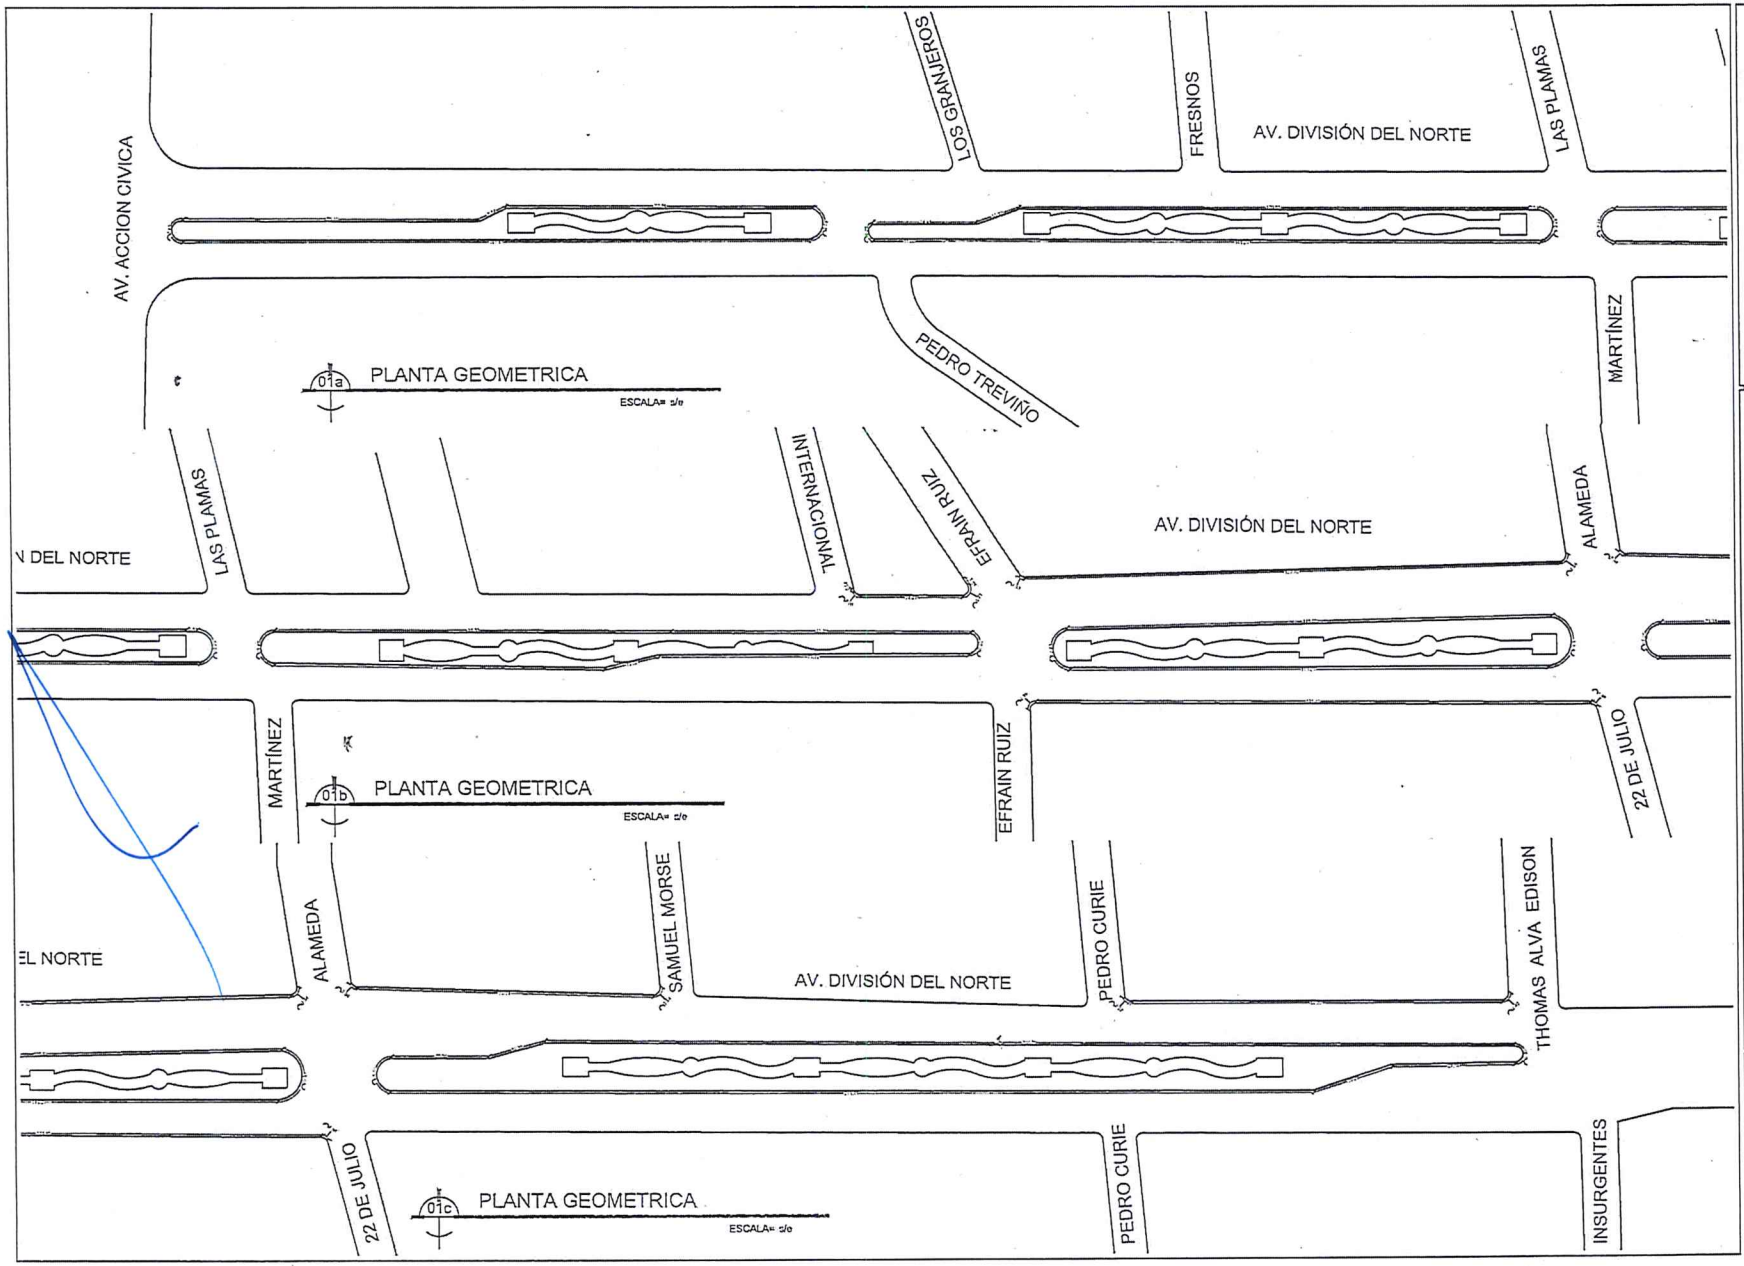

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 - 2027

Secretaría de
Desarrollo Urbano
Dirección de
Obras Públicas
Departamento de
Proyectos y Presupuestos

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTAS GENERALES
Y
SIMBOLOGIA:

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
2024-2027

PROYECTO:
AMPLIACION DE CALLES Y AVENIDAS
AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. ACCION CIVICA A EFRAIN RUIZ
INCLUYENDO LOS CRUCEROS CON LAS CALLES LAS PLAMAS, PEDRO TREVIÑO, MARTÍNEZ, INTERNACIONAL, ALAMEDA, SAMUEL MORSE, PEDRO CURIE, THOMAS ALVA EDISON, 22 DE JULIO, INSURGENTES Y GUADALUPE DE LA PEÑA DE BIBIANO GUERRA.

CONTENIDO:
PLANTA GEOMÉTRICA (DEMOLICIÓN DE CORDONES).

AUTORIZO:	REVISO:	3a
PROYECTO:	DIBUJO:	
ESCALA: S/E	FECHA:	

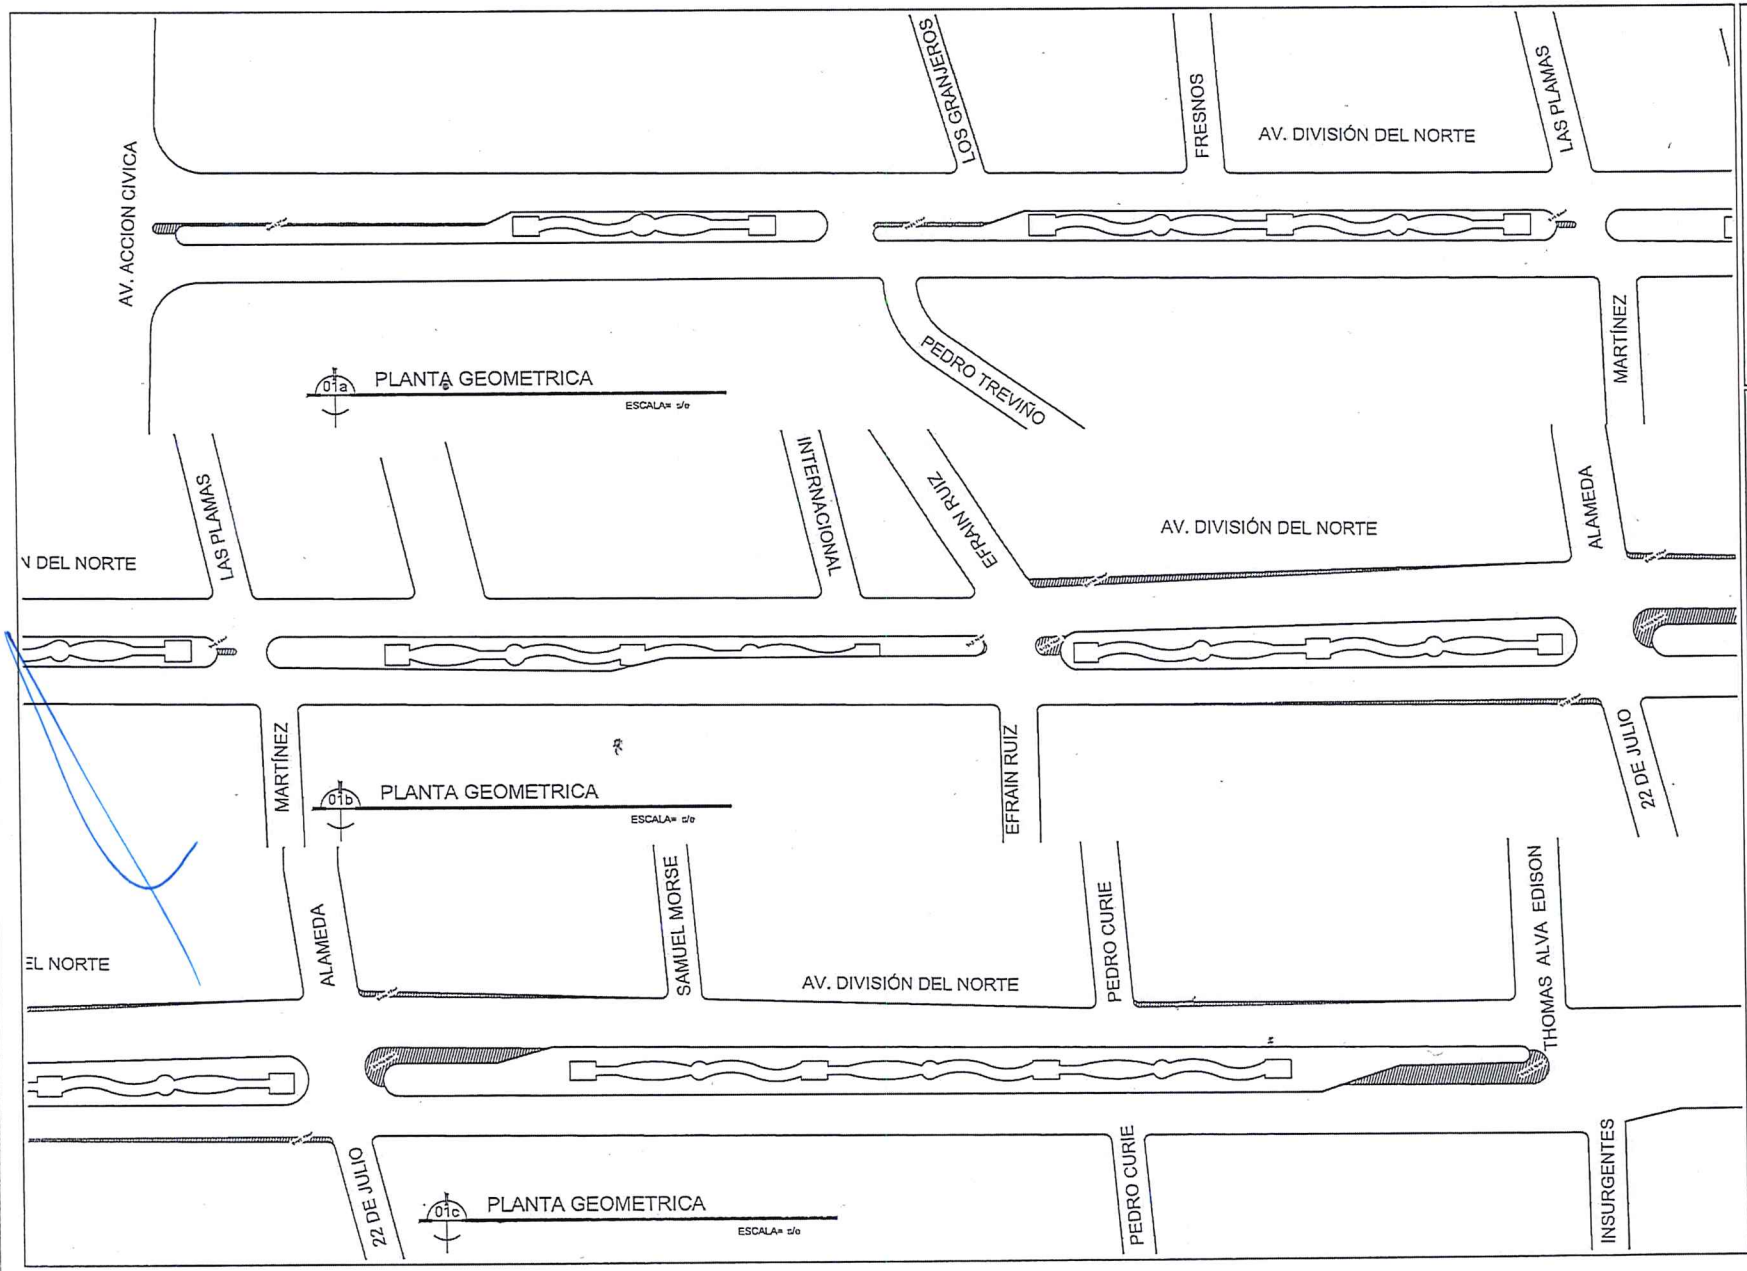

Gobierno Municipal de
MATAMOROS

Secretaria de
Desarrollo Urbano
Dirección de
Obras Públicas
Departamento de
Proyectos y Presupuestos

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTAS GENERALES
Y
SIMBOLOGIA:

PROYECTO: 2024-2027
AMPLIACION DE CALLES Y AVENIDAS
AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. ACCIÓN CÍVICA A AV. EFRAIN RUIZ, AV. EFRAIN RUIZ DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE A AV. 22 DE JULIO, AV. 22 DE JULIO DE AV. EFRAIN RUIZ A AV. INSURGENTES, AV. INSURGENTES DE AV. 22 DE JULIO A AV. PEDRO CURIE, AV. PEDRO CURIE DE AV. INSURGENTES A AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. PEDRO CURIE A AV. THOMAS ALVA EDISON, AV. THOMAS ALVA EDISON DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE A AV. PEDRO CURIE, AV. PEDRO CURIE DE AV. THOMAS ALVA EDISON A AV. SAMUEL MORSE, AV. SAMUEL MORSE DE AV. PEDRO CURIE A AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. SAMUEL MORSE A AV. ALAMEDA, AV. ALAMEDA DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE A AV. 22 DE JULIO, AV. 22 DE JULIO DE AV. ALAMEDA A AV. MARTÍNEZ, AV. MARTÍNEZ DE AV. 22 DE JULIO A AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. MARTÍNEZ A AV. LAS PLAMAS, AV. LAS PLAMAS DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE A AV. PEDRO TREVIÑO, AV. PEDRO TREVIÑO DE AV. LAS PLAMAS A AV. FRESNOS, AV. FRESNOS DE AV. PEDRO TREVIÑO A AV. LOS GRANJEROS, AV. LOS GRANJEROS DE AV. FRESNOS A AV. ACCIÓN CÍVICA, AV. ACCIÓN CÍVICA DE AV. LOS GRANJEROS A AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. ACCIÓN CÍVICA A AV. LAS PLAMAS, AV. LAS PLAMAS DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE A AV. INTERNACIONAL, AV. INTERNACIONAL DE AV. LAS PLAMAS A AV. EFRAIN RUIZ, AV. EFRAIN RUIZ DE AV. INTERNACIONAL A AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. EFRAIN RUIZ A AV. ALAMEDA, AV. ALAMEDA DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE A AV. MARTÍNEZ, AV. MARTÍNEZ DE AV. ALAMEDA A AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. MARTÍNEZ A AV. EFRAIN RUIZ, AV. EFRAIN RUIZ DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE A AV. MARTÍNEZ, AV. MARTÍNEZ DE AV. EFRAIN RUIZ A AV. ALAMEDA, AV. ALAMEDA DE AV. MARTÍNEZ A AV. SAMUEL MORSE, AV. SAMUEL MORSE DE AV. ALAMEDA A AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. SAMUEL MORSE A AV. PEDRO CURIE, AV. PEDRO CURIE DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE A AV. INSURGENTES, AV. INSURGENTES DE AV. PEDRO CURIE A AV. 22 DE JULIO, AV. 22 DE JULIO DE AV. INSURGENTES A AV. EFRAIN RUIZ, AV. EFRAIN RUIZ DE AV. 22 DE JULIO A AV. THOMAS ALVA EDISON, AV. THOMAS ALVA EDISON DE AV. EFRAIN RUIZ A AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. THOMAS ALVA EDISON A AV. PEDRO CURIE, AV. PEDRO CURIE DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE A AV. 22 DE JULIO, AV. 22 DE JULIO DE AV. PEDRO CURIE A AV. EFRAIN RUIZ, AV. EFRAIN RUIZ DE AV. 22 DE JULIO A AV. ALAMEDA, AV. ALAMEDA DE AV. EFRAIN RUIZ A AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. ALAMEDA A AV. MARTÍNEZ, AV. MARTÍNEZ DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE A AV. PEDRO TREVIÑO, AV. PEDRO TREVIÑO DE AV. MARTÍNEZ A AV. LAS PLAMAS, AV. LAS PLAMAS DE AV. PEDRO TREVIÑO A AV. DIVISIÓN DEL NORTE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE AV. LAS PLAMAS A AV. FRESNOS, AV. FRESNOS DE AV. DIVISIÓN DEL NORTE

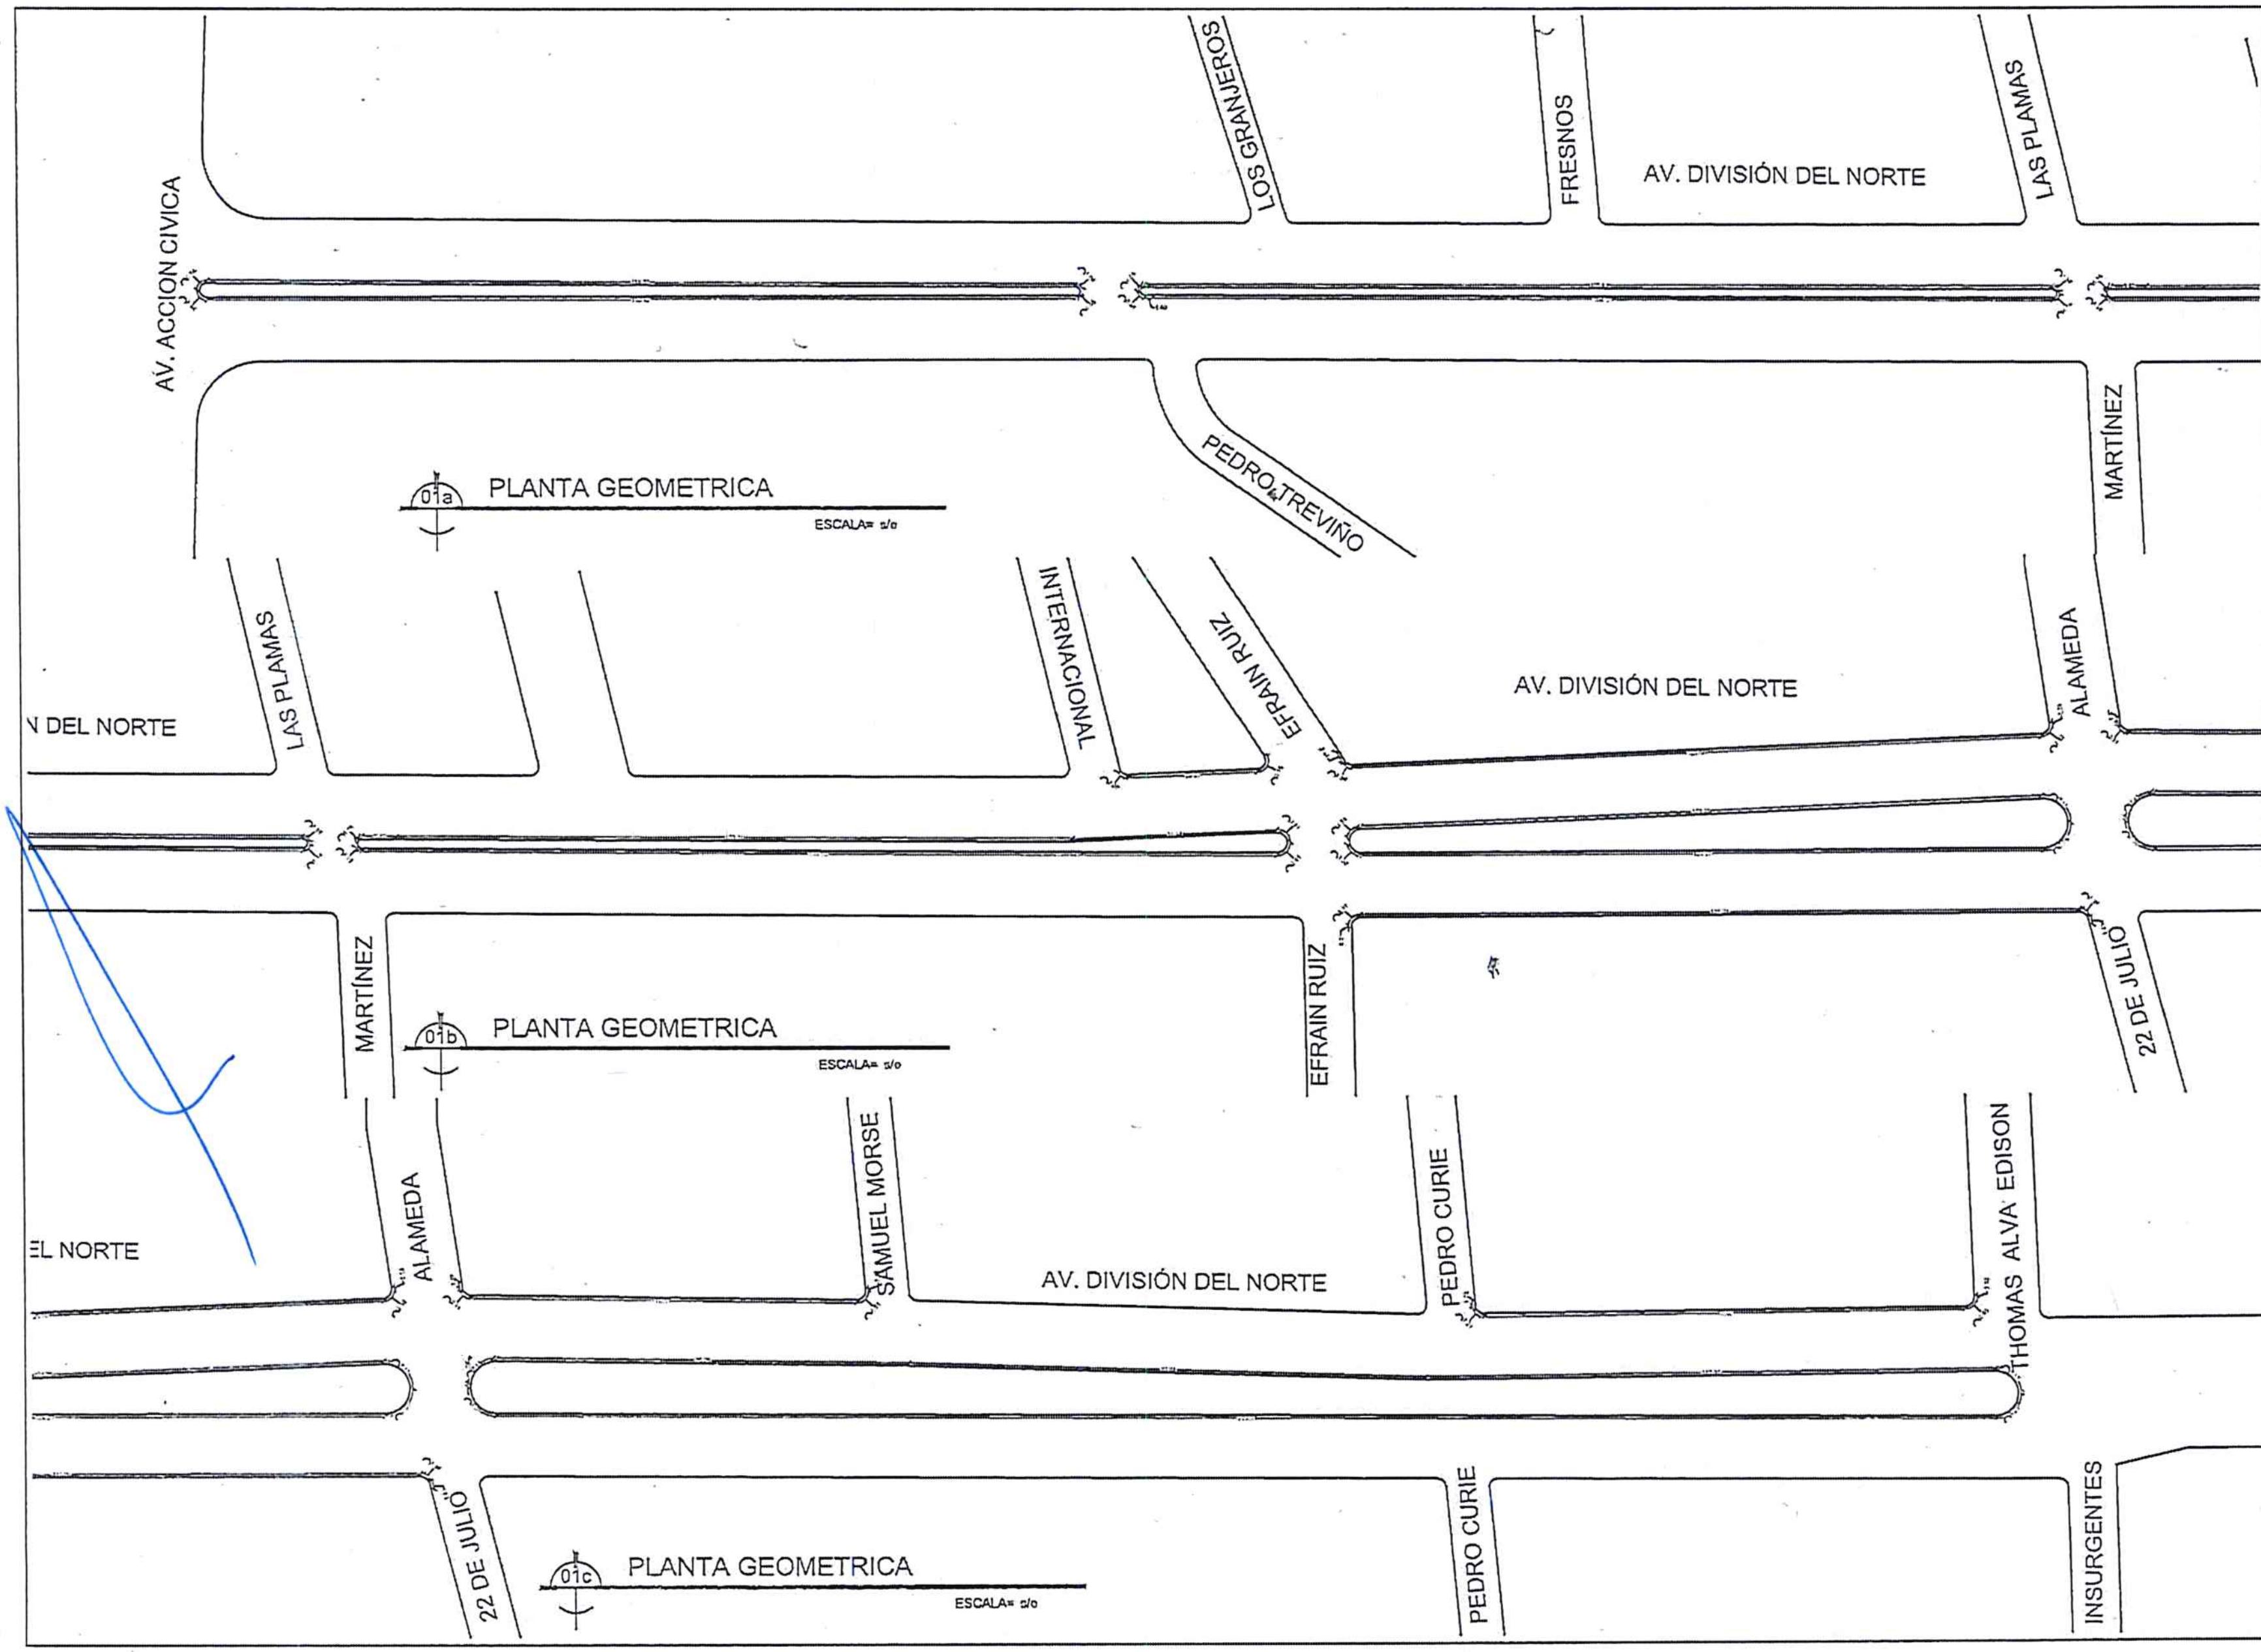

Gobierno Municipal de MATAMOROS

Secretaría de Desarrollo Urbano

Dirección de Obras Públicas

Departamento de Proyectos y Presupuestos

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTAS GENERALES
Y
SIMBOLOGIA:

DE DESARROLL… ECOLOGÍA

PROYECTO:
AMPLIACION DE CALLES Y AVENIDAS
[illegible]

CONTENIDO:
PLANTA GEOMÉTRICA (CONSTRUCCIÓN DE CORDONES).

AUTORIZO:
PROYECTO:
ESCALA: S/E
REVISO:
DIBUJO:
FECHA:

4a

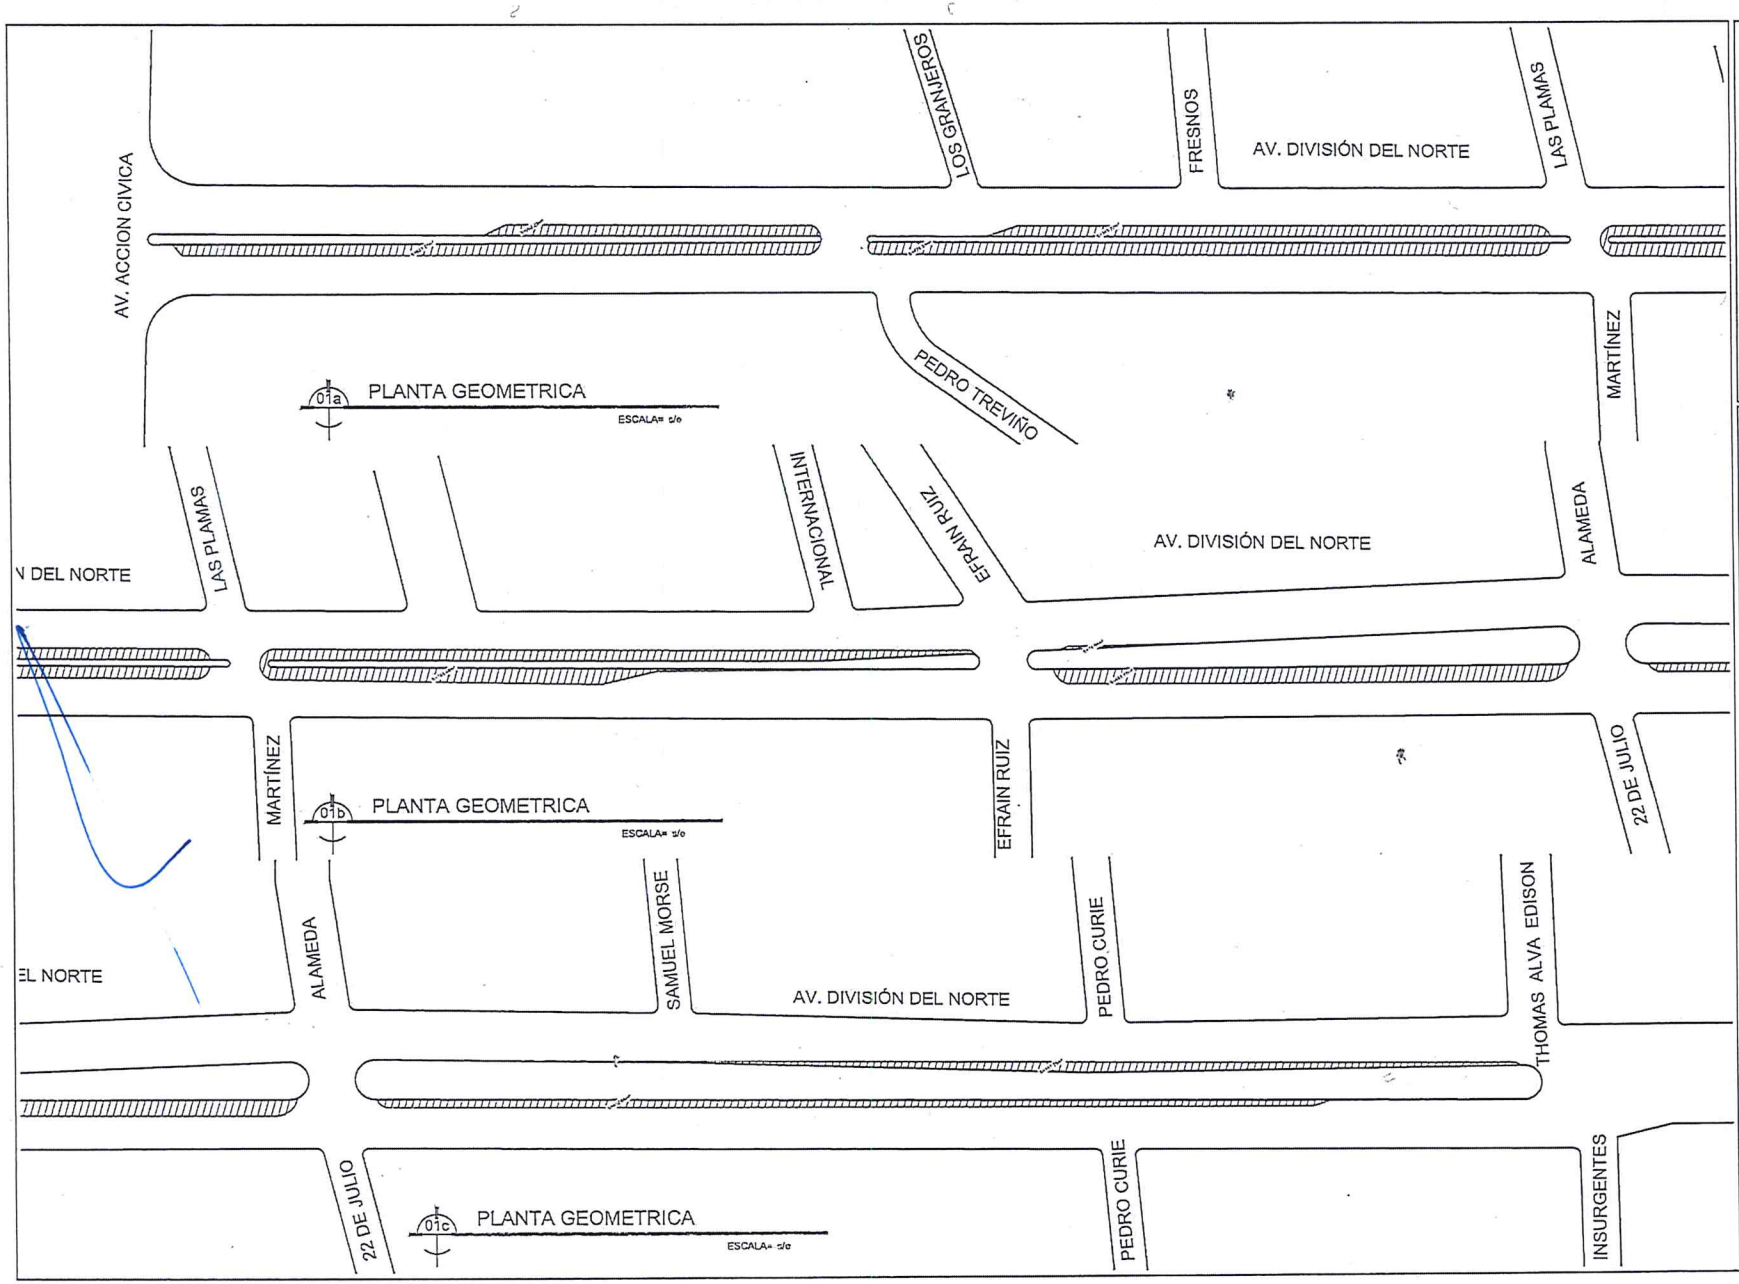

Gobierno Municipal de
MATAMOROS

Secretaría de
Desarrollo Urbano
Dirección de
Obras Públicas
Departamento de:
Proyectos y Presupuestos

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTAS GENERALES
Y
SIMBOLOGIA:

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
2024-2027

PROYECTO:
AMPLIACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS
AV. DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE AV. ACCIÓN CÍVICA Y AV. TRINIDAD LAGUERA EN LA COLONIA LOMAS DEL REAL DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

CONTENIDO:
PLANTA GEOMÉTRICA (CONSTRUCCIÓN DE CARPETA).

AUTORIZO:	REVISO:	
PROYECTO:	DIBUJO:	4b
ESCALA: S/E	FECHA:	

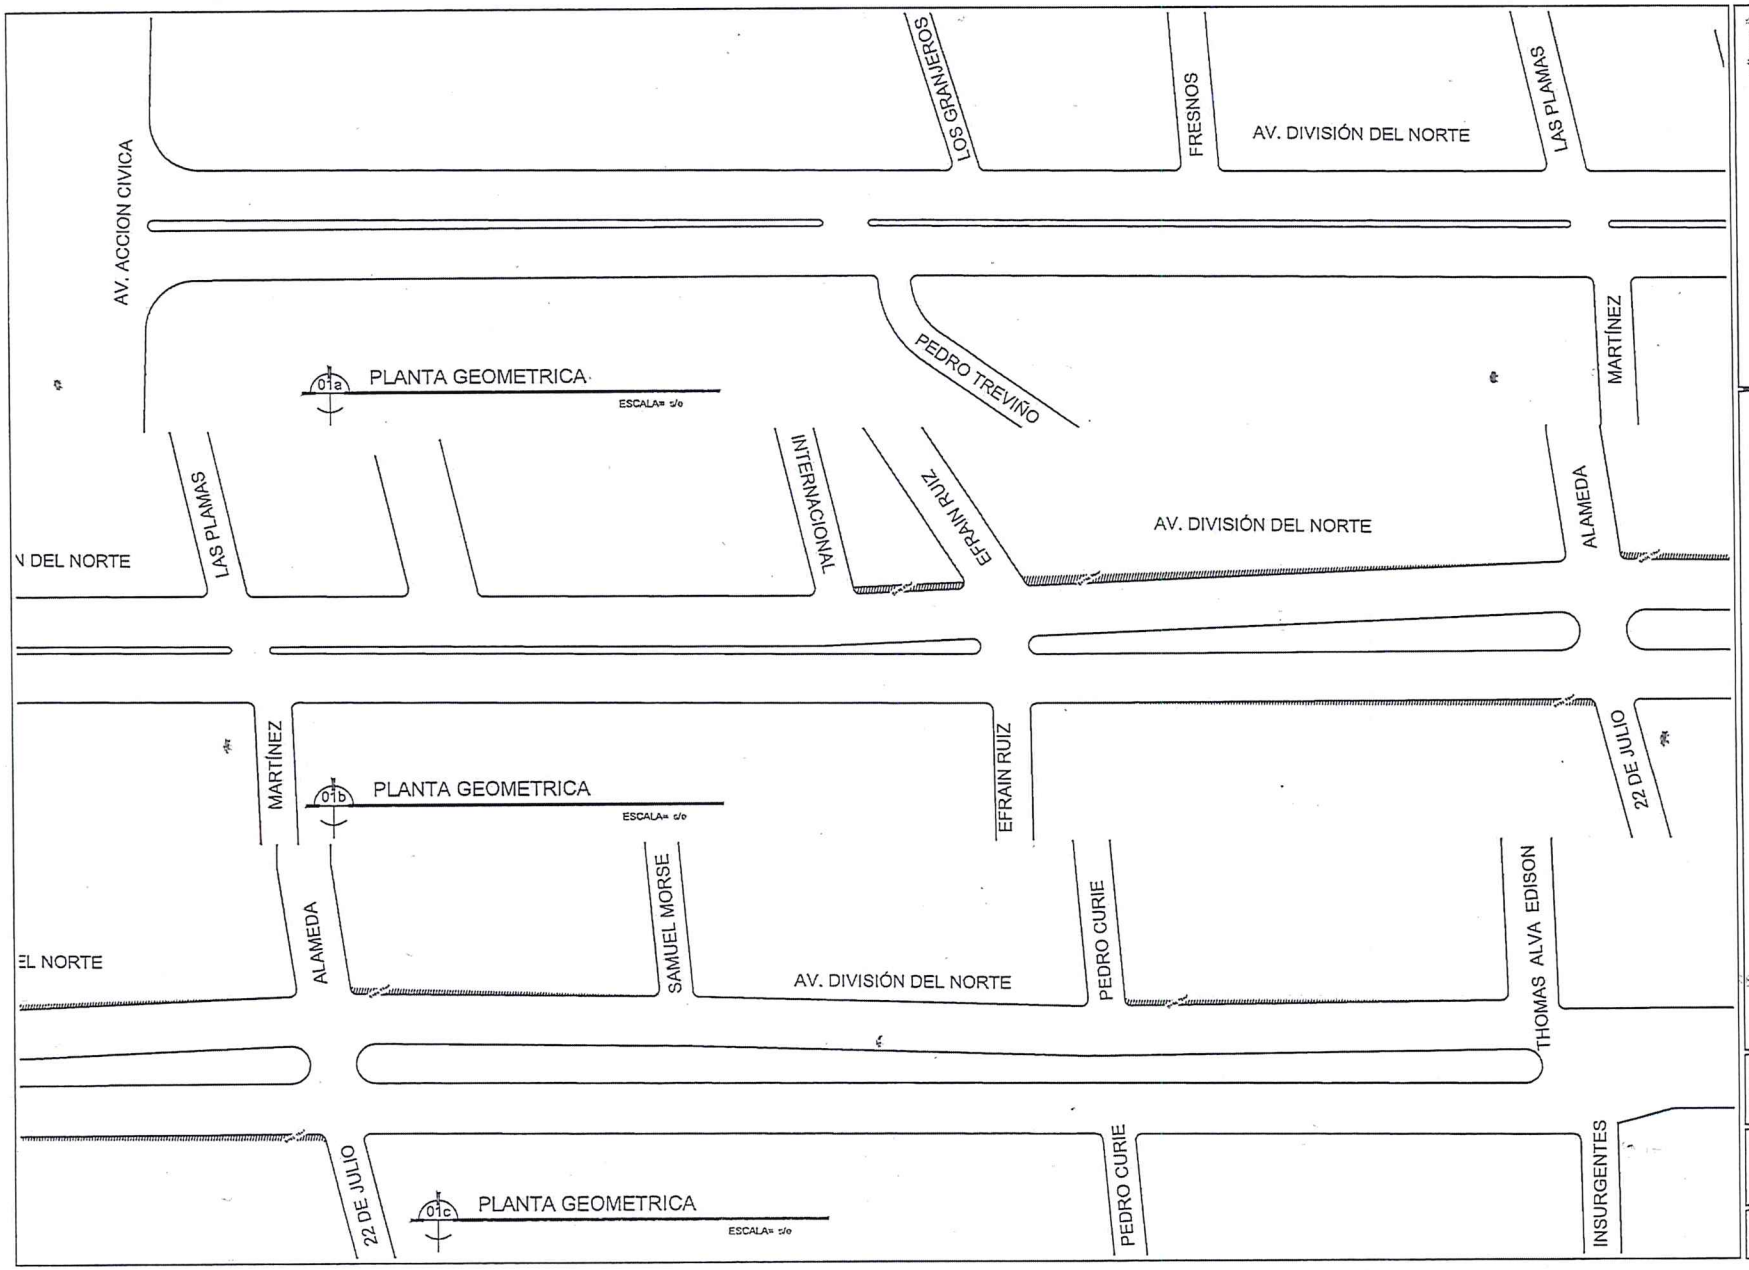

Gobierno Municipal de
MATAMOROS

Secretaría de
Desarrollo Urbano
Dirección de
Obras Públicas
Departamento de
Proyectos y Presupuestos

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTAS GENERALES
Y
SIMBOLOGIA:

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PROYECTO:
AMPLIACION DE CALLES Y AVENIDAS
AV. EMPEDRADO DE ADOQUIN DE ACUERDO A LA CIVICA CON BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, ESTACIONAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO.

CONTENIDO:
PLANTA GEOMÉTRICA (CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS).

AUTORIZO:	REVISO:	4c
PROYECTO:	DIBUJO:	
ESCALA: S/E	FECHA:	

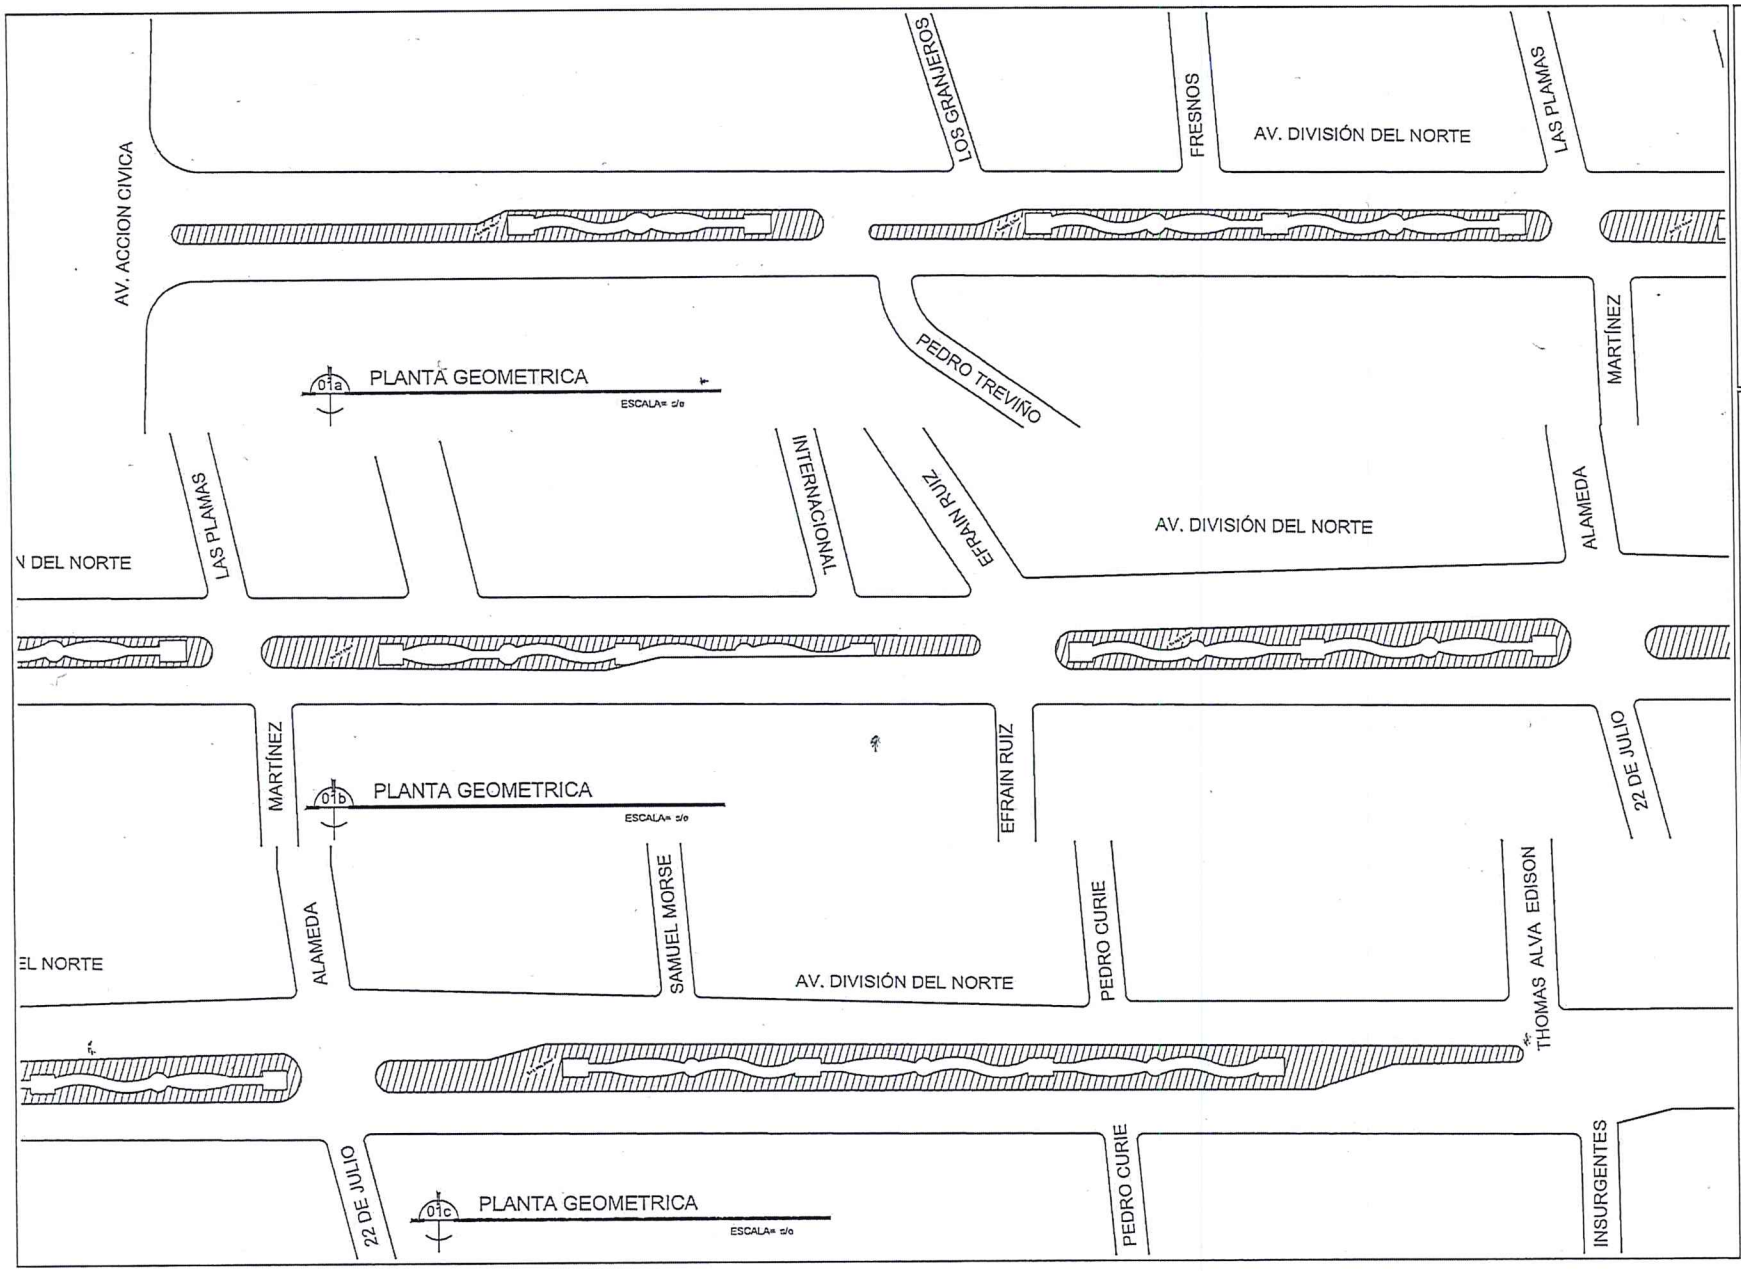

Gobierno Municipal de
MATAMOROS

Secretaría de
Desarrollo Urbano
Dirección de
Obras Públicas
Departamento de
Proyectos y Presupuestos

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTAS GENERALES
Y
SIMBOLOGIA:

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
2024-2027

PROYECTO:
AMPLIACION DE CALLES Y AVENIDAS
AV. DIVISIÓN DEL NORTE DE ACCIÓN CIVICA A IN TERNACIONAL CON CICLOVIA RENCHA, CAMELLON CON GUAJARDO DE ARBOLADO Y BENGRESO.

CONTENIDO:
PLANTA GEOMÉTRICA (DEMOLICIÓN DE BANQUETAS).

AUTORIZO:	REVISO:	3c
PROYECTO:	DIBUJO:	
ESCALA: S/E	FECHA:	

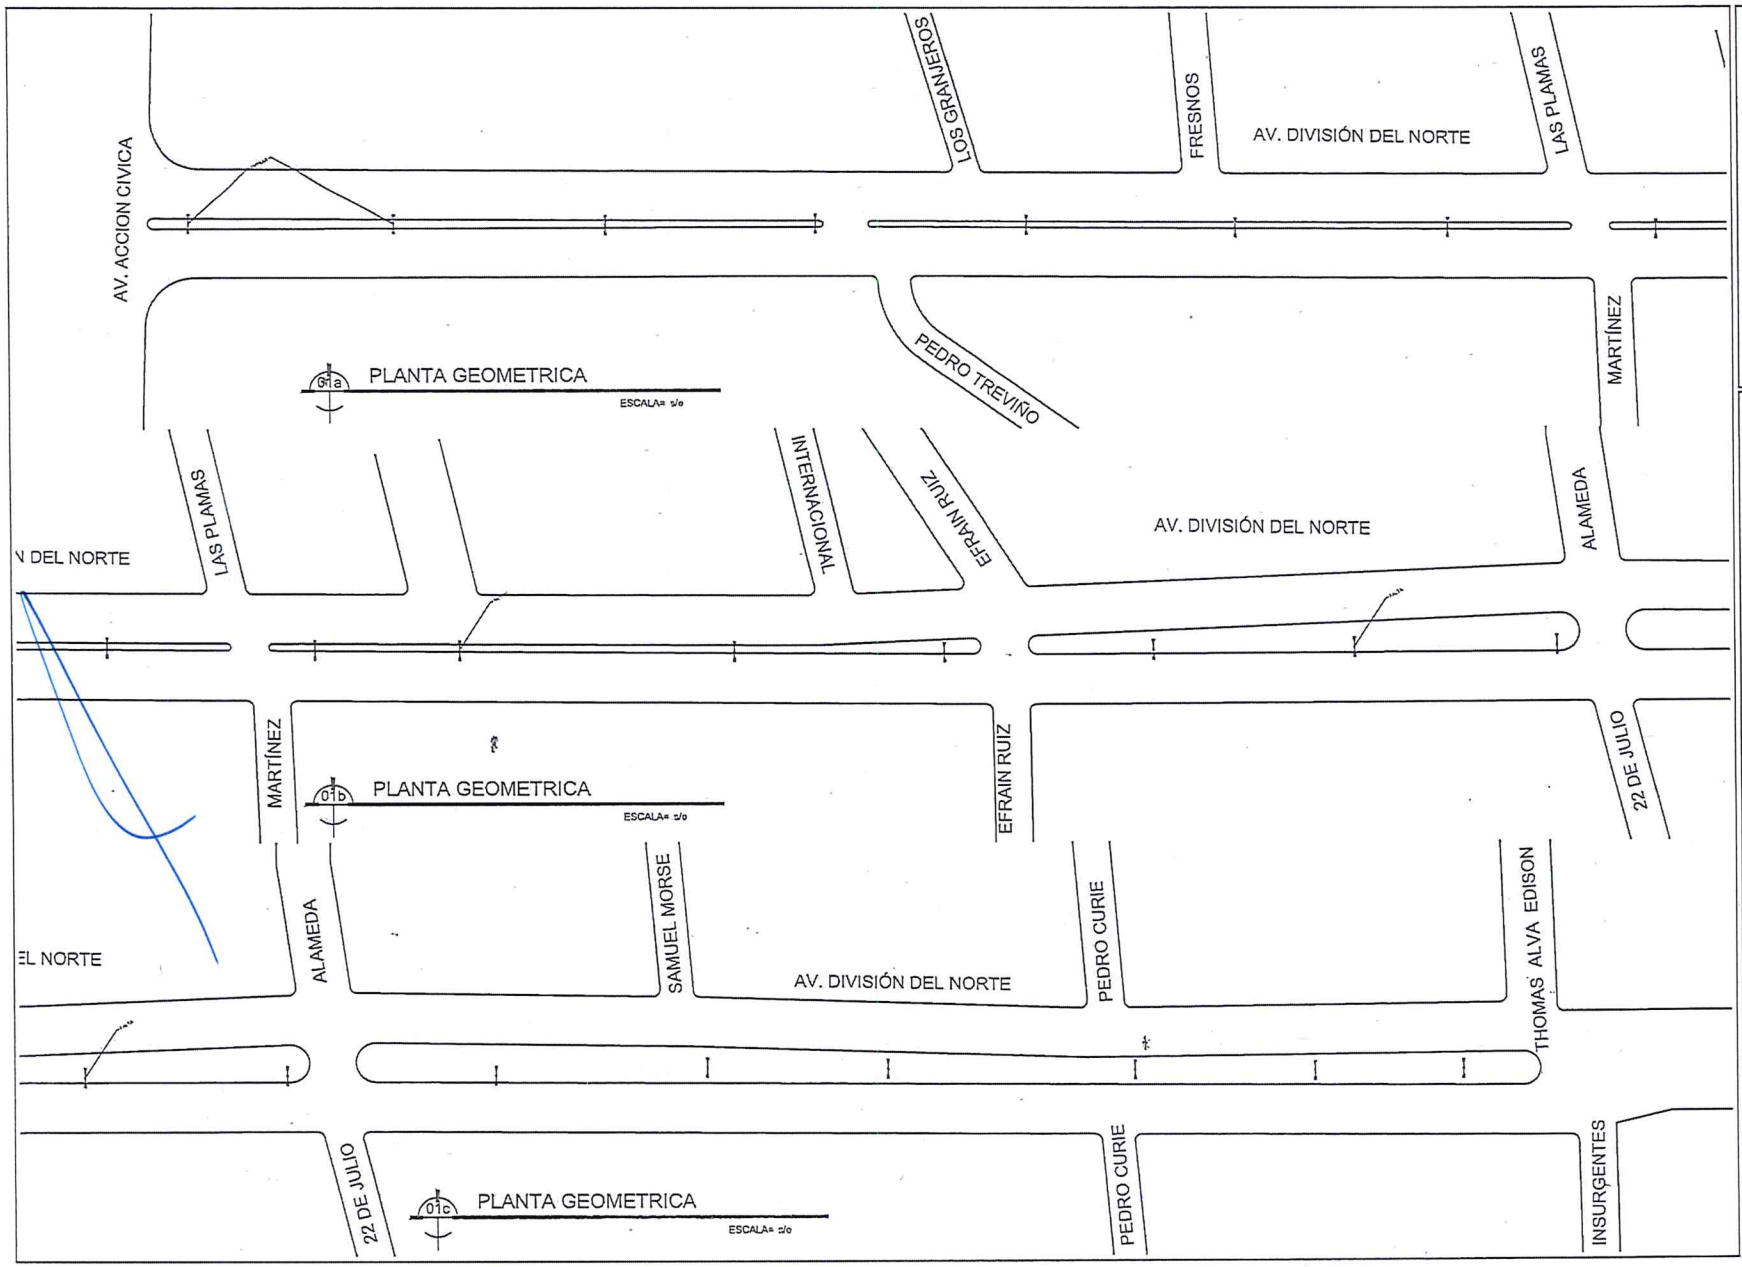

Gobierno Municipal de
MATAMOROS

Secretaría de
Desarrollo Urbano
Dirección de
Obras Públicas
Departamento de:
Proyectos y Presupuestos

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NOTAS GENERALES
Y
SIMBOLOGIA:

PROYECTO:
AMPLIACION DE CALLES Y AVENIDAS
AV. DIVISIÓN DEL NORTE DESDE AV. ACCIÓN CÍVICA HASTA AV. INSURGENTES COL. LOMAS DE SAN JUAN, COL. LAS PALMAS, COL. LOMAS DEL VALLE, COL. GUAJARDO, COL. BALCONES DEL PRADO Y RESD.

CONTENIDO:
PLANTA GEOMÉTRICA (ALUMBRADO).

AUTORIZO:	REVISO:	5
PROYECTO:	DIBUJO:	
ESCALA: S/E	FECHA:	

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			***LICITACIÓN N°:*** ***DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:***	***DOCUMENTO AT 5***
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	***FIRMA DEL LICITANTE***	***PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***	***FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:***	***HOJA: DE:***

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA

LUGAR Y FECHA:

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. _____ Relativa a los trabajos: _____.

Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las bases de Licitación, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la Licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas Proporciono.

(Anotar la relación de planos, normas de calidad y especificaciones que se entregan.)

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: El proponente deberá presentar planos y especificaciones del proyecto que le proporciono Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debidamente firmadas.

La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT6*.- MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** *IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)* *PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.*	**DOCUMENTO AT6**
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **30 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***26 de noviembre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ

miércoles 26 de noviembre de 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)*** de la obra ***PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

No se subcontratará parte alguna de la obra

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esmeralda
Col. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1109236T0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SEÑALARÁ LO SIGUIENTE: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; LOS MATERIALES QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE. ASIMISMO, DETALLARÁ EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE Y MANIFESTARÁ CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN.

A). -ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- TEXTO

CONVOCATORIA Nª	SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.
FECHA:	*SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA*
LICITACIÓN Nª	*SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

(GUÍA DE LLENADO)

REPRESENTANTE LEGAL DE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*
EN DONDE DICE:	
MANIFIESTO QUE LA SEDUE	*SE ANOTARÁ SI AL LICITANTE SE LE PROPORCIONAN O NO MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI NO SE PROPORCIONAN MATERIALES, EL PÁRRAFO DEBERÁ ELIMINARSE. .*
EN DONDE DICE:	
ASÍ COMO HABER ASISTIDO...	*SE ANOTARÁ SI SE ASISTIÓ O NO SE ASISTIÓ A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.*
EN DONDE DICE:	
CONTENIDO NACIONAL DE CUANDO MENOS EL	*SE ANOTARÁ EL PORCENTAJE REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN O DE INVITACIÓN, QUE DEBERÁ SATISFACERSE. ESTE PORCENTAJE PODRÁ SER DE, CUANDO MENOS, EL 50% O EL CORRESPONDIENTE A LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PUBLICADO EL 03 DE MARZO DE 2000 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** ***IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)*** ***PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT7**
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **30 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***26 de noviembre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

miércoles 26 de noviembre de 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)*** de la obra ***PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

NO SE SUMINISTRARÁ NINGUN EQUIPO O MATERIAL DEL EXTRANJERO

Sobre el particular, Manifiesto que la Dirección de Obras Públicas, **NO ME PROPORCIONÓ MATERIAL.**
Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambiéntales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de licitación, así como a ver asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Av. Libramiento Emilio Portes Gil # 166 entre Fernando Villarreal y Escuela
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO1082JC10
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

LICITACION No: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)

DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS .

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs** del día **19 de noviembre de 2025,** estando presentes y partirán de reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicado en Calle Sexta entre González y Morelos s/n tercer piso, zona centro de H. Matamoros, Tam, se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Matamoros y los representantes **de "LOS CONTRATISTAS"** participantes en la Licitación de la obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuya firmas aparecen al calce, para celebrar la **VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS,** misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Invitación a cuando menos 3 personas que se llevó a cabo con fecha de **14 de Noviembre de 2025** de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas, para la ejecución de esta obra se procedió conforme a las bases de la Licitación a celebrar la visita al sitio de los trabajos.

Así mismo se les comunica a todos **"LOS CONTRATISTAS"** que la fecha para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones Técnicas se efectuará el **20 de Noviembre de 2025** a las **13:00 hrs** en este mismo lugar.

Una vez terminada la presente sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

FCO Mz. S.

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

LICITACION No: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)

DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS .

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES:

No.	RAZON SOCIAL	FIRMA
1.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.	FCO M2. S.
2.-	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.	
3.-	CONSTRUCCIONES BECKA 29, S. A. DE C. V.	Reyes

FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO QUIEN ACUDIO A LA VISITA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. José Ramses González Cantú COORDINADOR DE SUPERVISIÓN	
Ing Elder Ivan Hernandez O SUPERVISOR	

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No: **I0-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)**

DESCRIPCION: **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS .**

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **13:00 hrs** del día **20 de Noviembre de 2025,** estando presentes y partirán de reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicado en Calle Sexta entre González y Morelos s/n tercer piso, zona centro de H. Matamoros, Tam, se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Matamoros y los representantes de **"LOS CONTRATISTAS"** participantes en la Licitación de la obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuya firmas aparecen al calce, para celebrar la reunión de la **JUNTA DE ACLARACIONES,** misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Invitación a cuando menos 3 personas que se llevó a cabo con fecha de **14 de noviembre de 2025** de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas, para la ejecución de esta obra se procedió conforme a las bases de la Licitación a celebrar la visita al sitio de los trabajos.

En representación del Municipio de Matamoros, el **Ing. José Ramses González Cantú** en su carácter de **Coordinador de Supervisión** y la **Arq. Mónica Iztel de los Santos Garza** en su carácter de **Coordinadora de Proyectos** pertenecientes a la Dirección de Obras Públicas; procedió el primero a tomar lista de asistencia de todos y cada uno de **"LOS CONTRATISTAS"** que se presentaron a la visita de obra.

- **Preguntas por Parte de los Contratistas**

Preguntas	Respuestas
— No Hubo Preguntas —	—

Aclaraciones por parte de la Dirección de Obras Publicas:
LA CONTRATISTA BECKA 29 PRESENTA OFICIO MANIFESTANDO INTERES DE PARTICIPAR EN LA LICITACION AL NO HABER PODIDO REGISTRARLO EN LA PLATAFORMA

FCO Mz. S.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No: **IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)**

DESCRIPCION: **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS .**

Se hace la aclaración que el acta de Visita al sitio de los trabajos se anexará en el documento AT-7 y la minuta de la Junta de Aclaraciones, se anexará el documento AT-7.
Una vez terminada la presenta sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES:

No.	RAZON SOCIAL	FIRMA
1.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.	FCQ Mz.S.
2.-	KAWAC CONSTRUCCIONES, S. A. DE. C. V.	
3.-	CONSTRUCCIONES BECKA 29, S. A. DE C. V.	

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

Arq. Mónica Iztel de los Santos Garza
COORDINADORA DE PROYECTOS

Ing. José Ramses González Cantú
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

BECKA29
CONSTRUCCIONES

MANIFIESTO DE INTERES A PARTICIPAR

20 de Noviembre 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Por medio de la presente y en relación a la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)*** de la obra ***PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS RABOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***

YO ***C. VALERIA ITZEL REYES CORREA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***CONSTRUCCIONES BECKA 29 S.A DE C.V*** le informo que por problemas de carácter digital me fue imposible declarar interes a participar en la plataformfa de Compras, pero por este conducto le informo que acepto la invitacion a participar en dicha licitacion.

ATENTAMENTE

C. VALERIA ITZEL REYES CORREA



CADENA ORIGINAL:
||IO-87-I71-828022997-N-25-2025|JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU|GOCR8803128V2|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACIONES|1da
c3545e7cc35fb185b0f473142e7a0aa940bf6670f722dd423dc1475c6b176|20-11-2025 15:09:21||

FIRMA ELECTRÓNICA:
UPmMbdDLvXz6cIStJtt0RV+6NUnb6ZBX37QHSVv3D0dpf4NQZi9vYyEVDdBtmb7rCeidyhqZKs4Knl8TIVVwcFQtaVv840Nu7qBIHVjpdaQlMptoIh8/8Gs+
oA/Z69F7PrQ1IJvCxqUBgVCxTDo/3yTceGO+PSMXcoWJz7Hdlpb3DpdAjfDLK/cC81T7EaSn0kHQ7PH3MUKb4UY+B/C2QgxUPPdkWyNszHIF1zFGTct6URWP
wnlRJioPP1MxnXs0a6Sy/3k35V+4dHMkI8P4LVGGdZbZ5Mcqy+MZgcixvJX+0Dc5KCoZG7/n3WqEwWUu6GUlMm+Jr2ArjgV8uNKZGg==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
36d757b2-2708-4523-b17e-4df0b7ba1744

CADENA ORIGINAL:
||IO-87-I71-828022997-N-25-2025|MONICA ITZEL DE LOS SANTOS GARZA|SAGM931105887|SERVIDOR PÚBLICO|ACTA JUNTA DE ACLARACION
ES|1dac3545e7cc35fb185b0f473142e7a0aa940bf6670f722dd423dc1475c6b176|20-11-2025 15:09:00||

FIRMA ELECTRÓNICA:
TffKtciaAqKC/wjK3Wpw9GkMsMNiXspmcLuj++rTThI7M+ntWH0vv4F5QskchUDk8dwsDje+qLUrg7yDlAtu/HLUfyzIM+ZN5FFmlhVZDJRVSG88pqm0BK1X
do0MpRnO6iXWBI4ZCXLO8BlwvB0y0uDjeI6Lk/OgSsqU0+8NfkMS57h6uGeoUk7m6ITdiy8xYCmPXuTrILKb5W/kPkcEE9VibOfEOlZRg7Sa4Wrh4LWcXUv2
e9pWV/JxtjK7aPI18fVKnCUD6ocUgbC368S9aaWvzUyOkrqyL11huCYSePmqAf39d5qa7P5dlK0DPdEj+SFfnuNbhdH5AsOfCZVRbA==

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
2cf87454-4d0b-4d4c-b45e-4728cb21eed6

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 **ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**			**LICITACIÓN N°:** ***DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:***	**DOCUMENTO A 7**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** **DE:**

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER INTEGRADO EN LA PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA COMISIÓN, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

Señalar la fecha de suscripción del documento

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.
P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento _____ ***(Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas)*** *No.* _____ ***(Indicar el número respectivo)*** *en el que mi representada, la empresa* _____ ***(Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa)*** *participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.*

(El párrafo siguiente se ANOTARÁ en el caso de que se requiera la adquisición de materiales que señala el acuerdo correspondiente. En caso de no requerirse, deberá eliminarse.)

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No. ____ ***(Señalar el número de partida que corresponda)****, será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el* ___ ***(Establecer el porcentaje*** *requerido por la convocante en las bases de licitación o de invitación, que deberá satisfacerse. Este porcentaje podrá ser de, cuando menos, el 50% o el correspondiente a las excepciones establecidas en la regla décima primera, incisos 1 y 2, según sea el caso) por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.*

*Sobre el particular, Manifiesto que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología*___ ***(Anotar si al licitante se le proporcionan o no materiales para la ejecución de los trabajos)*** *me proporcionó material* ***(En caso afirmativo, indicar que se relaciona en el documento AT 11).***

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las Bases de Licitación, así como ***(anotar si se asistió o no a las juntas de aclaraciones)*** *haber asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron)*

A T E N T A M E N T E

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)

NOTAS: 1.- La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado de "El Contratista"
2.- En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente
3.- Se atenderá lo previsto en el ACUERDO de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 03/03/00

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, Y LA DECLARACIÓN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

A). -ENCABEZADO:

.

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B). - TEXTO

CONVOCATORIA Nª	SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.
FECHA:	*SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA*
LICITACIÓN Nª	*SE ANOTARÁ EL Nª DE LICITACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.*
NOMBRE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

CARGO:	*SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.*
REPRESENTANTE LEGAL DE:	*SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** ***IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)*** ***PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT8**
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **30 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***26 de noviembre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

miércoles 26 de noviembre de 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)*** de la obra ***PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.
Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.
Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA** induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO110923CT0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

CONTRATO NO. XXX-XX-XXXXXXXXX-XXX/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL **C. LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA, C. LIC. CUAUHTEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ, C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA Y EL ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, SEGUNDO SINDICO Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA** RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE **(EMPRESA O PERSONA FÍSICA),** A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", REPRESENTADA (EN CASO DE SER PERSONA MORAL) POR EL _____ EN SU CARÁCTER DE _____, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA **"LA CONTRATANTE"**:

I.1 QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y ESTÁ GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INTEGRADO POR UN PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES Y SÍNDICOS, INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD LOCAL, SIN MÁS LIMITES QUE LOS EXPRESADOS EN LAS LEYES, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, PRIMER PÁRRAFO, II INCISO "C" DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 130 Y 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; Y 3, 10, 21, 49 FRACCIONES IV, VII Y XXIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO.

I.2 QUE EL **C. LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA**, FUE ELEGIDO PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2024–2027, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 – 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ES EL REPRESENTANTE DE AYUNTAMIENTO QUIEN, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL SEGUNDO SÍNDICO, ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE COORDINACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 53, 54 Y 55 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR A "EL AYUNTAMIENTO".

I.3 QUE EL **C. LIC. CUAUHTÉMOC MANUEL PERUSQUÍA RAMÍREZ**, FUE NOMBRADO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y, FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 54 Y 68 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO CITADO.

I.4 QUE EL **C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA**, FUE ELEGIDO SEGUNDO SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2024 – 2027, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,

DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 – 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024, Y FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 60 FRACCIÓN XII Y 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

I.5 QUE EL **ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES** FUE NOMBRADO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA EN LA SESIÓN DEL H. CABILDO DE ESTA CIUDAD EN FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

I.6 QUE CONFORME A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 189, 190, 191 Y 192 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL AYUNTAMIENTO EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS Y CONTRATOS PARA EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PAÍS; ADEMÁS, EJERCERÁN DE MANERA COORDINADA LAS FACULTADES CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN O EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES.

I.7 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.8 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, **EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS,** AUTORIZA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE RECURSOS PROVENIENTES _____.

I.9 QUE CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE SE CONTIENE EN ESTE INSTRUMENTO SE ADJUDICÓ EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTICULO 35 FRACCIÓN II**, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ***LICITACION PUBLICA NACIONAL***, NÚMERO _____ DE FECHA _____, Y QUE EN SU OPORTUNIDAD Y POR CONDUCTO DEL **ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES** TITULAR DEL ÁREA DE ***SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***, COMO LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO RELATIVO A LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

(PARA PERSONA MORAL ESTE PÁRRAFO)

II.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1.- QUE ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____, DE FECHA _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____ _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ DE _____ **INSCRITA** EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL NÚMERO _____ CON FECHA _____.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN REFORMAS O MODIFICACIONES A LA CONSTITUTIVA SE DEBERÁN RELACIONAR SIEMPRE Y CUANDO IMPLIQUEN MODIFICACIONES A LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, SU CONSTITUCIÓN O CAPITAL CONTABLE.

II.2.- EL. _____, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO _____ DE LA EMPRESA DENOMINADA _____. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____, DE FECHA _____ OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE **MATAMOROS, TAMAULIPAS.**, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD QUE SU PERSONALIDAD NO LE HA SIDO REVOCADA, MODIFICADA, NI LIMITADA EN FORMA ALGUNA.

(PARA PERSONA FÍSICA ESTE PÁRRAFO)
2.- DECLARA EL "CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

"EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

II.3.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES, FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES, NAVES INDUSTRIALES, PUENTES, TERRACERIAS, PAVIMENTACION,PLANOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO ELECTRICO, HIDRAULICO, DE AIRES ACONDICIONADOS Y TODO LO RELACIONADO CON CONSTRUCCION.

II.4.- QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. _____

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____

REGISTRO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: _____

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN _____ _____, MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y ESPECÍFICAMENTE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE ESPECIFICAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA.

II.7.- QUE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO HA INSPECCIONADO EL SITIO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA Y QUE HA EVALUADO TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO SE REFIERE.

II.8.- QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA BAJO NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS POR EL **ARTÍCULO 59** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, QUE LE IMPIDA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

III.- DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

III.1.- QUE RECONOCEN MUTUAMENTE LA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL DE SUS REPRESENTADAS, ASÍ COMO LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

III.2.- QUE EN VIRTUD DE LAS ANTERIORES DECLARACIONES Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE EN SUS TÉRMINOS, SOMETIÉNDOSE A LO QUE PREVIENEN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR LOS ACTOS JURÍDICOS DE ESTA NATURALEZA.

III.3.- TODOS LOS EVENTOS QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, TALES COMO AVANCES, MODIFICACIONES Y DEMÁS, SE REGISTRARAN EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, FORMANDO ÉSTA, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA _____, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL _____ AL _____ Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN CONFORME A ANEXO AE-12; CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON PRESUPUESTO DE OBRA , ANEXO AE-10; PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AE-3 A, AE-3B Y AE-3C ; LISTADOS DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON CANTIDADES, UNIDADES A UTILIZAR E IMPORTE, ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AT-14 B, AT-14 C, AT-14 A Y AT-14 D; PROGRAMAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE INSUMOS, DE MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, ANEXO AT-5; PLANOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; ANEXO AT-1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR EN DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL QUE "LA CONTRATANTE" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" POR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES LA CANTIDAD DE: $ _____ (_____ **PESOS __/100 M.N.),** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE; DICHO IMPORTE INCLUYE TODOS LOS GASTOS Y VIÁTICOS QUE "EL CONTRATISTA" TENGA QUE EROGAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PACTADOS.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA _____, Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA _____ DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ANEXO AT-13.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE Y ""LA CONTRATANTE"" OPORTUNAMENTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE, EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y LE ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, LO QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA CONSTANCIA.

QUINTA. - ANTICIPOS

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _____% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$ _____ (MONTO CON LETRA.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, ASÍ COMO POR LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A DICHA LEY.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR O SERVIDORES PÚBLICOS QUE "LA CONTRATANTE" DESIGNE AL EFECTO, SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, SIENDO ÉSTAS LOS DÍAS 14 Y 30 Ó 31 DE CADA MES

ASIMISMO, LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

LOS PAGOS LOS EFECTUARÁ "LA CONTRATANTE" PREVIA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN APROBADAS NI PRESENTADAS DENTRO DE LOS PLAZOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL CONTRATISTA" INICIE ANTE "LA CONTRATANTE" EL TRÁMITE DE PAGO.

"EL CONTRATISTA" DA SU CONFORMIDAD PARA QUE "LA CONTRATANTE" LE RETENGA LOS CARGOS ADICIONALES DEL 5 AL MILLAR POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE ESTA LEY ENCOMIENDA AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO Y EL 3 AL MILLAR POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL 2 AL MILLAR POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL SISTEMA DIF MATAMOROS.

SÉPTIMA. - REINTEGRACIÓN DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE "LA CONTRATANTE" HAYA REALIZADO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE".

OCTAVA. - GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA MATERIA, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A) UNA FIANZA POR LA SUMA QUE REPRESENTE EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN; PREVIA LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

B) LA CONTRATISTA SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO, ADEMÁS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE SURGIERE CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR DAÑOS Y ACCIDENTES QUE CAUSE A TERCEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PERSONAL, UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR; OBLIGÁNDOSE POR LO TANTO AL PAGO DE TODO EL VALOR QUE SEAN IMPUTABLES A ESTAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES. POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR UNA PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

C) UNA FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL IVA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" EN SU EJECUCIÓN. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO INCLUIDO DENTRO DE LA GARANTÍA DESCRITA LOS PAGOS EN EXCESO REALIZADOS POR "LA CONTRATANTE", ENTENDIÉNDOSE QUE LOS MISMOS CONSTITUYEN VICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE LA OTORGUE ÚNICAMENTE PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE"

DICHA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, O CUALQUIER RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA", QUE POR SU NATURALEZA CONSTITUYAN UN VICIO O UN DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO A "EL CONTRATISTA", Y ÉSTE SE OBLIGA A REPARARLOS A SU COSTA Y A RESARCIRLE A "LA CONTRATANTE" LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE GENERE, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN, TRANSCURRIDO ESE PLAZO "LA CONTRATANTE", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA (**ARTÍCULO 75** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**).

NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O POR CUALQUIER OTRA FORMA O MEDIO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE LA MISMA.

EN CASO CONTRARIO, "EL CONTRATISTA" INCURRIRÁ EN RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA CIVIL Y PENAL.

DÉCIMA. - AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 64** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, CONVIENEN EN QUE PODRÁN SER REVISADOS LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO

CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN, SEÑALANDO EL MECANISMO APLICADO PARA TAL EFECTO.
LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1.- LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

2.- CUANDO EXISTA ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE DE COSTOS PROCEDERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERE ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, EN EL PRESENTE CONTRATO.

3.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE A LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y "LA CONTRATANTE" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

4.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO, QUE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ ÚNICAMENTE A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA EL CASO DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO SE SUJETARÁN A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA", CONSIDERÓ EN SU PROPUESTA.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, EN CASO DE QUE NO LO SOLICITE EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS Y EN EL PLAZO SEÑALADO SU DERECHO A REALIZAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE TENDRÁ POR PRECLUIDO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "LA CONTRATANTE".

ASIMISMO, "LA CONTRATANTE" CONTARÁ CON UN PERÍODO IGUAL PARA RESOLVER RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN SEÑALADA POR "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA. - REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR AL SUPERINTENDENTE DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", Y EN SU CASO, EL DERECHO DE SOLICITAR LA REMOCIÓN DEL MISMO, EN CUALQUIER TIEMPO.

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA SUBSANAR LAS OMISIONES O DEFECTOS DE LA OBRA QUE SURJAN O SE HAGAN NOTAR POR "LA CONTRATANTE".

DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD LABORAL

EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN CONTRATO DE CUYA NATURALEZA NO SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, CON "EL CONTRATISTA" NI CON SUS TRABAJADORES, SI PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO "EL CONTRATISTA" CONTRATA PERSONAL A SU SERVICIO, MANIFIESTA A "LA CONTRATANTE" QUE DICHOS TRABAJADORES, NO TENDRÁN CON ÉSTA NINGUNA RELACIÓN LABORAL Y QUE ÚNICAMENTE "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LAS MISMAS. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER JUICIO QUE SUS TRABAJADORES LLEGAREN A INTENTAR EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERA HABER INCURRIDO ÉSTA ANTE TERCEROS; ADEMÁS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE RESARCIRLA DE TODO DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERA SUFRIR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONTRATAR POR SU EXCLUSIVA CUENTA, AL PERSONAL QUE SEA NECESARIO, PARA CUMPLIR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE CON LOS SERVICIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, SIEMPRE CUIDANDO DE NO INCURRIR EN LOS SUPUESTOS CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DÉCIMA TERCERA. - MATERIALES Y EQUIPO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO AT-7 DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA PÚBLICA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. DICHA RESPONSABILIDAD CONTRA TERCEROS SUBSISTIRÁ AÚN DESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA.

DÉCIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS BIENES QUE CON MOTIVO DE SU CELEBRACIÓN SEAN ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA", NO PODRÁN SER CEDIDOS, TRANSFERIDOS, GRAVADOS, TRASPASADOS NI ENAJENADOS TOTAL O PARCIALMENTE POR ÉSTE, EN NINGUNA FORMA NI BAJO NINGÚN CONCEPTO A TERCEROS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO SUPUESTO DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE "LA CONTRATANTE", EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL **ARTÍCULO 54** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**.

DÉCIMA QUINTA. - RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESIGNA A _____ QUIEN FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE LA OBRA, PARA QUE LLEVE A CABO LA SUPERVISIÓN Y DEBERÁ ENTRE OTRAS COSAS REALIZAR CADA UNO, LO DESCRITO EN LOS **ARTÍCULOS 61 Y 62**, RESPECTIVAMENTE; DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, ADEMÁS DE LO SIGUIENTE:

A) LLEVAR LA BITÁCORA DE LA OBRA PÚBLICA CONJUNTAMENTE CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

B) SUPERVISAR Y VERIFICAR EN TODO MOMENTO QUE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÉ EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO AT-13 PROGRAMA DE OBRA, AL QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO.

C) INSPECCIONAR Y VERIFICAR QUE TODOS LOS MATERIALES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUMPLAN CON LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS **ANEXO AE-12**, Y EN LA RELACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES, QUE CONSTITUYE EL ANEXO **LISTADO DE MATERIALES**, DE ESTE CONTRATO.

D) REVISAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE OBRA DE "EL CONTRATISTA", APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA EL TRÁMITE DE PAGO.

E) RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

F) GIRAR POR ESCRITO TODAS LAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN QUE "LA CONTRATANTE" REALICE PERIÓDICAMENTE SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA PÚBLICA, SE DETERMINA QUE SON INJUSTIFICADAMENTE MENORES, AMBAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER LAS RESPECTIVAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SI EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES INJUSTIFICADAMENTE MENOR A LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO AL ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" APLICARÁ COMO PENA UNA RETENCIÓN ECONÓMICA DEL 5 AL MILLAR DEL MONTO TOTAL NO EJERCIDO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL POR CADA DÍA DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HASTA POR UN IMPORTE MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. DICHA RETENCIÓN REPERCUTIRÁ EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS O PENDIENTES DE PAGAR EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTABLEZCA EN LA BITÁCORA DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR "LA CONTRATANTE", PARA TAL EFECTO; EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS SEÑALADOS.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" A SU ELECCIÓN PROCEDERÁ EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O BIEN HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEÑALADA EN EL INCISO A.-), DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 68** DE **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, SALVO QUE SU CONTINUIDAD IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LO QUE DARÍA LUGAR A UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SOLICITAR NI DEMANDAR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR TALES RAZONES.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN Y "LA CONTRATANTE" INFORME A "EL CONTRATISTA" DE SU CONTINUACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y DE LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES QUE LE SEAN APLICABLES Y QUE NO SEAN CONTRARIAS A LA LEY.

DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL **ARTICULO 68** SEGUNDO PÁRRAFO DE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE ESTO IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULOS 69** DE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

1.- POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE DICHA LEY Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

2.- EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR SE LE APLICARÁN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO PACTADO EN ESTE INSTRUMENTO Y SE LE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y EN SU CASO LA CORRESPONDIENTE A GARANTÍA DEL ANTICIPO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

A.- SE DARÁ INICIO A PARTIR DE QUE "LA CONTRATANTE", HAGA DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", EL INCUMPLIMIENTO POR SU PARTE, DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ÉL, EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, O BIEN, EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS, CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

B. EL CONTRATISTA", TENDRÁ UN TÉRMINO DE DOCE DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, EN RELACIÓN AL **ARTICULO 69 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS**

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA EXPONER POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

C.- "LA CONTRATANTE", RESOLVERÁ EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO SU DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO. DICHA DETERMINACIÓN SE EMITIRÁ INDEPENDIENTEMENTE DE QUE "EL CONTRATISTA", HAYA HECHO MANIFESTACIÓN POR ESCRITO Y PRESENTADO PRUEBAS O NO.

"EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR A "LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS QUE TENGA PENDIENTES, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE HAYA NOTIFICADO LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO; EN CASO DE NO REINTEGRAR DICHA CANTIDAD "EL CONTRATISTA" DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE" DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL **ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** LOS CARGOS QUE RESULTEN CALCULADOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL **ARTÍCULO 63** DE LA LEY ANTES MENCIONADA, SIN PERJUICIO DE LO QUE PROCEDA SEGÚN LAS NORMAS APLICABLES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DESDE ESTE MOMENTO FACULTA A "LA CONTRATANTE" PARA QUE PROCEDA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y A APLICAR LAS PENALIDADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE, PRECISAMENTE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE LOS HUBIERE CONCLUIDO, MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", EN EL DOMICILIO QUE EN ESTE INSTRUMENTO SE SEÑALA.

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL AVISO DE TERMINACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE" CONSTATARÁ LA TERMINACIÓN EFECTIVA DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. DE SER EL CASO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A HACER SABER A "EL CONTRATISTA" LAS CORRECCIONES O FALTANTES EN LA EJECUCIÓN QUE PRESENTE LA OBRA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE ESTE ÚLTIMO A CORREGIRLOS O REALIZARLOS DE INMEDIATO; Y PARA EL CASO DE QUE SE NEGARE A EJECUTARLOS, "LA CONTRATANTE" ESTARÁ FACULTADA A CONTRATAR CON UN TERCERO PARA QUE LOS CORRIJA O LOS REALICE Y "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO DESDE ESE MOMENTO A CUBRIR TODOS LOS GASTOS Y COSTOS QUE POR ELLO SE ORIGINE CON EL SIMPLE REQUISITO DE LA EXHIBICIÓN DE LAS FACTURAS QUE "LA CONTRATANTE" LE ACREDITE.

EN EL SUPUESTO DE QUE, AL CONSTATARSE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, "LA CONTRATANTE" NO TENGA OBSERVACIÓN ALGUNA QUE FORMULAR; LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", Y SE LLEVARÁ A CABO POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, CUYO ACTO DEBE LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, HACIENDO CONSTAR LA ENTREGA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DESCRITA EN EL INCISO C) DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. (**ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**).

"LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,

REQUIRIÉNDOSE EN ESTE SUPUESTO LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", DEBIÉNDOSE OBSERVAR EN ESTE CASO EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. LAS RECEPCIONES PARCIALES NO LIBERAN DE RESPONSABILIDAD A "EL CONTRATISTA".

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS, QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** Y LAS DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A LA MENCIONADA LEY.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - FINIQUITO

LAS PARTES CONVIENEN QUE RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CONFORMIDAD POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" Y EL CENTRO DE TRABAJO EN DONDE SE EJECUTO LA OBRA, ELABORARÁN EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL CUAL SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA DE CADA UNA DE LAS PARTES.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DEL FINIQUITO, O BIEN; "EL CONTRATISTA", NO ACUDA A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO FINIQUITO, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE", LO ELABORARÁ E INFORMARÁ EL RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU EMISIÓN, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, PROCEDIENDO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL **ARTÍCULO 73** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**.

VIGÉSIMA TERCERA. - OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

"EL CONTRATISTA", SERÁ EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR LO QUE DEBERÁ EN SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, Y SE OBLIGA A RESPONDER ANTE "LA CONTRATANTE", DE LAS RESPONSABILIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN DE SU INOBSERVANCIA.

VIGÉSIMA CUARTA. - LEGALIDAD

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, (LAS BASES DE LA LICITACIÓN O DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EN SU CASO, O ADJUDICACIÓN DIRECTA) NÚMERO _____ DE FECHA _____ Y DEMÁS DOCUMENTOS APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIOS

PARA CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA O CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SEÑALAN EXPRESAMENTE COMO SUS DOMICILIOS CONVENCIONALES LOS SIGUIENTES:

"LA CONTRATANTE"

OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA TERCER PISO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE GONZALEZ Y MORELOS S/N, ZONA CENTRO DE H. MATAMOROS, TAM.

"LA CONTRATANTE"

_____

_____

VIGÉSIMA SEXTA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES

EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 1** DE LA **LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO PÚBLICO Y POR LO TANTO TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, Y TODAS LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, O BIEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ANTES CITADA Y DEMÁS DISPOSICIONES A LAS QUE QUEDA SUJETO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A CUYA JURISDICCIÓN SE SOMETEN EXPRESAMENTE LAS PARTES, Y POR TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA TAMBIÉN EN FORMA EXPRESA A CUALQUIER OTRA DISTINTA A LA YA SEÑALADA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE LA UBICACIÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE LEGAL Y EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO Y POR NO TENER CLÁUSULAS CONTRARIAS A DERECHO LO SUSCRIBEN DE PLENA CONFORMIDAD, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN EN Y CADA UNA DE SUS HOJAS QUE LO INTEGRAN LO HACEN EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, EL DÍA _____.

POR EL MUNICIPIO DE MATAMOROS

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CUAUHTEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA
SEGUNDO SÍNDICO

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

POR LA CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
CARGO O PERSONALIDAD

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	DOCUMENTO AT 8
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** **DE:**

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No: _____ relativa a los trabajos: _____.

Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de: _____ _____, en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA** **induzcan** *o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.*

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: *La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 9.- *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y CONTADOR PUBLICO EXTERNO CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, DONDE SE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE Y COPIA SIMPLE DE LAS DOS ULTIMAS DECLARACIONES ANUALES.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO DONDE SE DETERMINE QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO, SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR., QUE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES Y EL GRADO EN QUE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** ***IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)*** ***PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT9**
KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **30 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***26 de noviembre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

miércoles 26 de noviembre de 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)*** de la obra ***PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***
Sobre el particular, YO ***ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA*** como ***REPRESENTANTE LEGAL*** de ***KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.*** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que la información que se anexa, es la correspondiente a la capacidad financiera.

ATENTAMENTE

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Av. Libramiento Emilio Portes Gil # 166 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fj. Buena Vista C. P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108J7C0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac_construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Libramiento Emilio Portes Gil No. 160 e/Fernando Villarreal y Esq. Ejido Buena Vista
H. MATAMOROS, TAMPS.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO

CIRCULANTE		
Efectivo Caja y Bancos	$ 19,045,568.00	
Clientes	$ 16,188,747.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar	$ 6,250,000.00	
ant. De impuestos	$ 2,865,077.00	
		$ 44,349,392.00
FIJO		
Maquinaria y Equipo	$ 40,237,194.00	
Terrenos y Edificios	$ 48,734,000.00	
Equipo de Oficina	$ 1,053,990.00	
equipo de transporte	$ 2,771,276.00	
Dep. Acum. De Maq. Y Equipo	-$ 17,402,723.00	
Dep. Acum. De Mob. Y Equipo	-$ 83,000.00	$ 75,310,737.00
SUMA DE ACTIVO		$ 119,660,129.00

PASIVO

Proveedores	$ -	$ 2,705,882.00
Acreedores Diversos	$ 39,479.00	
Prov. Cont. Por pagar Seg. Social	$ 193,069.00	
imptos. Trasladados no cobrados	$ 2,203,322.00	
Impuestos Por Pagar	$ 270,012.00	

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL FIJO	$ 4,550,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 98,083,896.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 14,320,351.00
SUMA DE CAPITAL CONTABLE	$ 116,954,247.00
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	$ 119,660,129.00

C.P.C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA
CD. PROF. 1699608 Y 2530157

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de la misma, asumiendo asimismo, todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Libramiento Emilio Portes Gil No. 160 e/Fernando Villarreal y Esq. Ejido Buena Vista
H. MATAMOROS, TAMPS.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS		
POR ACTIVIDAD PREPONDERANTE	$	208,284,081.00
COSTO DE VENTAS		
COMPRAS	$	184,697,123.00
UTILIDAD BRUTA	$	23,586,958.00
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS GENERALES	$	9,266,607.00
UTILIDAD NETA	$	14,320,351.00

C.P.C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA
CED. PROF. 1699608Y 2530157

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la información y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de la misma, asumiendo asimismo, toda tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Libramiento Emilio Portes Gil No. 160 e/Fernando Villarreal y Esq. Ejido Buena Vista
H. MATAMOROS, TAMPS.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024

A C T I V O

CIRCULANTE			
Efectivo Caja y Bancos	$	22,701,193.00	
Clientes	$	17,452,868.00	
Cuentas y Documentos por Cobrar	$	14,074,326.00	
ant. De impuestos	$	4,983,450.00	
			$ 59,211,837.00
FIJO			
Maquinaria y Equipo	$	40,237,194.00	
Terrenos y Edificios	$	48,734,000.00	
equipo de transporte	$	3,736,766.00	
Dep. Acum. De Maq. Y Equipo	-$	18,563,074.00	
Dep. Acum. De Eq. De transporte	-$	88,500.00	$ 74,056,386.00
SUMA DE ACTIVO			$ 133,268,223.00

PASIVO

Proveedores	$	-	$ 1,571,793.00
Acreedores Diversos	$	463,951.00	
Prov. Cont. Por pagar Seg. Social	$	-	
imptos. Trasladados no cobrados	$	457,619.00	
Impuestos Por Pagar	$	650,223.00	

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL FIJO	$	4,550,000.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	112,404,247.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	$	14,742,183.00
SUMA DE CAPITAL CONTABLE	$	131,696,430.00
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	$	133,268,223.00

C.P.C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA
CD. PROF. 1699608 Y 2530157

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Libramiento Emilio Portes Gil No. 160 e/Fernando Villarreal y Esq. Ejido Buena Vista
H. MATAMOROS, TAMPS.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

INGRESOS		
POR ACTIVIDAD PREPONDERANTE	$	260,124,106.00
COSTO DE VENTAS		
COMPRAS	$	235,263,631.00
UTILIDAD BRUTA	$	24,860,475.00
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS GENERALES	$	10,118,292.00
UTILIDAD NETA	$	14,742,183.00

C.P.C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA
CED. PROF. 1699608Y 2530157

KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS

		2023		2024	
Razon Capital Neto de Trabajo	+ Activo Circulante	$ 44,349,392.00		$ 59,211,837.00	
	- Pasivo Circulante	$ 2,705,882.00		$ 1,571,793.00	
	CNT	$ 41,643,510.00		$ 57,640,044.00	
Razon de capital de trabajo	= Activo Circulante / Pasivo Circulante	$ 44,349,392.00 / $ 2,705,882.00	16.39	$ 59,211,837.00 / $ 1,571,793.00	37.67
Razon Severa o Prueba de Acido	= Activo Circulante - Inventarios / Pasivo Circulante	$ 44,349,392.00 / $ 2,705,882.00	16.39	$ 59,211,837.00 / $ 1,571,793.00	37.67
Razon de Liquidez o de Pago Inmediato	= Efectivo / Pasivo Circulante	$ 19,045,568.00 / $ 2,705,882.00	7.04	$ 22,701,193.00 / $ 1,571,793.00	14.44
razon de Endeudamiento	= Activo Total / Pasivo Total	$ 119,660,129.00 / $ 2,705,882.00	44.22	$ 133,268,223.00 / $ 1,571,793.00	84.79
razon de endeudamiento	= Pasivo Total / Activo Total	$ 2,705,882.00 / $ 119,660,129.00	0.02	$ 1,571,793.00 / $ 133,268,223.00	0.01
Razon entre Inversion y Capital Contable	= Capital Contable / Activo Total	$ 116,954,247.00 / $ 119,660,129.00	0.98	$ 131,696,430.00 / $ 133,268,223.00	0.99
Razon de Proteccion al Pasivo Circulante	= Capital Contable / Pasivo Circulante	$ 116,954,247.00 / $ 2,705,882.00	43.22	$ 131,696,430.00 / $ 1,571,793.00	83.79
Razon al Margen de Utilidad	= Utilidad Neta / Ventas Netas	$ 14,320,351.00 / $ 208,284,081.00	0.07	$ 14,742,183.00 / $ 260,124,106.00	0.06
Razon de Rentabilidad de la Inversion	= Utilidad Neta / Activo Total	$ 14,320,351.00 / $ 119,660,129.00	0.12	$ 14,742,183.00 / $ 133,268,223.00	0.11

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Ej. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CE0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 1699608

EN VIRTUD DE QUE
JULIO
RIVERA
GARCÍA

CURP: RIGJ450621HTSVRL08
CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA EN
CONTADURÍA PÚBLICA

LIC. CARLOS REYNOSO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 1699608
DUPLICADO

SEP

México D.F. 16 de Julio del 2001



FIRMA DEL TITULAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 2530157

EN VIRTUD DE QUE
JULIO
RIVERA
GARCÍA

CURP: RIGJ450621HTSVRL08
CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE
EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA
CÉDULA
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
MAESTRÍA EN
DERECHO FISCAL

LIC. CARLOS REYNOSO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 2530157
DUPLICADO

SEP

México D.F. 19 de Julio del 2001



FIRMA DEL TITULAR

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0

Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	26/03/2024 10:31	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	240860459182	**Vencimiento obligación:**	01/04/2024

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	1,507,230
Cantidad a cargo:	1,507,230
Cantidad a pagar:	1,507,230
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 00RB 6755 4185 2408**

Importe total a pagar: **$1,507,230**

Vigente hasta: **01/04/2024**

Obligado a pagar por internet

042400RB675541852408 1507230

Sello digital :

RtHlYzRk5zR/mL6fZaxO63eYPYDW/ZbxUw8pwrQCuCmfmLTumQjhy9FAZhUUam0/xPJnrakmp2Os1GZLv07aL88fIYHJ4JulEEpd
HUBVWGbwC8sx+qMoNxMi+lYrmXrxQYlSCRLefc460TT9ow3e9EOMQdDIW2udFtjDnNq2rRV077xbwSC6Vm2fzppe7KwaB9OXU3fe
uCr4ZHzkRGDj47P0x8RBg/qcscBg5j5iP0XqmVhtkZSKh1ngAd/sEddnuMKvNL5nGKYLsSNJktA9ct7bWIOhvXMp/6daMrsvYGWU
sloXc1izCUwo6gX/RI5MKdtPcgxm4W4zi2EReH/sJg==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	KCO110823CE0
Denominación o razón social:	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	26/03/2024 10:31	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	240860459182	**Vencimiento obligación:**	01/04/2024

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajío · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Grupo Financiero Banorte · banregio · BANSI Banca Múltiple · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA Banco · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · Grupo Financiero monex Banco · MUFG MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

RtHlYzRk5zR/mL6fZaxO63eYPYDW/ZbxUw8pwrQCuCmfmLTumQjhy9FAZhUUam0/xPJnrakmp2Os1GZLv07aL88fIYHJ4JulEEpd
HUBVWGbwC8sx+qMoNxMi+lYrmXrxQYlSCRLefc460TT9ow3e9EOMQdDIW2udFtjDnNq2rRV077xbwSC6Vm2fzppe7KwaB9OXU3fe
uCr4ZHzkRGDj47P0x8RBg/qcscBg5j5iP0XqmVhtkZSKh1ngAd/sEddnuMKvNL5nGKYLsSNJktA9ct7bWIOhvXMp/6daMrsvYGWU
sloXc1izCUwo6gX/RI5MKdtPcgxm4W4zi2EReH/sJg==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	208,284,081
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	208,284,081

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	208,284,081

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	15,028,284	PRESENTADA PAGADA	230520027748	16/02/2023
FEBRERO	29,732,263	PRESENTADA PAGADA	230330363196	21/03/2023
MARZO	10,285,102	PRESENTADA PAGADA	230450084242	18/04/2023
ABRIL	12,613,010	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230810681076	16/05/2023
MAYO	4,241,003	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900861808	20/06/2023
JUNIO	24,801,646	PRESENTADA PAGADA	230350209902	13/07/2023
JULIO	15,214,486	PRESENTADA PAGADA	230410178247	10/08/2023
AGOSTO	11,164,931	PRESENTADA PAGADA	230050564960	07/09/2023
SEPTIEMBRE	27,986,589	PRESENTADA PAGADA	230811441511	17/10/2023
OCTUBRE	22,564,498	PRESENTADA PAGADA	230070680079	08/11/2023
NOVIEMBRE	33,125,524	PRESENTADA PAGADA	230390259321	18/12/2023
DICIEMBRE	1,526,745	PRESENTADA PAGADA	240300019914	30/01/2024
Total	**208,284,081**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 208,284,081

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN: 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?: NO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 18,809,736

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS: 0

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 18,809,736

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0466
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	876,534
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	208,284,081

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4,572,928

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	4,643,118	43

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	4,643,118	438,652	438,653	0	43
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	132,434
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	4,510,684

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL: 4,643,118

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	351,856	441	31,882	31,882	0	32	PRESENTADA PAGADA	230520027748	16/02/2023
FEBRERO	348,815	2,470	31,795	31,795	0	31	PRESENTADA PAGADA	230330363196	21/03/2023
MARZO	338,521	2,342	30,958	30,958	0	31	PRESENTADA PAGADA	230450084242	18/04/2023
ABRIL	412,267	0	41,589	41,589	0	30	PRESENTADA PAGADA	230810681076	16/05/2023
MAYO	390,910	29,180	34,758	34,758	0	30	PRESENTADA PAGADA	230900861808	20/06/2023
JUNIO	291,682	0	26,984	26,984	0	27	PRESENTADA PAGADA	230350209902	13/07/2023
JULIO	381,504	3,629	38,424	38,424	0	28	PRESENTADA PAGADA	230410178247	10/08/2023
AGOSTO	303,773	4,827	28,300	28,300	0	27	PRESENTADA PAGADA	230050564960	07/09/2023
SEPTIEMBRE	381,818	2,793	39,371	39,371	0	27	PRESENTADA PAGADA	230811441511	17/10/2023
OCTUBRE	374,291	753	33,503	33,503	0	33	PRESENTADA PAGADA	230890266674	21/12/2023
NOVIEMBRE	393,696	0	36,013	36,013	0	35	PRESENTADA PAGADA	230390259321	18/12/2023
DICIEMBRE	673,984	86,000	65,076	65,076	0	35	PRESENTADA PAGADA	240770097887	18/01/2024
Total	**4,643,118**	**132,434**	**438,652**	**438,653**	**0**	**43**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 4,643,118

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	132,434
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	70,190
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	70,190

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	70,190		70,190
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	70,190	0	70,190

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	62,244
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	4,510,684
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	4,572,928

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	4,572,928
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	4,572,928
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	4,572,928
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	70,190

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	9

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	9
Total	**9**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	313
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	322
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	230520027748	16/02/2023
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	230330363196	21/03/2023
MARZO		PRESENTADA PAGADA	230450084242	18/04/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	230810681076	16/05/2023
MAYO		PRESENTADA PAGADA	230900861808	20/06/2023
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	230350209902	13/07/2023
JULIO		PRESENTADA PAGADA	230410178247	10/08/2023
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	230050564960	07/09/2023
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230811441511	17/10/2023
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	230890266674	21/12/2023
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230390259321	18/12/2023
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240770097887	18/01/2024
Total	0			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 322

GASTOS: 3,578,325

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 79,552

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	2,664	388	PRESENTADA PAGADA	515761209	16/02/2023
FEBRERO	9,208	1,151	PRESENTADA PAGADA	520544989	21/03/2023
MARZO	1,544	193	PRESENTADA PAGADA	524425105	18/04/2023
ABRIL	1,304	163	PRESENTADA PAGADA	528987063	16/05/2023
MAYO	7,320	915	PRESENTADA PAGADA	534335115	20/06/2023
JUNIO	1,120	140	PRESENTADA PAGADA	537459585	13/07/2023
JULIO	5,880	735	PRESENTADA PAGADA	541554506	10/08/2023
AGOSTO	5,704	713	PRESENTADA PAGADA	545353990	07/09/2023
SEPTIEMBRE	14,944	1,868	PRESENTADA PAGADA	551063207	17/10/2023
OCTUBRE	3,600	450	PRESENTADA PAGADA	554139950	08/11/2023
NOVIEMBRE	6,136	767	PRESENTADA PAGADA	560229746	18/12/2023
DICIEMBRE	20,128	2,516	PRESENTADA PAGADA	565281013	18/01/2024
TOTAL	79,552	9,999			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 79,552

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 9,999

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	515761209	16/02/2023
FEBRERO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	520544989	21/03/2023
MARZO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	524425105	18/04/2023
ABRIL		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	528987063	16/05/2023
MAYO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	534335115	20/06/2023
JUNIO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	537459585	13/07/2023
JULIO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	541554506	10/08/2023
AGOSTO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	545353990	07/09/2023
SEPTIEMBRE		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	551063207	17/10/2023
OCTUBRE		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	554139950	08/11/2023
NOVIEMBRE		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	560229746	18/12/2023
DICIEMBRE		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	565281013	18/01/2024
TOTAL	0	0			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS: 0

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

INTERESES NETOS: 0

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	3,498,773

GASTOS: 3,578,325

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA: 0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA: 0

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA: 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA: 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES: 1,141,223

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	1,715,322	0	1,715,322	1,141,223
Total					**1,715,322**	**1,141,223**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES: 1,141,223

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	1,141,223
COSTO DE LO VENDIDO	184,697,123

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	184,697,123
COSTO DE PRODUCCIÓN	184,697,123

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	18,809,736
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	18,809,736
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0466
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	876,534
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	194,866,133

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	208,284,081
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	194,866,133
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	13,417,948

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	13,417,948
RESULTADO FISCAL	13,417,948
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	4,025,384
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	4,025,384
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	4,025,384
MONTO POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 4,025,384

MONTO POR APLICAR: 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
		2023	0			0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS	2,518,154

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	193,865	PRESENTADA PAGADA	230520027748	16/02/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	193,865
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	193,865
CANTIDAD PAGADA	193,865

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	383,546	PRESENTADA PAGADA	230330363196	21/03/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	383,546
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	383,546
CANTIDAD PAGADA	383,546

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	132,678	PRESENTADA PAGADA	230450084242	18/04/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	132,678

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	132,678
CANTIDAD PAGADA	132,678

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	107,904	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230810681076	16/05/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	107,904
COMPENSACIONES	107,904
TOTAL DE APLICACIONES	107,904
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	51,274	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900861808	20/06/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	51,274
COMPENSACIONES	51,274
TOTAL DE APLICACIONES	51,274
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	299,852	PRESENTADA PAGADA	230350209902	13/07/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	299,852
COMPENSACIONES	32,050
TOTAL DE APLICACIONES	32,050
CANTIDAD A CARGO	267,802
CANTIDAD PAGADA	267,802

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	183,943	PRESENTADA PAGADA	230410178247	10/08/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	183,943
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	183,943
CANTIDAD PAGADA	183,943

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	134,984	PRESENTADA PAGADA	230050564960	07/09/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	134,984
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	134,984
CANTIDAD PAGADA	134,984

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	338,358	PRESENTADA PAGADA	230811441511	17/10/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	338,358
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	338,358
CANTIDAD PAGADA	338,358

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	272,805	PRESENTADA PAGADA	230070680079	08/11/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	272,805
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	272,805
CANTIDAD PAGADA	272,805

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	400,487	PRESENTADA PAGADA	230390259321	18/12/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	400,487
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	400,487
CANTIDAD PAGADA	400,487

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	18,458	PRESENTADA PAGADA	240300019914	30/01/2024

RECARGOS	271
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	18,729
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	18/01/2024
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	20,920
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	2,191
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**2,518,154**			

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,518,154
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	2,518,154
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	230520027748	16/02/2023
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	230330363196	21/03/2023
MARZO	0	PRESENTADA PAGADA	230450084242	18/04/2023
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230810681076	16/05/2023
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230900861808	20/06/2023
JUNIO	0	PRESENTADA PAGADA	230350209902	13/07/2023
JULIO	0	PRESENTADA PAGADA	230410178247	10/08/2023
AGOSTO	0	PRESENTADA PAGADA	230050564960	07/09/2023
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230811441511	17/10/2023
OCTUBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230070680079	08/11/2023
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230390259321	18/12/2023
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	240300019914	30/01/2024

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	1,507,230

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	1,507,230
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	322
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	322
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	1,507,230
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,507,230
CANTIDAD A PAGAR	1,507,230

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0644
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	208,284,081
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	194,866,133
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	13,417,948

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DATOS ADICIONALES

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	208,284,081
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	208,284,081
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	13,417,948
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	13,417,948
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	208,284,081
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0644

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	107,291

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	5,275,725
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	5,275,725
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	6,674,847

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	38,084,689

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	13,417,948
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	13,417,948
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	13,417,948
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	24,666,741
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	13,417,948
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	38,084,689
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	38,084,689
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240860459182
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:31
Vencimiento obligación: 01/04/2024

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0

Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2024
Fecha y hora de presentación:	28/03/2025 08:17	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	250160116574	**Vencimiento obligación:**	31/03/2025

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	1,805,681
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

am1ZabZWl3J75NlhC8gteLM/aXzBNcxdcxTgllyVDHKeU42ihlK5lsC7tzJGiPvZu2fvFmVWn2ofbvLjiS8YhUKlX99HAtKAw/AS
K/jBJQw+qTkwrZzpaPCD0oQuNmkCBk1QlLTPJ0v+6cocuW/WGHap/xC5ZKewgjHAcenk9YjCtc33WeBMGh+vjl4YegunVZB9a6sh
1gARcCtFF/Jo6+4w++RPkbo3NJAyXGKWTSxIkBBrljUsoCdqWqIpGTI0AkVGJGHoRG56TJetquQFKM9BrsXrRAlCzYDtAQd/Kl1Z
kIHxMcDnZUxWNDYv+0pYyd4YudhdhNLX8XXQibo6yw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	260,124,106
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	260,124,106

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	1,075,816
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	259,048,290

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	25,465,202	PRESENTADA PAGADA	240810250341	19/02/2024
FEBRERO	36,592,935	PRESENTADA PAGADA	240280055459	19/03/2024
MARZO	29,577,843	PRESENTADA PAGADA	240380634141	18/04/2024
ABRIL	9,933,891	PRESENTADA PAGADA	240050432841	11/06/2024
MAYO	16,371,627	PRESENTADA PAGADA	240771451354	09/09/2024
JUNIO	32,653,651	PRESENTADA PAGADA	240000773795	11/09/2024
JULIO	30,615,318	PRESENTADA PAGADA	240000776689	12/09/2024
AGOSTO	41,757,121	PRESENTADA PAGADA	240220307748	13/09/2024
SEPTIEMBRE	15,918,192	PRESENTADA PAGADA	240901665754	15/10/2024
OCTUBRE	6,336,206	PRESENTADA PAGADA	240811832378	12/11/2024
NOVIEMBRE	13,826,304	PRESENTADA PAGADA	240280373391	17/12/2024
DICIEMBRE	1,075,816	PRESENTADA PAGADA	250170026396	22/01/2025
Total	**260,124,106**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 260,124,106

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN: 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?: NO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 0

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS: 0

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0421
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	260,124,106

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6,345,435

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	6,441,578	91

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	6,441,578	674,241	674,241	0	91
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	181,402
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	6,260,176

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL: 6,441,578

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	431,683	3,929	44,239	44,239	0	35	PRESENTADA PAGADA	250770175612	29/01/2025
FEBRERO	768,062	41,063	69,776	69,776	0	65	PRESENTADA PAGADA	240280055459	19/03/2024
MARZO	546,449	5,442	62,151	62,151	0	33	PRESENTADA PAGADA	240380634141	18/04/2024
ABRIL	423,300	1,443	43,374	43,374	0	34	PRESENTADA PAGADA	240230196078	20/05/2024
MAYO	532,552	14,020	54,512	54,512	0	33	PRESENTADA PAGADA	240770950106	12/06/2024
JUNIO	411,153	411	48,192	48,192	0	32	PRESENTADA PAGADA	240650276054	09/07/2024
JULIO	397,850	1,745	41,301	41,301	0	31	PRESENTADA PAGADA	250800023527	29/01/2025
AGOSTO	544,875	3,918	56,328	56,328	0	34	PRESENTADA PAGADA	240220307748	13/09/2024
SEPTIEMBRE	508,659	0	57,500	57,500	0	40	PRESENTADA PAGADA	240901665754	15/10/2024
OCTUBRE	532,533	6,411	53,025	53,025	0	43	PRESENTADA PAGADA	240811832378	12/11/2024
NOVIEMBRE	495,670	2,411	50,175	50,175	0	42	PRESENTADA PAGADA	240280373391	17/12/2024
DICIEMBRE	848,793	100,608	93,668	93,668	0	42	PRESENTADA PAGADA	250170026396	22/01/2025
Total	**6,441,578**	**181,402**	**674,241**	**674,241**	**0**	**91**			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 6,441,578

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	181,402
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	96,143
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	96,143

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	96,143		96,143
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	96,143	0	96,143

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	85,259
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	6,260,176
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	6,345,435

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	6,345,435
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	6,345,435
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	6,345,435
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	96,143

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	123

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
FEBRERO	33
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	56
JULIO	0
AGOSTO	34
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**123**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	322
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	445
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	123

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	250770175612	29/01/2025
FEBRERO	33	PRESENTADA PAGADA	240280055459	19/03/2024
MARZO		PRESENTADA PAGADA	240380634141	18/04/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	240230196078	20/05/2024
MAYO		PRESENTADA PAGADA	240770950106	12/06/2024
JUNIO	56	PRESENTADA PAGADA	240650276054	09/07/2024
JULIO		PRESENTADA PAGADA	250800023527	29/01/2025
AGOSTO	34	PRESENTADA PAGADA	240220307748	13/09/2024
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240901665754	15/10/2024
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	240811832378	12/11/2024
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240280373391	17/12/2024
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	250170026396	22/01/2025
Total	**123**			

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS: 123

TOTAL DEL SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS, SOLO PERIODOS PAGADOS:

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	**0**

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 322

GASTOS: 370,560

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO 155,860

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	10,675	294	PRESENTADA PAGADA	570341970	19/02/2024
FEBRERO	6,675	516	PRESENTADA PAGADA	574748439	19/03/2024
MARZO	13,500	556	PRESENTADA PAGADA	579379281	18/04/2024
ABRIL	15,500	273	PRESENTADA PAGADA	584306217	20/05/2024
MAYO	11,500	526	PRESENTADA PAGADA	616760827	14/01/2025
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 2,382			
		CANTIDAD A FAVOR 1,856			
JUNIO	9,000	330	PRESENTADA PAGADA	616699987	13/01/2025
		FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 07/09/2024			

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 4,042 CANTIDAD A FAVOR: 3,712				
JULIO	15,500	1,372	PRESENTADA PAGADA	616701619	13/01/2025	
		FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 08/07/2024 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 3,228 CANTIDAD A FAVOR: 1,856				
AGOSTO	9,000	1,165	PRESENTADA PAGADA	616703602	13/01/2025	
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 3,021 CANTIDAD A FAVOR: 1,856				
SEPTIEMBRE	9,000	218	PRESENTADA PAGADA	616758762	14/01/2025	
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 2,316 CANTIDAD A FAVOR: 2,098				
OCTUBRE	9,000	1,248	PRESENTADA PAGADA	616759146	14/01/2025	
		FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 11/12/2024 MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 5,444 CANTIDAD A FAVOR: 4,196				

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

NOVIEMBRE	37,510	775	PRESENTADA PAGADA	616759480	14/01/2025
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 2,873			
		CANTIDAD A FAVOR: 2,098			
DICIEMBRE	9,000	4,058	PRESENTADA PAGADA	620350721	13/02/2025
		RECARGOS: 2			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 3,976			
TOTAL	155,860	11,331			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 155,860

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 11,331

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 214,700

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	570341970	19/02/2024
FEBRERO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	574748439	19/03/2024
MARZO		0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	579379281	18/04/2024
ABRIL	17,000	1,700	PRESENTADA PAGADA	584306217	20/05/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

MAYO	18,560	1,856	PRESENTADA PAGADA	616760827	14/01/2025
JUNIO	37,120	3,712	PRESENTADA PAGADA	616699987	13/01/2025
JULIO	18,560	1,856	PRESENTADA PAGADA	616702132	13/01/2025
AGOSTO	18,560	1,856	PRESENTADA PAGADA	616704516	13/01/2025
SEPTIEMBRE	20,980	2,098	PRESENTADA PAGADA	616758855	14/01/2025
OCTUBRE	41,960	4,196	PRESENTADA PAGADA	616759276	14/01/2025
NOVIEMBRE	20,980	2,098	PRESENTADA PAGADA	616759646	14/01/2025
DICIEMBRE	20,980	2,098	PRESENTADA PAGADA	618272873	22/01/2025
TOTAL	214,700	21,470			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	214,700
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	21,470
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

PERIODO	FACTURAS VIGENTES	DESCUENTO	FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL - DESCUENTO
ENERO	22	2,153,359		
FEBRERO	22	0		
MARZO	47	1,333,676	1	38
ABRIL	23	24,441		
MAYO	19	3,136,908		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	FACTURAS VIGENTES	DESCUENTO	FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL - DESCUENTO
JUNIO	38	5,473,501	1	16
JULIO	35	6,895,731		
AGOSTO	41	10,035,441		
SEPTIEMBRE	47	0		
OCTUBRE	20	0		
NOVIEMBRE	37	0		
DICIEMBRE	36	466,991		
Total	**387**	**29,520,048**	**2**	**54**

DESCUENTOS DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	29,520,048
SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO	54
TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS	29,520,102

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	10,118,292

GASTOS	10,118,292
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
SIN DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	SIN INVERSIONES	SIN INVERSIONES	0	0	0	0
Total					**0**	**0**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	0
COSTO DE LO VENDIDO	235,263,631

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	PREDETERMINADOS
TIPO DE COSTO PREDETERMINADO	ESTÁNDAR
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	COSTO IDENTIFICADO

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO	235,263,631

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	245,381,923

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	260,124,106
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	245,381,923
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	14,742,183
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO DEDUCIBLE	0
TOTAL PTU PAGADA	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	14,742,183
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	10,733,056

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

MONTO POR APLICAR	0
RESULTADO FISCAL	14,742,183
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	3,219,917
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	3,219,917
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	3,219,917
MONTO POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0	0	0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 3,219,917

MONTO POR APLICAR: 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2024	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2024

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 134.594

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 5,025,598

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	307,874	PRESENTADA PAGADA	240810250341	19/02/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	307,874
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	307,874
CANTIDAD PAGADA	307,874

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	442,409	PRESENTADA PAGADA	240280055459	19/03/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	442,409
COMPENSACIONES	2,191
TOTAL DE APLICACIONES	2,191
CANTIDAD A CARGO	440,218
CANTIDAD PAGADA	440,218

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	1,020,124	PRESENTADA PAGADA	240380634141	18/04/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,020,124
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	1,020,124
CANTIDAD PAGADA	1,020,124

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	191,923	PRESENTADA PAGADA	240050432841	11/06/2024

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	191,923
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	21/05/2024
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	211,235
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	19,312
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	316,300	PRESENTADA PAGADA	240771451354	09/09/2024

PARTE ACTUALIZADA	4,491
RECARGOS	14,147
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	334,938

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

COMPENSACIONES	19,312
TOTAL DE APLICACIONES	19,312
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	12/06/2024
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	320,984
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	5,358
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	630,868	PRESENTADA PAGADA	240000773795	11/09/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	630,868
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	09/07/2024
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	630,868
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	591,488	PRESENTADA PAGADA	240000776689	12/09/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	591,488
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	07/08/2024
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	591,489
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	1
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	806,747	PRESENTADA PAGADA	240220307748	13/09/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	806,747
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	806,747
CANTIDAD PAGADA	806,747

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	307,540	PRESENTADA PAGADA	240901665754	15/10/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	307,540
TOTAL DE APLICACIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	307,540
CANTIDAD PAGADA	307,540

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	122,416	PRESENTADA PAGADA	240811832378	12/11/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	122,416
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	122,416
CANTIDAD PAGADA	122,416

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	267,124	PRESENTADA PAGADA	240280373391	17/12/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	267,124
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	267,124
CANTIDAD PAGADA	267,124

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	20,785	PRESENTADA PAGADA	250170026396	22/01/2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	20,785
COMPENSACIONES	17,672
TOTAL DE APLICACIONES	17,672
CANTIDAD A CARGO	3,113
CANTIDAD PAGADA	3,113

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**5,025,598**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	5,025,598
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	5,025,598
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	240810250341	19/02/2024
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	240280055459	19/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA PAGADA	240380634141	18/04/2024
ABRIL	0	PRESENTADA PAGADA	240050432841	11/06/2024
MAYO	0	PRESENTADA PAGADA	240771451354	09/09/2024
JUNIO	0	PRESENTADA PAGADA	240000773795	11/09/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA PAGADA	240000776689	12/09/2024
AGOSTO	0	PRESENTADA PAGADA	240220307748	13/09/2024
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	240901665754	15/10/2024
OCTUBRE	0	PRESENTADA PAGADA	240811832378	12/11/2024
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	240280373391	17/12/2024
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	250170026396	22/01/2025

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	1,805,681
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	1,805,681

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0412
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	260,124,106
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	245,381,923
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	14,742,183

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DATOS ADICIONALES

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	260,124,106
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	260,124,106
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	14,742,183
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	14,742,183
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	260,124,106
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0412

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	88,381

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	88,381
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	88,381
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	88,381

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	50,385,315

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	14,742,183
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	14,742,183
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	14,742,183
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	39,652,259
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	14,742,183
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	54,394,442
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	54,394,442
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: KCO110823CE0
Denominación o razón social: KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250160116574
Fecha y hora de presentación: 28/03/2025 08:17
Vencimiento obligación: 31/03/2025

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 10.- *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.*
(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS. SIN IMPORTES

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA* MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNAS:

CONCEPTO N°.:	*SE ANOTARÁ EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.*
DESCRIPCIÓN	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE.*
UNIDAD DE MEDICIÓN	*SE ANOTARÁ LA UNIDAD EN QUE SE MIDE EL CONCEPTO.*
CANTIDAD:	*SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DEL CONCEPTO A EJECUTAR.*
MATERIALES:	*SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.*
UNIDAD:	*SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA CADA MATERIAL. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.*
CONSUMO:	*SE ANOTARÁ EL CONSUMO REQUERIDO POR UNIDAD DE MATERIAL.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 10.- *ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.*
(GUÍA DE LLENADO)

MANO DE OBRA:	*SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.*
UNIDAD:	*SE ANOTARÁ JORNADA.*
CANTIDAD	*SE ANOTARÁ EL NUMERO DE JORNADAS QUE SE EMPLEAN POR JORNADA.*
RENDIMIENTO:	*SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA ACTIVIDAD POR JORNADA.*
MAQUINARIA Y EQUIPO:	*SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.*
UNIDAD:	*HORA EFECTIVA DE TRABAJO*
RENDIMIENTO:	*SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA MAQUINARIA O EQUIPO POR HORA.*

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.01
Trazo y nivelación.

Unidad : m2
Cantidad : 2,393.15

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-023	Calhidra 40 Kg.	saco	0.01435
	KW-MT-042	Barrote De 1 1/2" X 4" X 8 1/4'	pt	0.01200
	KW-MT-022	Pintura En Aerosol	pza	0.03750
Mano de Obra				
	KW.MO.01	TOPOGRAFO	jor	0.00476
	KW.MO.02	CADENERO	jor	0.00421
	KW.MO.02	CADENERO	jor	0.00421
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-18	Transito eléctrico marca Leica Wild	hora	0.05000
H	EQ-KW-17	Nivel SOKKIA B20 aumentos 32x	hora	0.05000

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
El Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO1108236L0

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.02
Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.52 mts.

Unidad : m3
Cantidad : 1,244.44

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.03565
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
Equipo				
H	EQ-KW-11	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	0.03254

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.03
Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.

Unidad : m3
Cantidad : 1,617.77

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-055	Acarreo De Corte De Excavacion.	m3	1.00000
Equipo				
H	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.08423

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Col. Buena Vista C.P. 87304 H. Matamoros, Tamaulipas, R.F.C. KCO1308234C0

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.04
Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.

Unidad : m2
Cantidad : 2,393.15

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-023	Calhidra 40 Kg.	saco	0.11962
	KW-MT-012	Agua Potable	m3	0.04500
Mano de Obra				
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.02742
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
Equipo				
H	EQ-KW-11	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	0.01195
H	EQ-KW-06	Compactador CS 433C, de 105 hp, 6.77 ton, ancho de tambor 1.68 m	hora	0.00952
H	EQ-KW-15	Camiòn pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	hora	0.00918

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #100 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fr. Buena Vista C.P. 87394 Ft. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO1002JC0
Tel. (868)813 60 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@hotmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.05
Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-020	Abrazadera De Bronce 4 X 1/2" Con Tornillos	pza	1.00000
	KW-MT-052	Llave De Banqueta De Bronce De 1/2"	pza	1.00000
	KW-MT-021	Llave Insercion De Bronce De 1/2"	pza	1.00000
	KW-MT-044	Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) De 1/2"	ml	9.30000
	KW-MT-051	Tubo Pvc 4	ML	1.00000
	KW-MT-047	Tapon Macho 4	pza	1.00000
Mano de Obra				
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.49069
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.49069
	KW.MO.08	OFICIAL PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL	jor	0.25636
	KW.MO.09	AYUDANTE DE PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL	jor	0.24194
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.05000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.54357
H	EQ-KW-04	Bailarina neumática marca Wacker	hora	1.27307
H	EQ-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	0.40994

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Ubramiento Emilio Portes Gil #100 entre Fernando Villarreal y Estrella
Fracc. Buena Vista C.P. 87 304 H. Matamoros, Tamaulipas R.F.C. KCO1308231C0
Tel. (868) 812 40 72 Correo electronico: kawacconstrucciones@gmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.06
Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-060	Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts	pza	1.00000
	KW-MT-061	Codo De 45° Pvc Sanitario A Cementar (Hh) De 6"	pza	3.00000
	KW-MT-054	Yee De Pvc Alcantarillado 8"X6" P/Descarga	PZA	1.00000
	KW-MT-053	Yee 6"	PZA	1.00000
	KW-MT-060	Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts	pza	0.17000
	KW-MT-029	Cople 6 San	PZA	1.00000
	KW-MT-048	Tapon Macho 6 San	PZA	1.00000
	KW-MT-046	Tapon 4 Pvc San	PZA	1.00000
	KW-MT-062	Reduccion De 6x4 Sanitaria	PZA	1.00000
	KW-MT-060	Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts	pza	1.00000
	KW-MT-061	Codo De 45° Pvc Sanitario A Cementar (Hh) De 6"	pza	3.00000
Mano de Obra				
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.94633
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.94633
	KW.MO.08	OFICIAL PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL	jor	0.86822
	KW.MO.09	AYUDANTE DE PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL	jor	0.96815
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.05000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	1.33793
H	EQ-KW-04	Bailarina neumática marca Wacker	hora	1.27307
H	EQ-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	0.35870

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #100 entre Fernando Villarreal y Esquina
Col. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CC0
Tel. (868)832-49-74 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.07
Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".

Unidad : ml
Cantidad : 1,841.60

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-030	Concreto Premezclado F'c=150 Kg/Cm2 Clase Ii Normal Agregado De 20 Mm Revenimiento Hasta 10 +-2.5 Cms. Acabado No Bombeable Cementos Cruz Azul	m3	0.09450
	KW-MT-059	Cimbra Metalica (Renta) Para Gauarnicion	m/renta	1.00000
Mano de Obra				
	KW.MO.03	OFICIAL EN COLOCACION DE GUARNICIONES METALICAS	jor	0.04688
	KW.MO.19	AYUDANTE DE CARPINTERO	jor	0.05735
	KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	0.06987
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.06151
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.06151
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.05000
Equipo				
H	EQ-KW-05	Vibrador de gasolina marca Felsa con motor de gasolina de 4 H. P.	hora	0.03526

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.08
Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 45 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.

Unidad : m3
Cantidad : 1,313.86

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-012	Agua Potable	m3	0.15000
	KW-MT-014	Acarreo De Sulfato	m3	1.30000
Equipo				
H	EQ-KW-11	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	0.04795
H	EQ-KW-10	Tractor de orugas D8RII de 305 hp y 37.594 ton de peso de operaciòn equipados con hoja y sin escarificador	hora	0.02877
H	EQ-KW-06	Compactador CS 433C, de 105 hp, 6.77 ton, ancho de tambor 1.68 m	hora	0.06168

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.09
Construcción de base de hidráulica de 15 cm de espesor, incluye: suministro, trituracion, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.

Unidad : m3
Cantidad : 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-012	Agua Potable	m3	0.14000
	KW-MT-016	Base Hidraulica Puesto En Obra 1 1/2" A Finos.	m3	1.40000
Equipo				
H	EQ-KW-11	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	0.01669
H	EQ-KW-15	Camiòn pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	hora	0.02632
H	EQ-KW-06	Compactador CS 433C, de 105 hp, 6.77 ton, ancho de tambor 1.68 m	hora	0.02987
H	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.02744

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #100 entre Fernando Villarreal y Estrella
Fracc. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108223C0
Tel. (868) 816-24-24 correo electrónico: kawac@hotmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.10
Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 7 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.

Unidad : m2
Cantidad : 3,398.34

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-017	Carpeta Asfaltica Segun Especificaciones Puesta En Obra 1/2" A Finos.	ton	0.16335
	KW-MT-032	Emulsión Cationica De Rompimiento Rapido (Riego De Liga Ecr-60)	lt	0.50000
Mano de Obra				
	KW.MO.16	OFICIAL TORNILLERO	jor	0.00541
	KW.MO.17	OFICIAL RASTRILLERO	jor	0.00561
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.00548
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.00548
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.00548
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.00548
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.00548
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
Equipo				
H	EQ-KW-13	Compactador de asfalto Caterpillar CB634C de 145 hp	hora	0.01332
H	EQ-KW-12	Pavimentadora asfaltica Caterpillar AP-1000B 174 hp	hora	0.00766
H	EQ-KW-09	Compactador sobre neumático PS 130B	Hora	0.01735
H	EQ-KW-16	Petrolizadora 2100-SR (8000 LT.)	hora	0.00926
H	EQ-KW-08	Camión de volteo tipo torton con caja de 14 m3	hora	0.01185

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #100 entre Fernando Villarreal y Esquina
Buena Vista C.P. 87304 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1002JCC0
Tel. (868)812-60-22 correo electrónico: kawac.mty@gmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.11
Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Unidad : pza.
Cantidad : 3.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-043	Malla Electroldada 6-6/10-10	m2	2.69231
	KW-MT-055	Acarreo De Corte De Excavacion.	m3	0.41176
	KW-MT-028	Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm²	m3	0.68078
Mano de Obra				
	KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	0.48073
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.41408
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.41408
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.41408
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	1.08817
Conceptos				
+	1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO.	ML	6.00000
+	DEM-CARP MANO	DEMOLICON A MANO DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR	m2	6.00000

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Ubramiedo Emilio Portes Gil #100 entre Fernando Villarreal y Esquina
Col. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108234C0
Tel. (868)813 40 72 correo electrónico: kawaconstrucciones@gmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.12
Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Unidad : pza.
Cantidad : 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-028	Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm²	m3	0.09000
	KW-MT-043	Malla Electroldada 6-6/10-10	m2	2.25000
	KW-MT-056	Var #3 (3/8")	ton	0.01544
	KW-MT-050	Triplay 5/8" De 1.22 X 2.44	PZA	1.00000
	KW-MT-015	Barrote 4x4	pieza	3.00000
	KW-MT-018	Clavo 3" Para Concreto	KG	0.20000
	KW-MT-019	Clavo 3" Para Madera	KG	0.28900
	KW-MT-031	Disco Diamante De 18"	pieza	0.01322
	KW-MT-033	Hilo De Albañil	PIEZA	0.01500
	KW-MT-022	Pintura En Aerosol	pza	0.00500
Mano de Obra				
	KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	0.89327
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.88882
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.88882
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.88882
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.81946
H	EQ-KW-03	Cortador de piso marca Target modelo EC205 cap. 6 5/8"	hora	0.94580
H	EQ-KW-02	Rodillo vibratorio marca Dynapac modelo PR8 cap.4400 VPM	hora	0.48542
H	EQ-KW-08	Camión de volteo tipo torton con caja de 14 m3	hora	0.25924

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #100 entre Fernando Villarreal y Espuma
Fracc. Buena Vista C.P. 87314 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108236C0
Tel. (868) 812 06 72 Correo electrónico: kawacconstrucciones@gmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.13
Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : m2
Cantidad : 379.68

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-030	Concreto Premezclado F'c=150 Kg/Cm2 Clase Ii Normal Agregado De 20 Mm Revenimiento Hasta 10 +-2.5 Cms. Acabado No Bombeable Cementos Cruz Azul	m3	0.08400
	KW-MT-007	Duela Económica 3/4" X 3 1/2" X 8 1/4'.	pt	0.48500
	KW-MT-008	Barrote De 1 1/2" X 3 1/2" X 8 1/4'	pt	0.10417
	KW-MT-049	Tierra De Banco	m3	0.12000
	KW-MT-043	Malla Electroldada 6-6/10-10	m2	1.05000
Mano de Obra				
	KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	0.10131
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.09025
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.09025
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.09025
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
Equipo				
H	EQ-KW-05	Vibrador de gasolina marca Felsa con motor de gasolina de 4 H. P.	hora	0.04760

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.14
Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.

Unidad : pza.
Cantidad : 1.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-013	Letrerode 0.90 X 1.20 Con Rotulación Digital Según Diseño, Incluye: Postes, Herrajes De Instalación	pza	0.98438
	KW-MT-030	Concreto Premezclado F'c=150 Kg/Cm2 Clase Ii Normal Agregado De 20 Mm Revenimiento Hasta 10 +-2.5 Cms. Acabado No Bombeable Cementos Cruz Azul	m3	0.05854
Mano de Obra				
	KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	0.25000
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.25000
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	0.15403

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Obramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fl. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108231C0
Tel. (868)812 46 77 Correo electrónico: kawac_construcciones@hotmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.15
Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 8.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-045	Nomenclatura, Según Especificaciones	pza	1.87533
	KW-MT-063	Señal De Alto Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado	pza	1.06751
	KW-MT-057	Cemento Gris Normal, Marca Tolteca	ton	0.00574
	KW-MT-058	Arena	m3	0.01804
	KW-MT-011	Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3	m3	0.01250
	KW-MT-012	Agua Potable	m3	0.13158
Mano de Obra				
	KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	0.10124
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.07521
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	0.09610

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Reforma
Fracc. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas, R.F.C. KCO130823CL0
Tel. (868)812 40 77 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.16
Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 4.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-065	Señal De No Estacionarse O Velocidad Máxima Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado	pza	1.00000
	KW-MT-057	Cemento Gris Normal, Marca Tolteca	ton	0.00410
	KW-MT-058	Arena	m3	0.01443
	KW-MT-011	Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3	m3	0.01000
	KW-MT-012	Agua Potable	m3	0.13158
Mano de Obra				
	KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	0.10719
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.11732
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.11732
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	0.07060
H	EQ-KW-01	Revolvedora para concreto cmarca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt.	hora	0.04416

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.17
Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 4.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-064	Señal De Cruce De Peatones Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado	pza	1.00000
	KW-MT-057	Cemento Gris Normal, Marca Tolteca	ton	0.00410
	KW-MT-058	Arena	m3	0.01443
	KW-MT-011	Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3	m3	0.01000
	KW-MT-012	Agua Potable	m3	0.13158
Mano de Obra				
	KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	0.10719
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.11732
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.11732
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	0.07060
H	EQ-KW-01	Revolvedora para concreto cmarca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt.	hora	0.04416

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.18
Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-063	Señal De Alto Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado	pza	1.00000
	KW-MT-057	Cemento Gris Normal, Marca Tolteca	ton	0.00410
	KW-MT-058	Arena	m3	0.01443
	KW-MT-011	Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3	m3	0.01000
	KW-MT-012	Agua Potable	m3	0.13158
Mano de Obra				
	KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	0.10719
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.11732
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.11732
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	0.07060
H	EQ-KW-01	Revolvedora para concreto cmarca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt.	hora	0.04416

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.19
Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.

Unidad : ml
Cantidad : 2,182.61

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.02605
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
Equipo				
H	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.04619
H	EQ-KW-08	Camión de volteo tipo torton con caja de 14 m3	hora	0.02586

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
FI. Buena Vista C.P. 87304 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CL0

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.20
Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.

Unidad : m2
Cantidad : 4,802.49

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.02056
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.02056
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.10862
H	EQ-KW-08	Camión de volteo tipo torton con caja de 14 m3	hora	0.07561

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.21
Corte con cortadora de disco diamante en concreto hidraulico, con un espesor de 10 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : ml
Cantidad : 957.26

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	KW.MO.18	CABO DE OFICIO	jor	0.04350
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-03	Cortador de piso marca Target modelo EC205 cap. 6 5/8"	hora	0.20196

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fracc. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas, R.F.C. KCO1108236L0
Tel. (868) 814-24-22 correo electrónico: kawac_construcciones@hotmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.22
Demolicion de Carpeta asfaltica de 5 cm de espesor incluye: corte de contorno con cortadora asfaltica y demolicion con retroexcavadora con martillo rompedor asi como carga mecanica de escombros en camion, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Unidad : m2
Cantidad : 833.33

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.07202
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
Equipo				
H	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.03559
H	EQ-KW-08	Camión de volteo tipo torton con caja de 14 m3	hora	0.01676

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P.23
Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Unidad : m2
Cantidad : 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	KW-MT-028	Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm²	m3	0.08190
	KW-MT-007	Duela Económica 3/4" X 3 1/2" X 8 1/4'.	pt	0.99174
	KW-MT-005	Polín De 3 1/2 X 3 1/2" X 8 1/4'.	pt	1.73611
	KW-MT-006	Triplay De 16 Mm. 1.22 X 2.44.	m2	0.03004
	KW-MT-008	Barrote De 1 1/2" X 3 1/2" X 8 1/4'	pt	0.66116
	KW-MT-018	Clavo 3" Para Concreto	KG	0.04350
	KW-MT-056	Var #3 (3/8")	ton	0.00608
	KW-MT-001	Alambre Recocido	kg	1.82400
	KW-MT-009	Rejilla Tipo Irving 4"X3/8"	M2	0.44100
	KW-MT-010	Solera 4"X1/8"	ML	2.73000
	KW-MT-003	Angulo 4"X1/4"	ML	2.73000
	KW-MT-004	Ladrillo De 7x14x28	PZA	172.00000
Mano de Obra				
	KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	0.36548
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.54651
	KW.MO.21	SOLDADOR	jor	0.55361
	KW.MO.20	OFICIAL EN ESTRUCTURAS	jor	0.56582
	KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	0.54651
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
Equipo				
H	EQ-KW-19	Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp.	hora	4.01366
	EP-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.01437
	EP-KW-08	Camión de volteo tipo torton con caja de 14 m3	hora	0.00798
	EP-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	0.21179
Conceptos				
+	1000 20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO.	ML	3.00000
+	DEM-CARP MANO	DEMOLICON A MANO DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR	m2	0.30000
+	DEM-LOSA MANO	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR	m2	0.39000

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: P. 23
Demolicion de concreto hidraulico 10 cm de espesor incluye: demolición con retroexcavadora con martillo rompedor asi como carga mecanica de escombros en camion, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Unidad : M2
Cantidad : 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.10083
	KW.MO.07	JORNALERO	jor	0.10083
Herramienta				
	FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.03000
	MANDO INTER.	Mando Intermedio	(%)mo	0.10000
	HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.02000
Equipo				
H	EQ-KW-08	Camión de volteo tipo torton con caja de 14 m3	hora	0.04115
H	EQ-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.06146

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 10**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES).

CONCEPTO N° ESPECIFICACIÓN: DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE MEDICIÓN: CANTIDAD:

N°.	MATERIALES	UNIDAD	CONSUMO

N°.	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO

N°.	MAQUINARIA Y EQUIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

AT 11.- *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

GUÍA DE LLENADO

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN;

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

AT 11.- *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

GUÍA DE LLENADO

A.- DE LA MANO DE OBRA

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).-COLUMNAS:

N°.:	*SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.*
MANO DE OBRA:	*SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
UNIDAD	*SERÁ CONSIDERADA POR JORNADA.*
CANTIDAD	*EL NÚMERO DE JORNADAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS*

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
KW.MO.01	TOPOGRAFO	jor	11.56293
KW.MO.02	CADENERO	jor	20.32726
KW.MO.03	OFICIAL EN COLOCACION DE GUARNICIONES METALICAS	jor	86.33421
KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	170.49760
KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	335.80752
KW.MO.06	AYUDANTE DE ALBAÑIL "B"	jor	0.00000
KW.MO.07	JORNALERO	jor	562.09920
KW.MO.08	OFICIAL PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL	jor	0.00000
KW.MO.09	AYUDANTE DE PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL	jor	0.00000
KW.MO.10	CHOFER	jor	59.41039
KW.MO.11	OPERADOR "A" (MOTOCONFORMADORA, DRAGA, EXCAVADORA, CARPETEADORA, PILATEADOR)	jor	20.57887
KW.MO.12	OPERADOR "B" (RETROEXCAVADOR, MOTOESCREPA, BULDOZER)	jor	103.68106
KW.MO.13	OPERADOR "C" (TRASCAVO FRONTAL, MOTOPIPA)	jor	4.91697
KW.MO.14	OPERADOR "D" (GRUA DE BAJO TONELAJE MAX 12.0 TON., EQUIPO DE COMPACTACION AUTO PROPULSADO, ESTABILIZADOR, PETROLIZADORA, ZANJADORA Y MONTACARGA)	jor	28.75224
KW.MO.15	AYUDANTE DE MAQUINARIA	jor	4.91697
KW.MO.16	OFICIAL TORNILLERO	jor	18.38502
KW.MO.17	OFICIAL RASTRILLERO	jor	19.06469
KW.MO.18	CABO DE OFICIO	jor	41.64081
KW.MO.19	AYUDANTE DE CARPINTERO	jor	105.61576
KW.MO.20	OFICIAL EN ESTRUCTURAS	jor	0.00000
KW.MO.21	SOLDADOR	jor	0.00000
EP-KW-15	Camiòn pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	hora	21.96912

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fracc. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108236C0
Tel. (868)812-96-75 Correo electrónico: kawaconstrucciones@gmail.com

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
KW-MT-001	Alambre Recocido	kg	0.00000
KW-MT-002	Kwh De Energía Eléctrica	KWH	0.00000
KW-MT-003	Angulo 4"X1/4"	ML	0.00000
KW-MT-004	Ladrillo De 7x14x28	PZA	0.00000
KW-MT-005	Polín De 3 1/2 X 3 1/2" X 8 1/4'.	pt	0.00000
KW-MT-006	Triplay De 16 Mm. 1.22 X 2.44.	m2	0.00000
KW-MT-007	Duela Económica 3/4" X 3 1/2" X 8 1/4'.	pt	184.14480
KW-MT-008	Barrote De 1 1/2" X 3 1/2" X 8 1/4'	pt	39.55127
KW-MT-009	Rejilla Tipo Irving 4"X3/8"	M2	0.00000
KW-MT-010	Solera 4"X1/8"	ML	0.00000
KW-MT-011	Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3	m3	0.18000
KW-MT-012	Agua Potable	m3	306.91203
KW-MT-013	Letrerode 0.90 X 1.20 Con Rotulación Digital Según Diseño, Incluye: Postes, Herrajes De Instalación	pza	0.98438
KW-MT-014	Acarreo De Sulfato	m3	1,708.01800
KW-MT-015	Barrote 4x4	pieza	0.00000
KW-MT-016	Base Hidraulica Puesto En Obra 1 1/2" A Finos.	m3	0.00000
KW-MT-017	Carpeta Asfaltica Segun Especificaciones Puesta En Obra 1/2" A Finos.	ton	555.11884
KW-MT-018	Clavo 3" Para Concreto	KG	0.00000
KW-MT-019	Clavo 3" Para Madera	KG	0.00000
KW-MT-020	Abrazadera De Bronce 4 X 1/2" Con Tornillos	pza	0.00000
KW-MT-021	Llave Insercion De Bronce De 1/2"	pza	0.00000
KW-MT-022	Pintura En Aerosol	pza	89.78813
KW-MT-023	Calhidra 40 Kg.	saco	320.61030
KW-MT-024	Gasolina Magna	lt	112.43062
KW-MT-025	Diesel	lt	28,301.20341
KW-MT-026	Aceite Verde Para Motor A Diesel	lt	974.13051
KW-MT-027	Aceite Azul Para Motor A Gasolina.	lt	0.73250
KW-MT-028	Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm²	m3	2.04234
KW-MT-029	Cople 6 San	PZA	0.00000
KW-MT-030	Concreto Premezclado F'c=150 Kg/Cm2 Clase Ii Normal Agregado De 20 Mm Revenimiento Hasta 10 +-2.5 Cms. Acabado No Bombeable Cementos Cruz Azul	m3	205.98286

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
KW-MT-031	Disco Diamante De 18"	pieza	0.01494
KW-MT-032	Emulsión Cationica De Rompimiento Rapido (Riego De Liga Ecr-60)	lt	1,699.17000
KW-MT-033	Hilo De Albañil	PIEZA	0.18000
KW-MT-034	Neumáticos Para Compactador Ruo231226-12cpr3	jgo	0.04361
KW-MT-035	Juego De Neumáticos Para Retroexcavadora	jgo	0.33249
KW-MT-036	Llantas Para Revolvedora Manual	jgo	0.00030
KW-MT-037	Juego De 4 Llantas Para Compactador Neumático.	jgo	0.01946
KW-MT-038	Juego De 10 Llantas De Camión De Volteo	jgo	0.23690
KW-MT-039	Juego De 6 Llantas Ruo 130024-16cpg2/L2	jgo	0.06605
KW-MT-040	4 Llantas 750 X 16 Tlm G8 10 Capas.	jgo	0.00074
KW-MT-041	6 Llantas 900x20 Pxn 12 Capas.	jgo	0.01098
KW-MT-042	Barrote De 1 1/2" X 4" X 8 1/4'	pt	28.71780
KW-MT-043	Malla Electroldada 6-6/10-10	m2	406.74093
KW-MT-044	Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) De 1/2"	ml	0.00000
KW-MT-045	Nomenclatura, Según Especificaciones	pza	15.00264
KW-MT-046	Tapon 4 Pvc San	PZA	0.00000
KW-MT-047	Tapon Macho 4	pza	0.00000
KW-MT-048	Tapon Macho 6 San	PZA	0.00000
KW-MT-049	Tierra De Banco	m3	45.56160
KW-MT-050	Triplay 5/8" De 1.22 X 2.44	PZA	0.00000
KW-MT-051	Tubo Pvc 4	ML	0.00000
KW-MT-052	Llave De Banqueta De Bronce De 1/2"	pza	0.00000
KW-MT-053	Yee 6"	PZA	0.00000
KW-MT-054	Yee De Pvc Alcantarillado 8"X6" P/Descarga	PZA	0.00000
KW-MT-055	Acarreo De Corte De Excavacion.	m3	1,619.00528
KW-MT-056	Var #3 (3/8")	ton	0.00000
KW-MT-057	Cemento Gris Normal, Marca Tolteca	ton	0.07872
KW-MT-058	Arena	m3	0.25976
KW-MT-059	Cimbra Metalica (Renta) Para Gauarnicion	m/renta	1,841.60000
KW-MT-060	Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts	pza	0.00000
KW-MT-061	Codo De 45° Pvc Sanitario A Cementar (Hh) De 6"	pza	0.00000

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #100 entre Fernando Villarreal y Esquina
Fracc. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO1108234L0

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
KW-MT-062	Reduccion De 6x4 Sanitaria	PZA	0.00000
KW-MT-063	Señal De Alto Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado	pza	8.54008
KW-MT-064	Señal De Cruce De Peatones Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado	pza	4.00000
KW-MT-065	Señal De No Estacionarse O Velocidad Máxima Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado	pza	4.00000

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11C

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
EP-KW-01	Revolvedora para concreto cmarca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt.	hora	0.35328
EP-KW-02	Rodillo vibratorio marca Dynapac modelo PR8 cap.4400 VPM	hora	0.00000
EP-KW-03	Cortador de piso marca Target modelo EC205 cap. 6 5/8"	hora	194.52829
EP-KW-04	Bailarina neumática marca Wacker	hora	0.00000
EP-KW-05	Vibrador de gasolina marca Felsa con motor de gasolina de 4 H. P.	hora	83.00759
EP-KW-06	Compactador CS 433C, de 105 hp, 6.77 ton, ancho de tambor 1.68 m	hora	103.82167
EP-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	791.64871
EP-KW-08	Camión de volteo tipo torton con caja de 14 m3	hora	473.79550
EP-KW-09	Compactador sobre neumático PS 130B	hora	58.96120
EP-KW-10	Tractor de orugas D8RII de 305 hp y 37.594 ton de peso de operaciòn equipados con hoja y sin escarificador	hora	37.79975
EP-KW-11	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	132.09181
EP-KW-12	Pavimentadora asfaltica Caterpillar AP-1000B 174 hp	hora	26.03128
EP-KW-13	Compactador de asfalto Caterpillar CB634C de 145 hp	hora	45.26589
EP-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	1.48763
EP-KW-15	Camiòn pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	hora	21.96912
EP-KW-16	Petrolizadora 2100-SR (8000 LT.)	hora	31.46863
EP-KW-17	Nivel SOKKIA B20 aumentos 32x	hora	119.65750
EP-KW-18	Transito eléctrico marca Leica Wild	hora	119.65750
EP-KW-19	Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp.	hora	0.00000

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #100 entre Fernando Villarreal y Esquina
Col. Buena Vista C.P. 87344 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO130823CC0

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	DOCUMENTO AT 11 A
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°.	*MANO DE OBRA*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA **SEÑALANDO:**

A. DE MANO DE OBRA
B. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
C. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE LLENADO

C: DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-COLUMNAS:

N°.:	SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:	SE ANOTARÁ LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.
UNIDAD	HORA
CANTIDAD	EL NÚMERO TOTAL DE. HORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

AT 11.- *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

GUÍA DE LLENADO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 **ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**			*LICITACIÓN N°:* *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	***DOCUMENTO AT 11 C***
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	***FIRMA DEL LICITANTE***	***PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***	***FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:***	***HOJA:*** *DE:*

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°.	***MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA **SEÑALANDO:**

- **A.** DE MANO DE OBRA
- **B.** DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- **C.** DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE LLENADO

B.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-COLUMNAS:

N°.:	SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN: PERMANENTE	SE ANOTARÁN LOS MATERIALES, INCLUYENDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INDICANDO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.
UNIDAD	LA DE USO COMÚN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
CANTIDAD	EL NÚMERO DE MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	DOCUMENTO AT 11 B
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°.	*MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

AT12.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
A.- RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

(GUÍA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNA:

CONCEPTOS GENERALES:	EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
DICAL:	DÍAS CALENDARIO.
DIAGI:	DÍAS POR AGUINALDO.
PIVAC:	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL.
TP.	DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO.
DIDOM:	DÍAS DOMINGO.
DIVAC:	DÍAS DE VACACIONES.
DIFEO:	DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
DINLA:	DÍAS NO LABORADOS AL AÑO.
TI:	DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) - (DINLA).
TP / TI:	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS.

NOTA: SE ANOTARÁ CADA CATEGORÍA DE MANO DE OBRA.

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 **AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO**	**LICITACION NO.** **IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)** **CONTRATO:** **IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)**	**DOCUMENTO AT12**
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	**FECHA: 26/11/2025** **LICITANTE:** **KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** **REPRESENTANTE LEGAL:** **ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA**	**HOJA: 1**

CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL		
I.-	**Días de percepción pagados al año:**	**DÍAS**
DIACAL	Días calendario de un periodo anual	365
DIAGI	Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)	15
PIVAC	Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)	3
	Total del días pagados al año	
DIDOM	Domingos (Art. 69 L.F.T.).	52
DIVAC	Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).	12
DIFEO	Días festivos por Ley (Art. 74 L.F.T.).	7
DIPCO	Días por costumbre.	3
DIPEC	Días por condiciones climáticas extraordinarias	4
DIPEN	Días por enfermedad.	2
DINLA	Total Días no laborados.	**80**
TI	**DÍAS EFECTIVOS LABORADOS**	**285**
	TI = (Días Calendario de Un Periodo Anual) – (Días No Trabajados al Año)	
TP/TI	Días pagados / Días laborados	**1.34386**
FSBC	**Factor de salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS**	**1.04932**

Av. Libramiento Emilio Portes Gil #160 entre Fernando Villarreal y Esquina
C.P. Buena Vista C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. R.F.C. KCO110823CL0
Tel: (868)812 46 72 Correo electrónico: kawac.construcciones@gmail.com

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	LICITACION NO. IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025) CONTRATO: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)	DOCUMENTO AT12A
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	FECHA: 26/11/2025 LICITANTE: KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL: ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA	HOJA: 1

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLV	CATEGORIA	TP/TI	PS	FSR
KW.MO.01	TOPOGRAFO	1.34386	0.28821	1.73117
KW.MO.02	CADENERO	1.34386	0.29545	1.74090
KW.MO.03	OFICIAL EN COLOCACION DE GUARNICIONES METALICAS	1.34386	0.28951	1.73292
KW.MO.04	ALBAÑIL	1.34386	0.28821	1.73117
KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	1.34386	0.29420	1.73922
KW.MO.06	AYUDANTE DE ALBAÑIL "B"	1.34386	0.29422	1.73925
KW.MO.07	JORNALERO	1.34386	0.29539	1.74082
KW.MO.08	OFICIAL PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL	1.34386	0.27694	1.71603
KW.MO.09	AYUDANTE DE PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL	1.34386	0.28885	1.73203
KW.MO.10	CHOFER	1.34386	0.29101	1.73494
KW.MO.11	OPERADOR "A" (MOTOCONFORMADORA, DRAGA, EXCAVADORA, CARPETEADORA, PILATEADOR)	1.34386	0.27208	1.70950
KW.MO.12	OPERADOR "B" (RETROEXCAVADOR, MOTOESCREPA, BULDOZER)	1.34386	0.27337	1.71123
KW.MO.13	OPERADOR "C" (TRASCAVO FRONTAL, MOTOPIPA)	1.34386	0.27698	1.71608
KW.MO.14	OPERADOR "D" (GRUA DE BAJO TONELAJE MAX 12.0 TON., EQUIPO DE COMPACTACION AUTO PROPULSADO, ESTABILIZADOR, PETROLIZADORA, ZANJADORA Y MONTACARGA)	1.34386	0.27933	1.71924
KW.MO.15	AYUDANTE DE MAQUINARIA	1.34386	0.29429	1.73934
KW.MO.16	OFICIAL TORNILLERO	1.34386	0.27485	1.71322
KW.MO.17	OFICIAL RASTRILLERO	1.34386	0.27578	1.71447
KW.MO.18	CABO DE OFICIO	1.34386	0.27812	1.71761
KW.MO.19	AYUDANTE DE CARPINTERO	1.34386	0.29758	1.74377
KW.MO.20	OFICIAL EN ESTRUCTURAS	1.34386	0.27663	1.71561

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 12**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)

(DICAL) (DIAGI) (PIVAC)	DÍAS CALENDARIO DÍAS DE AGUINALDO DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	
(TP)	**DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA**	
(DIDOM) (DIVAC) (DIFEO)	DÍAS DOMINGO DÍAS DE VACACIONES DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)	
(DINLA)	**DÍAS NO LABORADOS AL AÑO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SUMA**	
(TI)	DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) – (DINLA)	
(TP/TI)	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS TP /TI	

FORMULA (1) $Fsr = Ps\left(\frac{Tp}{TI}\right) (+) \frac{Tp}{TI}$

Dónde:

Fsr= *Representa el factor de salario real.*

Ps= *Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.*
(El análisis detallado se deberá incluir en el Documento AE 2).

Tp= *Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).*

TI= *Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

***AT12.-** ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.*
***A.-** RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL*

(GUÍA DE LLENADO)

A.- RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B- COLUMNAS

No:	*EL NÚMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA.*
CATEGORÍA:	*SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*
Ps	*REPRESENTA, EN FRACCIÓN DECIMAL, LAS OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. (EL ANÁLISIS DETALLADO SE DEBERÁ INCLUIR EN EL DOCUMENTO AE 3).*
FSR:	*REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		**DOCUMENTO AT 12 A**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

N°.	CATEGORÍA	Ps	FSR

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT13.- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).-TEXTO:

No. DE ACTIVIDAD:	*SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA, ACORDE CON LA SECUENCIA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS*
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, EN SU CASO PARTIDA Y SUBPARTIDA QUE LE CORRESPONDA.*
PARTIDA	*SE ANOTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.*
SUBPARTIDA	*SE ANOTARÁ LA SUBPARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.*
CANTIDAD:	*CUANTIFICACIÓN DEL CONCEPTO.*
UNIDAD:	*UNIDAD DE MEDICIÓN.*
AÑO:	*SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.*
MES:	*EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.* *EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES A REALIZAR.*

NOTAS: *EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT13.- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS				
P.01	Trazo y nivelación.	m2	2393.15	797.72	1,595.43
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.40 mts.	m3	1244.44		1,244.44
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1617.77		1,617.76
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal al 2% de su PVSM a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	2393.15		2,393.15
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00		
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00		

LIC. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic	
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	1841.60			1,841.59
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	1313.86			1,313.85
P.09	Construcción de base de hidráulica de 15 cm de espesor, incluye: suministro, trituracion, acarreo, descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% Proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	0.00			
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: Trituracion de material, Riego de impregnación con emulsión asfáltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	3398.34			3,398.34
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	3.00			3.00
P.12	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a	pza.	0.00			

LIC. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
	cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra, descimbra, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.				
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	379.68		379.68
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00		1.00
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	8.00		8.00
P.16	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts marca Semex o similiar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para MÁXIMA VELOCIDAD 20 Km/Hr, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	4.00		4.00
P.17	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina	pza.	4.00		4.00

LIC. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
	galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.				
P.18	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts.marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	0.00		
P.19	Demolición de guarnición existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	ml	2182.61		2,182.61
P.20	Demolición de banqueta existente, incluye: herramienta, equipo, carga y acarreo fuera de la obra.	m2	4802.49		4,802.48
P.21	Corte con cortadora de disco diamante en concreto hidraulico, con un espesor de 10 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	ml	957.26		957.25
P.22	Demolicion de Carpeta asfaltica de 5 cm de espesor incluye: corte de contorno con cortadora asfaltica y demolicion con retroexcavadora con martillo rompedor asi como carga mecanica de escombros en camion, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	833.33		833.33
P.23	Rejilla de 0.70x0.60 mts. Tipo irving de 4" x 3/8", solera de 4" x 1/8", angulo de 4" x 1/4", incluye: corte con cortadora de piso, retiro de carpeta,suministro y colocacion de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 20 cm, de espesor, varilla de 3/8 @ 10 cm, en ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolicion y excavacion, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	m2	0.00		

LIC. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
P. 23	Demolicion de pavimento 10 CM incluye:demolición con retroexcavadora con martillo rompedor asi como carga mecanica de escombros en camion, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	0.00		☐

LIC. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 13**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

N°. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	AÑO MES												

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 B- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS.*

A).-ENCABEZADO:

.

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- COLUMNAS:

ÁREA DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y QUE CONCEPTO PARTICULAR SE HARÁ.*
CATEGORÍA:	*SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN EL ÁREA DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 14.*
AÑO/MESES:	*SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE ANOTARÁN LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.
SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DE JORNADAS POR CATEGORÍA EN CADA MES.

NOTA: *SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.*

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
KW-MT-001	Alambre Recocido	kg	0.00000		
KW-MT-002	Kwh De Energía Eléctrica	KWH	0.00000		
KW-MT-003	Angulo 4"X1/4"	ML	0.00000		
KW-MT-004	Ladrillo De 7x14x28	PZA	0.00000		
KW-MT-005	Polín De 3 1/2 X 3 1/2" X 8 1/4'.	pt	0.00000		
KW-MT-006	Triplay De 16 Mm. 1.22 X 2.44.	m2	0.00000		
KW-MT-007	Duela Económica 3/4" X 3 1/2" X 8 1/4'.	pt	184.14480		184.14480
KW-MT-008	Barrote De 1 1/2" X 3 1/2" X 8 1/4'	pt	39.55127		39.55127
KW-MT-009	Rejilla Tipo Irving 4"X3/8"	M2	0.00000		
KW-MT-010	Solera 4"X1/8"	ML	0.00000		
KW-MT-011	Grava De 3/4" (19 Mm) En Camión De 6 M3	m3	0.18000		0.18000
KW-MT-012	Agua Potable	m3	306.91203		306.91203
KW-MT-013	Letrerode 0.90 X 1.20 Con Rotulación Digital Según Diseño, Incluye: Postes, Herrajes De Instalación	pza	0.98438		0.98438
KW-MT-014	Acarreo De Sulfato	m3	1,708.01800		1,708.01800
KW-MT-015	Barrote 4x4	pieza	0.00000		

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
KW-MT-016	Base Hidraulica Puesto En Obra 1 1/2" A Finos.	m3	0.00000		
KW-MT-017	Carpeta Asfaltica Segun Especificaciones Puesta En Obra 1/2" A Finos.	ton	555.11884		555.11884
KW-MT-018	Clavo 3" Para Concreto	KG	0.00000		
KW-MT-019	Clavo 3" Para Madera	KG	0.00000		
KW-MT-020	Abrazadera De Bronce 4 X 1/2" Con Tornillos	pza	0.00000		
KW-MT-021	Llave Insercion De Bronce De 1/2"	pza	0.00000		
KW-MT-022	Pintura En Aerosol	pza	89.78813	29.91438	59.87375
KW-MT-023	Calhidra 40 Kg.	saco	320.61030	11.44723	309.16307
KW-MT-024	Gasolina Magna	lt	112.43062		112.43062
KW-MT-025	Diesel	lt	28,301.20341		28,301.20341
KW-MT-026	Aceite Verde Para Motor A Diesel	lt	974.13051		974.13051
KW-MT-027	Aceite Azul Para Motor A Gasolina.	lt	0.73250		0.73250
KW-MT-028	Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm²	m3	2.04234		2.04234
KW-MT-029	Cople 6 San	PZA	0.00000		
KW-MT-030	Concreto Premezclado F'c=150 Kg/Cm2 Clase Ii Normal Agregado De 20 Mm	m3	205.98286		205.98286

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
	Revenimiento Hasta 10 +-2.5 Cms. Acabado No Bombeable Cementos Cruz Azul				
KW-MT-031	Disco Diamante De 18"	pieza	0.01494		0.01494
KW-MT-032	Emulsión Cationica De Rompimiento Rapido (Riego De Liga Ecr-60)	lt	1,699.17000		1,699.17000
KW-MT-033	Hilo De Albañil	PIEZA	0.18000		0.18000
KW-MT-034	Neumáticos Para Compactador Ruo231226-12cpr3	jgo	0.04361		0.04361
KW-MT-035	Juego De Neumáticos Para Retroexcavadora	jgo	0.33249		0.33249
KW-MT-036	Llantas Para Revolvedora Manual	jgo	0.00030		0.00030
KW-MT-037	Juego De 4 Llantas Para Compactador Neumático.	jgo	0.01946		0.01946
KW-MT-038	Juego De 10 Llantas De Camión De Volteo	jgo	0.23690		0.23690
KW-MT-039	Juego De 6 Llantas Ruo 130024-16cpg2/L2	jgo	0.06605		0.06605
KW-MT-040	4 Llantas 750 X 16 Tlm G8 10 Capas.	jgo	0.00074		0.00074
KW-MT-041	6 Llantas 900x20 Pxn 12 Capas.	jgo	0.01098		0.01098
KW-MT-042	Barrote De 1 1/2" X 4" X 8 1/4'	pt	28.71780	9.57260	19.14520
KW-MT-043	Malla Electroldada 6-6/10-10	m2	406.74093		406.74093
KW-MT-044	Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) De 1/2"	ml	0.00000		

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
KW-MT-045	Nomenclatura, Según Especificaciones	pza	15.00264		15.00264
KW-MT-046	Tapon 4 Pvc San	PZA	0.00000		
KW-MT-047	Tapon Macho 4	pza	0.00000		
KW-MT-048	Tapon Macho 6 San	PZA	0.00000		
KW-MT-049	Tierra De Banco	m3	45.56160		45.56160
KW-MT-050	Triplay 5/8" De 1.22 X 2.44	PZA	0.00000		
KW-MT-051	Tubo Pvc 4	ML	0.00000		
KW-MT-052	Llave De Banqueta De Bronce De 1/2"	pza	0.00000		
KW-MT-053	Yee 6"	PZA	0.00000		
KW-MT-054	Yee De Pvc Alcantarillado 8"X6" P/Descarga	PZA	0.00000		
KW-MT-055	Acarreo De Corte De Excavacion.	m3	1,619.00528		1,619.00528
KW-MT-056	Var #3 (3/8")	ton	0.00000		
KW-MT-057	Cemento Gris Normal, Marca Tolteca	ton	0.07872		0.07872
KW-MT-058	Arena	m3	0.25976		0.25976
KW-MT-059	Cimbra Metalica (Renta) Para Gauarnicion	m/renta	1,841.60000		1,841.60000

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
KW-MT-060	Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts	pza	0.00000		
KW-MT-061	Codo De 45° Pvc Sanitario A Cementar (Hh) De 6"	pza	0.00000		
KW-MT-062	Reduccion De 6x4 Sanitaria	PZA	0.00000		
KW-MT-063	Señal De Alto Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado	pza	8.54008		8.54008
KW-MT-064	Señal De Cruce De Peatones Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado	pza	4.00000		4.00000
KW-MT-065	Señal De No Estacionarse O Velocidad Máxima Según Especificaciones, Incluye: Poste Y Herrajes De Montado	pza	4.00000		4.00000

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA AT 14B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
KW.MO.01	TOPOGRAFO	jor	11.56293	3.79713	7.76580
KW.MO.02	CADENERO	jor	20.32726	6.71677	13.61049
KW.MO.03	OFICIAL EN COLOCACION DE GUARNICIONES METALICAS	jor	86.33421		86.33421
KW.MO.04	ALBAÑIL	jor	170.49760		170.49760
KW.MO.05	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A"	jor	335.80752		335.80752
KW.MO.06	AYUDANTE DE ALBAÑIL "B"	jor	0.00000		
KW.MO.07	JORNALERO	jor	562.09920		562.09920
KW.MO.08	OFICIAL PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL	jor	0.00000		
KW.MO.09	AYUDANTE DE PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL	jor	0.00000		
KW.MO.10	CHOFER	jor	59.41039		59.41039
KW.MO.11	OPERADOR "A" (MOTOCONFORMADORA, DRAGA, EXCAVADORA, CARPETEADORA, PILATEADOR)	jor	20.57887		20.57887
KW.MO.12	OPERADOR "B" (RETROEXCAVADOR, MOTOESCREPA, BULDOZER)	jor	103.68106		103.68106
KW.MO.13	OPERADOR "C" (TRASCAVO FRONTAL, MOTOPIPA)	jor	4.91697		4.91697
KW.MO.14	OPERADOR "D" (GRUA DE BAJO TONELAJE MAX 12.0 TON., EQUIPO DE COMPACTACION AUTO PROPULSADO, ESTABILIZADOR, PETROLIZADORA, ZANJADORA Y MONTACARGA)	jor	28.75224		28.75224

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA AT 14B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
KW.MO.15	AYUDANTE DE MAQUINARIA	jor	4.91697		4.91697
KW.MO.16	OFICIAL TORNILLERO	jor	18.38502		18.38502
KW.MO.17	OFICIAL RASTRILLERO	jor	19.06469		19.06469
KW.MO.18	CABO DE OFICIO	jor	41.64081		41.64081
KW.MO.19	AYUDANTE DE CARPINTERO	jor	105.61576		105.61576
KW.MO.20	OFICIAL EN ESTRUCTURAS	jor	0.00000		
KW.MO.21	SOLDADOR	jor	0.00000		

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN AT 14C

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
EP-KW-01	Revolvedora para concreto cmarca MYM modelo MM2TT, cap. 2 sacos,motor agasolina-eléctrico de 1460 lt.	hora	0.35328		0.35328
EP-KW-02	Rodillo vibratorio marca Dynapac modelo PR8 cap.4400 VPM	hora	0.00000		
EP-KW-03	Cortador de piso marca Target modelo EC205 cap. 6 5/8"	hora	194.52829		194.52829
EP-KW-04	Bailarina neumática marca Wacker	hora	0.00000		
EP-KW-05	Vibrador de gasolina marca Felsa con motor de gasolina de 4 H. P.	hora	83.00759		83.00759
EP-KW-06	Compactador CS 433C, de 105 hp, 6.77 ton, ancho de tambor 1.68 m	hora	103.82167		103.82167
EP-KW-07	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	791.64871		791.64871
EP-KW-08	Camión de volteo tipo torton con caja de 14 m3	hora	473.79550		473.79550
EP-KW-09	Compactador sobre neumático PS 130B	hora	58.96120		58.96120
EP-KW-10	Tractor de orugas D8RII de 305 hp y 37.594 ton de peso de operaciòn equipados con hoja y sin escarificador	hora	37.79975		37.79975
EP-KW-11	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	hora	132.09181		132.09181
EP-KW-12	Pavimentadora asfaltica Caterpillar AP-1000B 174 hp	hora	26.03128		26.03128
EP-KW-13	Compactador de asfalto Caterpillar CB634C de 145 hp	hora	45.26589		45.26589
EP-KW-14	Camioneta pick-up Ford F-250 de 85 hp XLT 8 cilindros 1.5 ton.	hora	1.48763		1.48763

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

KAWAC
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN AT 14C

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Nov	Dic
EP-KW-15	Camiòn pipa de 8000 lts sobre chasis Mercedes Benz 1617 de 170 hp.	hora	21.96912		21.96912
EP-KW-16	Petrolizadora 2100-SR (8000 LT.)	hora	31.46863		31.46863
EP-KW-17	Nivel SOKKIA B20 aumentos 32x	hora	119.65750	39.88583	79.77167
EP-KW-18	Transito eléctrico marca Leica Wild	hora	119.65750	39.88583	79.77167
EP-KW-19	Soldadora marca Lincoln modelo SAE 300 cap. 300 Amp.	hora	0.00000		

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-25-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2025)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. DIVISION DEL NORTE DE LA CALLE ALAMEDA A CALLE THOMAS ALBA EDISON DE LAS COLONIAS ARBOLEDAS, GUILLERMO GUAJARDO Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 29/NOVIEMBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 28/DICIEMBRE/2025
PLAZO: 30 DIAS
PRESENTACION: 26/NOVIEMBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO AT 14D

No.	Descripción	2025 Nov	Nov	2025 Dic	Dic	Dic	Dic
1	Director	0.63	6.99	6.99	6.99	6.99	
2	Secretaria	0.63	6.99	6.99	6.99	6.99	
3	Auxiliar de proyectos	0.63	6.99	6.99	6.99	6.99	
4	Auxiliar de costos	0.63	6.99	6.99	6.99	6.99	
5	Residente de obra	0.63	6.99	6.99	6.99	6.99	
6	Contador	0.63	6.99	6.99	6.99	6.99	
7	Persona de limpieza	0.63	6.99	6.99	6.99	6.99	

ING. GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			*LICITACIÓN N°:* *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	***DOCUMENTO AT 14 B***
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	***FIRMA DEL LICITANTE***	***PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***	***FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:***	***HOJA:*** *DE:*

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

ÁREA DE LOS TRABAJOS Y CONCEPTO	***CATEGORÍA***	***AÑO MESES***														

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

AT14 C.-. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- COLUMNAS:

N°. DEL EQUIPO:	*EL QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO AT 14 B.*
EQUIPO:	*LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.*
UTILIZACIÓN:	*ACTIVIDAD EN LA CUAL SE VA A OCUPAR EL EQUIPO.*
RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA:	*RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA DEL EQUIPO EXPRESADO EN VOLUMEN.*
NO. DE EQUIPOS:	*NÚMERO DE EQUIPOS ESTIMADOS A UTILIZAR.*
HORAS EFECTIVAS:	***HORAS EFECTIVAS*** *DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO.*

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

MES/AÑO: *SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN A UTILIZAR DEL EQUIPO, Y EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS POR MES.*

NOTA: *EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO SE UTILICE EN MÁS DE UN CONCEPTO O ACTIVIDAD, SE DEBERÁ VOLVER A ANOTAR PARA CADA UNA DE ELLAS. SI EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 14 C**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

NO. DE EQUIPO DOCUMENTO AT2	NOMBRE DEL EQUIPO	UTILIZACIÓN	RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA	NO. DE EQUIPO	HORAS EFECTIVAS	AÑO / MES											

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.*** *.DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 A.- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE*

EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN CUALESQUIERA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- COLUMNAS:

N° DE ACTIVIDAD:	*SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:	*TODOS LOS CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE.*
CANTIDAD:	*LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.*
UNIDAD:	*LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.*
AÑO:	*SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- ***A.*** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***B.*** *DE LA MANO DE OBRA.*
- ***C.***.*DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- ***D.*** *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

MES:

EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

NOTA: *EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.*

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 14 A**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

NO. DE ORDEN PROGRESIVO	CONCEPTO DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	AÑO MES													

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*
B. *DE LA MANO DE OBRA.*
C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 D.- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).-COLUMNAS:

ÁREA DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN.*
CATEGORÍA:	*SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE.*
AÑO/MESES:	*SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, ANOTANDO LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.* *SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DEL PERSONAL POR CATEGORÍA EN CADA MES.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 14 D**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ÁREA DE LOS TRABAJOS	CATEGORÍA	AÑO MESES														
